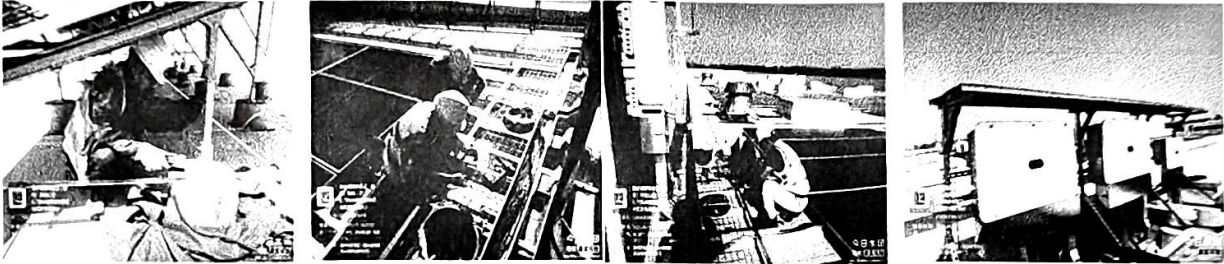


监 理 日 志

工程名称:工程名称:德必福宠物食品（滁州）有限公司 0.78MW 屋顶分布式光伏发电项目
日期: 2025 年 05 月 11 日 天气: 晴 温度: 15-27℃ 星期: 日

监 理 工 作 情 况	施工现场巡视：检查施工安全。	
	进度情况：水泥屋面接地网焊接及清理焊渣。接地刷色带，运维通道接地安装，逆变器接地安装、逆变器安装雨棚。	
	发现问题：接地刷漆不均匀。	
	采取措施：告知施工单位规范刷漆。	
		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	浙江华伏太阳能科技有限公司	施工部位：1) 水泥屋面接地网焊接及清理焊渣。接地刷色带，运维通道接地安装，逆变器接地安装，逆变器安装雨棚。 施工人员：， 5 人、管理员 1 人。 机械设备投入： 材料进场情况：无
本日现场监理人员		周飞
记录人：周飞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 
