

苏垦农发南通分公司（农事服务中心）0.40MWp 分布式光伏发电项目

监理日报

2025 年 04 月 15 日 星期二 晴 15-26℃

一、工程概况

项目参建单位：
 业主单位：江苏农垦清洁能源有限公司
 合作单位：江苏省农垦农业发展股份有限公司南通分公司
 设计单位：江苏海纳宁源电力工程咨询有限公司
 总包单位：浙江宏昊电力科技有限公司
 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

本项目利用南通农发农事服务中心 3#标准粮库和 6#农资农机库屋顶闲置屋面建设光伏电站。
 本次共安装 590Wp N 型单晶硅光伏组件 698 块，3 台 100KW 和 1 台 50KW 逆变器，共计 1 个并网点。
 电站直流侧安装容量为 411.82kwp，交流测容量为 350kw。采用“自发自用，余电上网”，模式

二、现场施工情况

- 1、现场管理和施工人员数量：总包方现场项目经理 0 人，管理人员 0 人，现场施工人员 0 人。
- 2、当日施工机械：当日现场无机械。
- 3、当日施工进度：当日未开始施工。

接入厂房及容量 (kMp)			3#标准粮库	6#农资农机库
已完 成量 (%)	厂房加固		0%	/
	夹具安装		0%	0%
	导轨安装		0%	0%
	组件安装		0%	0%
	桥架安装		0%	0%
	电缆 敷设	直流	0%	0%
		交流	0%	0%
	直流接线		0%	0%
	交流接线		0%	0%
	防雷接地安装		0%	0%
	逆变器安装		0%	0%

	并网柜安装	0%	0%
	电缆试验	0%	0%
	视频监控安装	0%	0%

三、现场监理巡视（安全、质量）、旁站、平行检验情况

- 1、当日现场监理安全巡视：当日现场未施工，安全可控；
- 2、当日现场监理质量检查：当日现场未施工，质量可控。
- 3、当日现场监理旁站：当日现场无隐蔽及关键工序施工。
- 4、当日现场监理平行检验：当日无材料进场。

四、实际进度与计划进度对比分析：

6#农资农机库截至当日实际工程施工进度对照总施工计划滞后：


- 1、支架安装施工比施工总进度计划滞后十八天。
- 2、支架安装滞后十六天。
- 3、组件安装滞后十四天。

3#标准粮库截至当日实际工程施工进度对照总施工计划滞后：

- 1、厂房加固比施工总进度计划滞后十三天。
- 2、支架安装滞后十天。
- 3、组件安装滞后六天

请施工单位对 3#标准粮库、6#农资农机库的施工进度滞后原因进行及时、深入地剖析，采取积极有效的措施，否则可能会对后续多个施工环节造成影响，阻碍项目的整体推进与进度目标的实现。

五、工程形象照片

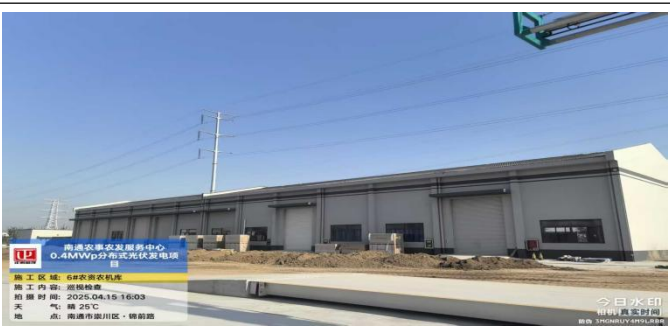

现场未施工。最近厂内路面铺土及可能存在其他后续的工作，请施工单位及时联系、沟通，避免对堆放在现场的材料造成影响。
