

苏垦农发南通分公司（烘干线）0.27MW 分布式光伏发电项目

监理日报

2025 年 05 月 18 日 星期日 阴天 16~23℃

一、工程概况

项目参建单位：
业主单位：江苏农垦清洁能源有限公司
总包单位：江苏函旅建设工程有限公司
监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司
合作单位：江苏省农垦农业发展股份有限公司南通分公司
设计单位：湖南动力源电力勘测设计有限公司

本项目利用江苏省南通市崇川区江苏荣信环保科技有限公司南侧 60 米屋顶(1#屋面)安装 526 块 595Wp 光伏组件，合计 310.34KWp 光伏发电系统。自发自用，余电上网，采用并网电压等级为 0.4kV。

二、现场施工情况

- 1、现场管理和施工人员数量：总包方现场项目经理 1 人，管理人员 2 人，现场施工人员 0 人。
- 2、当日施工机械：无。
- 3、当日施工进度：当日无人施工。

接入厂房及容量 (kWp)		1#屋面（粮食仓库）	
已完 成量 (%)	加固情况	100%	
	围栏安装	100%	
	夹具安装	100%	
	导轨安装	100%	
	组件安装	100%	
	检修通道安装	100%	
	桥架安装	100%	
	电缆	直流	100%
	敷设	交流	100%
	直流接线		100%
	交流接线		100%

	防雷接地安装	100%
	逆变器安装	100%
	并网柜安装	100%
	电缆试验	100%
	清洗系统	0%
	视频监控安装	0%

三、现场监理巡视（安全、质量）、旁站、平行检验情况

- 1、当日现场监理安全巡视：当日无人施工、安全可控。
- 2、当日现场监理质量检查：当日无人施工、质量可控。
- 3、当日现场监理旁站：当日无关键工序施工。
- 4、当日现场监理平行检验：当日无材料进场无平行检验。


四、实际进度与计划进度对比分析：

截至当日实际工程施工进度对照总施工计划滞后，尽快增加施工人员，已满足当前项目进度需求。
 优先安排关键工序施工，确保施工进度不受太大影响。

五、设备材料到货情况：

- 1、加固材料：已全部进场。
- 2、夹具：已全部进场。
- 3、光伏支架专用胶：已全部进场。
- 4、压块：已全部进场。
- 5、导轨：已全部进场。
- 6、组件：已全部进场（595W）。
- 7、逆变器：已全部到货。
- 8、直流电缆：已全部到货。
- 9、接地扁铁：已全部进场。
- 10、桥架：已全部进场。
- 11、交流电缆：已全部进场。
- 12、灭火器：已全部进场
- 13、并网柜：已进场。
- 14、清洗水管：未到货。
- 15、围栏材料：全部进场。

六、工程形象照片

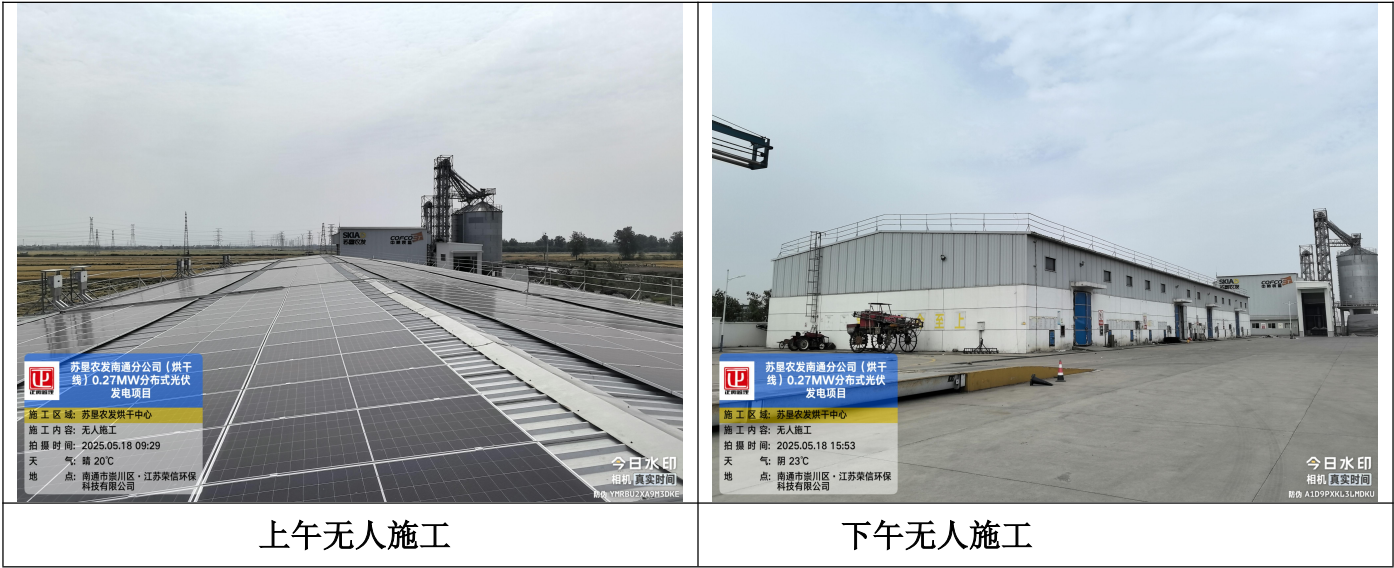

苏垦农发南通分公司（烘干线）0.27MW 分布式光伏发电项目监理项目部

2025 年 5 月 18 日
