

苏垦农发南通分公司（烘干线）0.27MW 分布式光伏发电项目

监理日报

2025 年 04 月 05 日 星期六 晴 7~23 ℃

一、工程概况

项目参建单位：
业主单位：江苏农垦清洁能源有限公司
总包单位：江苏函旅建设工程有限公司
监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司
合作单位：江苏省农垦农业发展股份有限公司南通分公司
设计单位：湖南动力源电力勘测设计有限公司

本项目利用江苏省南通市崇川区江苏荣信环保科技有限公司南侧 60 米屋顶(1#屋面)安装 526 块 595Wp 光伏组件，合计 310.34KWp 光伏发电系统。自发自用，余电上网，采用并网电压等级为 0.4kV。

二、现场施工情况

- 1、现场管理和施工人员数量：总包方现场项目经理 1 人，管理人员 1 人，现场施工人员 4 人
- 2、当日施工机械：曲臂车 2 台
- 3、当日施工进度：加固施工

接入厂房及容量 (kMp)			1#屋面（粮食仓库）
已完 成量 (%)	加固情况		35%
	夹具安装		0%
	导轨安装		0%
	组件安装		0%
	桥架安装		0%
	电缆 敷设	直流	0%
		交流	0%
	直流接线		0%
	交流接线		0%
	防雷接地安装		0%

	逆变器安装	0%
	并网柜安装	0%
	电缆试验	0%
	视频监控安装	0%
	积能后台、气象 仪安装调试	0%

三、现场监理巡视（安全、质量）、旁站、平行检验情况

- 1、当日现场监理安全巡视：施工人员正确佩戴安全帽、正确系安全带、穿反光背心；安全可控
- 2、当日现场监理质量检查：质量可控。
- 3、当日现场监理旁站：当日现场无隐蔽及关键工序施工。
- 4、当日现场监理平行检验：当日无材料进场。



四、实际进度与计划进度对比分析：

截至当日实际工程施工进度对照总施工计划滞后：

- 1、厂房加固施工比施工总进度计划滞后五天。
- 请总包方对施工进度滞后原因采取积极有效的措施及时纠错，否则可能会对后续多个施工环节造成影响，阻碍项目的整体推进与进度目标的实现。

五、工程形象照片



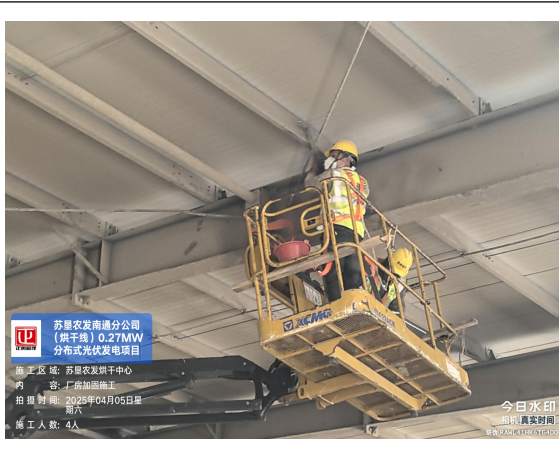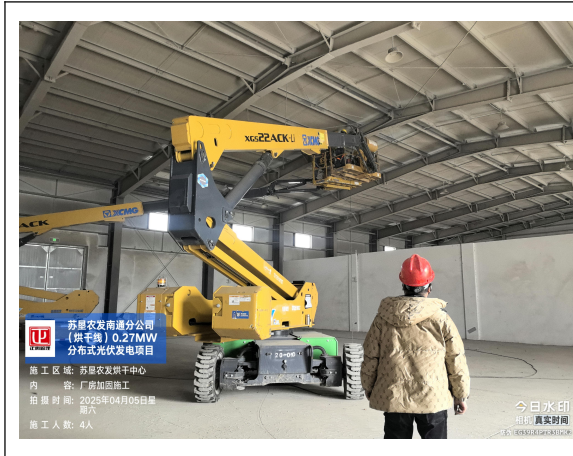

苏垦农发南通分公司（烘干线）0.27MW 分布式光伏发电项目监理项目部

2025 年 4 月 05 日
