

B5 监理月报

编号: JL-XMS-02

监理月报

工程名称: 伊犁矽美仕 100mwp (一期 20mwp) 光伏发电项目

2014 年 7 月 第 2 期

项目监理部（章）

总监理工程师: 郝志刚

报告日期: 2014 年 8 月 1 日

监理月报

工程名称：伊犁矽美仕 100mwp（一期 20mwp）光伏发电项目

- 一、 形象进度照片
- 二、 主要监理工作
- 三、 工程中存在的问题及建议
- 四、 下月监理工作安排



工程名称：伊犁矽美仕 100mwp (一期 20mwp) 光伏发电项目

月报开始时间 2014 年 6 月 28 日 结束时间 2014 年 7 月 31 日 月次第 2 次


监理单位 常州正衡电力工程监理有限公司

伊犁矽美仕 100mwp (一期 20mwp) 光伏发电项目工程量统计表

2014 年 6 月 28 日 - 2014 年 7 月 31 日

施工单位	序号	分项工程	单位	工程量	已完成工程总量
泰州金太阳	1	基础打孔	个	36000	26522
	2	基础浇筑	个	36000	25542
	3	支架安装	组	2000	1338
	4	组件安装	组	2000	1036
	5	接地扁铁	米		完成 60%
酒钢宏联	1	综合楼			框架模板安装在施工中
	2	中控楼			墙体完成、内墙装饰在施工中、电缆沟抹灰
	3	主变基础			基础完成、回填完成
	4	场内箱变基础	个		已经完成 3 个基础
	5	场内道路	米	9730	5000

一、形象进度照片

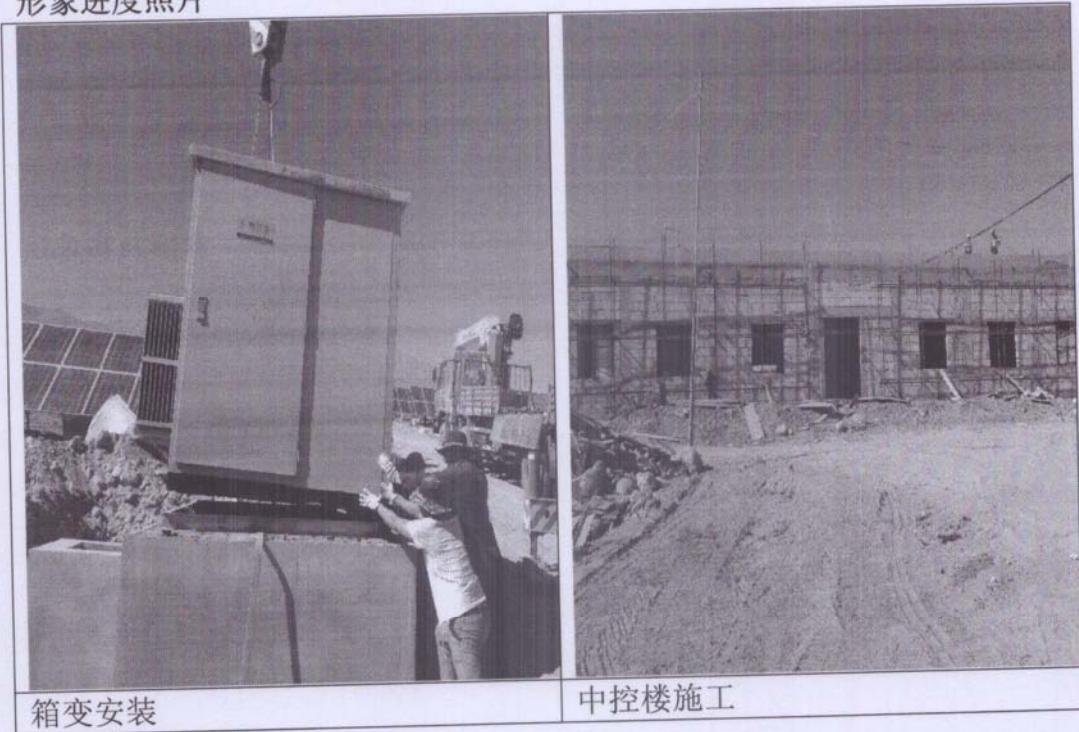



二、监理主要工作

- 1、对现场质量进行监督检查。
- 2、监理人员能够根据监理安全管理方案要求，及时检查现场存在的一些安全隐患，发现问题，及时要求施工单位整改，督促施工单位做好现场安全管理。
- 3、坚持每天对施工现场进行巡视基础，对在检查中发现的问题及时与施工单位沟通，协调解决，或通过监理工作联系单的形式要求施工单位整改。
- 4、每周五下午 5 点，召开监理例会，对上周的施工单位的完成量、下周的工作计划、以及对项目现场出现需要协调解决的问题进行提出，对现场质量、安全、进度等通报、分析处理。
- 5、对关键性节点、隐蔽工程进行全程旁站。
- 6、根据相应的施工计划，进行工期的督查。
- 7、确立一套完善的材料报审报验流程，对工程材料的质量进行准确的把控，主要是土建部分的钢筋、混凝土材料的送检，以及各种扁铁到货验收检查。确认是否符合合同、国家的标准。

三、现场存在的问题及建议

1. 土建施工现场钢筋、模板、木材和脚手架钢管等材料摆放凌乱，没有及时清理。
2. 组件在运输搬运过程中，有倾倒的现象，容易造成组件的损坏，要求施工单位

加强运输过程的控制，防止类似事件的发生。

3. 组件安装时，有单件组件下滑现象，已要求施工单位采取措施，防止组件下滑损坏组件。

四、下月的监理工作安排

1. 下月主要控制设备和进场材料的质量检查，包括辅材、主要电气设备开箱检查、搬运、吊装的监督力度。

2. 审核电气安装单位的相关资质和资料的报审，严格控制电气设备工序安装质量，对 GIS 设备本体内部安装进行旁站监理。

3. 对变压器就位安装和附件安装进行巡视检查，对设备试验进行旁站。

4. 对开关柜和控制屏安装进行巡视检查。对接地施工和回填施工进行旁站。

5. 对室内照明安装进行巡视检查，并进行试验。

6. 对综合楼框架钢筋、模板进行检查，对砼浇筑进行旁站，对墙体砌筑进行检查；对箱变基础施工进行检查和旁站；对中控楼装饰进行检查，对门窗进场和安装进行检查。

7. 督促施工单位加强对已施工完成的土建成品、支架和组件成品及电气设备，做好保护工作。

