

监理月报

工程名称: 伊犁矽美仕 100mwp (一期 20mwp) 光伏发电项目

2014 年 8 月 第 3 期

项目监理部 (章)

总监理工程师:)

郭志刚

报告日期: 2014 年 8 月 22 日

监理月报

工程名称: 伊犁矽美仕 100mwp (一期 20mwp) 光伏发电项目

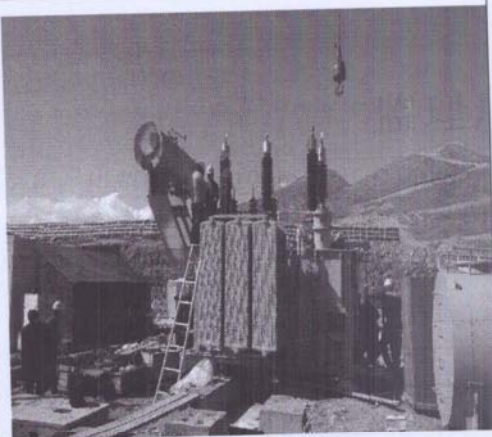
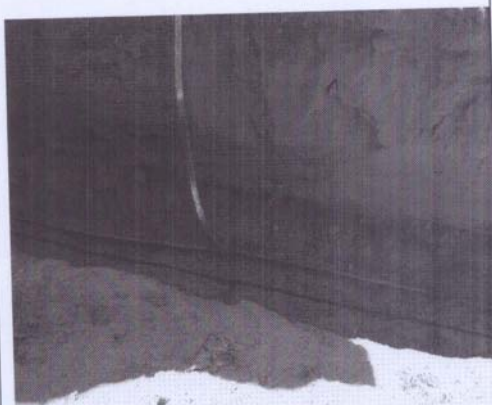
月报开始时间 2014 年 8 月 1 日 结束时间 2014 年 8 月 22 日 月次第 3 次

监理单位 常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	伊犁矽美仕 100mwp (一期 20mwp) 光伏发电项目		影像	30	

二、监理重点工作情况

专 业	事 项	本月重点高中情况	下月重点工作计划
进 度	 	1、基础打孔完成 26522 (36000) 个, 本月 0 个; 2、基础浇筑 25542 (36000) 个, 本月 0 个; 3、支架安装 1384 (2000) 组, 本月新增 46 组; 4、组件安装 1075 (2000) 组, 新增 339 组; 5、组件支架间接地安装完成 80%, 除 4,5,6,7 单元; 6、综合楼满堂红脚手架搭设完	电气部分: 电缆敷设; 箱变安装; GIS 设备安装; 35kV 柜安装; 保护控制柜安装; 电力和控制电缆敷设; 土建部分: 综合楼砼浇筑、砌体施工、室内装饰;

		成，模板安装在施工中，本月进展缓慢； 7、中控楼室内装饰基本完成；设备基础完成； 8、箱变安装完成6个； 9、变压器安装完成； 10、综合楼框架模板安装、扎筋安装完成；	
	设备交付进度	变压器进场就位；箱变进场 15 台；35kV 电缆进场；控制屏 18 台；GIS 组合电气 3 组；110kV 电缆和交流汇流箱到场；	
	设计交付进度	电气和土建图纸不全	补齐全部蓝图
	质量体系运行情况	质量体系运行有不到位的情况	督促施工单位整改
	施工图会检		
	设计交底		
	方案审查	提交不全	督促提交齐全
	技术交底	已落实	
	设计变更		
安全	安全培训	施工人员已组织安全培训	督促新进人员进行安全培训
	安全交底	分项、分部工程施工已交底	对新开工项目督促安全交底
	安全措施落实情况	要求施工单位施工人员戴好安全帽；脚手架增加安全围栏；	督促施工单位落实安全措施，检查施工过程安全情况，发现问题及时制止；
	安全文明施工情况	要求土建施工单位材料要摆放整齐有序；要求安装单位及时清理工程垃圾；	继续要求土建施工单位材料要摆放整齐有序；要求安装单位及时清理工程垃圾；

质量	主要工序质量	对综合楼基础砼浇筑进行旁站；对中控楼墙体砌筑施工进行巡视监理；	对电气设备安装进行巡视检查和旁站；对综合楼施工进行巡视检查和旁站
	主要原材料质量	电气设备、接地材料、光伏系统材料符合要求	对后续进场设备和材料进行检查；
	构（配）件质量	进场构件检查合格	严格检查进场构配件质量和验收
	设备质量	进场设备检查合格	严格检查进场设备质量和验收
	质量验评情况	合格	
投资	资金情况	按照施工进度和施工合同支付	
	款项支付情况	本月支付工程进度款未统计	
	预算外签证	无	
合同	合同签订情况	施工合同已签订	
	合同执行情况	按照施工合同执行	

三、本月进度情况

序号	任务名称	计划开始日期	计划结束日期	施工开始日期	施工结束日期	本月计划完成 (完成量/总量)	本月实际完成 (完成量/总量)	备注
泰州金太阳								
1	基础打桩	2014、5、20				26522/36036	26522/36036	
2	基础浇筑	2014、5、20				25542/36036	25542/36036	
3	支架安装	2014、5、20				1384/2000	1384/2000	
4	组件安装	2014、5、20				1375/2000	1375/2000	
5	1*4 电缆敷设	2014、5、20				220000m(8-15 单元完成)	220000m(8-15 单元完成)	
酒钢宏联								
1	中控楼					基础和框架完成，外墙砌筑完成	基础和框架完成，外墙砌筑完成	
2	综合楼基础					完成	完成	
3	综合楼扎筋，制模					完成	完成	

4	综合楼混凝土浇筑					完成	未做	
1	场区围栏					100%	100%	

四、下月进度计划

序号	任务名称	计划开始日期	计划结束日期	施工开始日期	施工结束日期	下月计划完成 (完成量/总量)	备注
1	支架安装					100%	除 4、5、6、7 区外
2	组件安装					100%	除 4、5、6、7 区外
3	1*4 电缆敷设					100%	除 4、5、6、7 区外
4	逆变器					100%	除 4、5、6、7 区外
5	95 电缆敷设					20%	
6	主电缆沟开挖					30%	除 4、5、6、7 区外

五、安全文明施工情况

事故（起）			编制安全 策划文件 (份)	施工人数	安全分包情况			
人身 重伤	机械 设备	电网 事故			分包队 伍数量	分包队 伍人数	系统外队 伍数量	系统外 队伍人数
无	无	无	1	泰州金太阳 30 人； 酒钢宏联 25 人	无	无	无	无

六、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位合理安排工序，增加施工人员，合理安排工作时间，设备材料及时进场	督促施工单位增加人员，督促材料和设备及时进场
安全管理	监督施工单位落实现场安全措施，安全管理人员到场到位；监理人员加强监督管理	审查施工单位的施工安全措施，监督落实
质量管理	对施工过程进行巡视检查和旁站监理，发现问题及时与施工单位沟通解决	对施工过程进行巡视检查和旁站监理，发现问题及时与施工单位沟通解决
技术管理	督促施工单位施工前，熟悉施工图纸，按图组织施工，	监理人员熟悉图纸，按照图纸要求进行检查和旁站监理
造价管理	统计实际完成工程量	按照实际完成工程量和合同签发工程进度款

物资供应	督促业主和施工单位的设备和材料及时进场	督促业主和施工单位的设备和材料及时进场
------	---------------------	---------------------

常州正衡电力工程监理有限公司
伊犁矽美仕 100mwp（一期 20mwp）光伏发电项目
监理部
2014 年 8 月 22 日

