



编号: JL- (PGSGF) -11


监 理 月 报

工程名称: 中设国联于都一期 20MW 光伏电站项目

2017 年 4 月第 11 期

项目监理部(盖章)

总监理工程师: 李金忠



报告日期: 2017 年 04 月 30 日

监 理 月 报

工程名称：中设国联于都一期（20MWp）光伏电站项目

月报开始时间 2017 年 4 月 1 日 结束日期 2017 年 4 月 30 日

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料



序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	光伏区	中设国联于都一期 (20MWp)光伏电站项目	影像	7 张	

一、 监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度		光伏区排水沟作业基本完成； 光伏区大门因土地争议原因暂停施工；箱变围栏安装完成； 光伏区围栏已卸下围网准备到货返工；截至月底发现 54 处缺陷；已落实责任人于期整改；	光伏区围栏安装完成； 石子敷设完成； 全场消缺完成； 完成工程资料； 竣工验收；



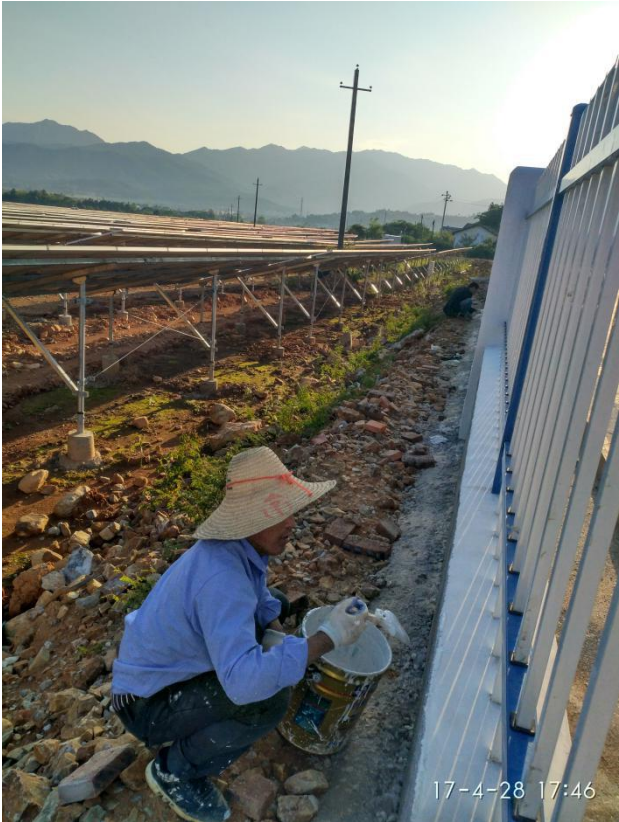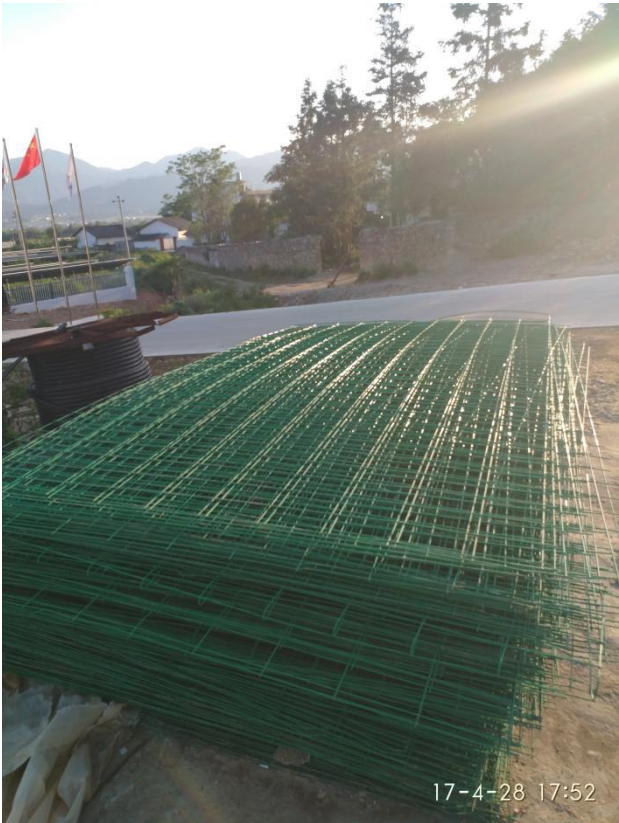

 			
	设备交付进度	全部交付	
	设计交付进度	已经全部交付	已经全部交付
	质量体系运作情况	质量体系健全，	落实质量保证

		运行良好	体系，并对运行情况进行检查
	施工图会审	完成	
	设计交底	完成	
	方案审查	完成	督促施工单位报审其他资料
	技术交底	完成	
	设计变更	无	
安全	安全培训情况	新进场员工已进行安全培训	督促施工单位对进场新员工进行安全教育
	安全交底情况	督促施工单位对危险作业点进行班前交底	继续督促施工单位进行班前交底
	安全措施落实情况	落实不彻底，已要求施工单位认真落实	监督施工单位认真落实安全措施
	安全文明施工情况	现场安全、文明措施良好	加强现场安全管理力度
质量	主要工序质量	旗台基础浇筑；排水沟开挖。	对现场进行巡视检查和旁站。
	主要原材料质量	水泥；石子；沙子；红砖；	对主要材料进行检查
	构（配）件质量	进场材料质量合格	把控好进场材料质量关
	设备质量	进场设备检查合格	进行进场报验、开箱检查
	质量验评情况	工序施工符合要求	加强过程检查力度，加大工序

			报验抽查力度
投资	资金情况	按照施工进度和施工合同支付	/
	款项支付情况	/	/
	预算外签证	无	/
合同	合同签订情况	施工合同已签订	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行工作

二、 本月进度情况

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	本月实际完成（完成量 / 总量）	累计完成（完成量 / 总量）	备注
1	电缆敷设	2016.3.25	2016.5.30	2016.3.25	2017.4.6	15%	100%	
2	光伏区围栏	2016.6.01	2016.6.20	2017.2.27	2017.4.22	50%	50%	围网已拆除，等待新网到场安装。
3	箱变围栏	2016.4.01	2016.6.22	2016.3.21	2017.4.18	88%	100%	
4	光伏区排水沟	2016.6.20	2016.6.30	2017.3.6	2017.4.10	10%	100%	
5	消缺	2016.6.30	2016.9.30	2017.4.15	2017.4.30	50%	50%	
6	光伏区大门	2017.4.14	2017.4.20	2017.4.14	2017.4.20	50%	50%	

三、 下月进度计划

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	下月计划完成（完成量 / 总量）	本月实际完成（完成量 / 总量）	权值

1	光伏区围栏	2016.6.01	2016.6.20	2017.2.27		100%	50%	
2	站区道路	2016.5.25	2016.6.15	2017.2.27		100%		
3	消缺	2016.6.30	2016.9.30	2017.4.15		100%	50%	

四、安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策	施工	安全分包情况			
人身重 伤	机械设 备	电网事 故	划文件（份）	人数	分包队 伍数量	分包队 伍人数	系统外 包队伍 数量	系统外 队伍人 数
无	无	无	0	6 人	/	/	/	/

五、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性	完成消缺工作；完善施工资料；做好竣工验收准备；
安全管理	不定期巡视检查现场工作	不定期巡视检查现场工作
质量管理	对施工过程进行巡检旁站监理，及时解决发现问题。	督促施工单位按照施工工艺和设计要求及图纸的规范要求施工
技术管理	/	/
造价管理	/	/
物资供应	督促施工单位用料供应及时到场	督促施工单位围栏尽快到场进行安装

常州正衡电力工程监理有限公司

中设国联于都一期项目监理部

2017 年 4 月 30 日
