

编号: CZZH-JLYB-2018-08

监 理 月 报

工程名称: 临潭天朗新能源科技有限公司 20MWp 光伏电站项目

2018 年 08 月 第 1 期

项目监理部 (章):



总监理工程师: 卢洪彦

报告日期: 2018 年 08 月 31 日



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 月 报

表号: DJB-B11

工程名称: 临潭天朗新能源科技有限公司 20MWp 光伏电站项目

编号: CZZH-JLYB-2018-08

一、工程形象进度 (形象进度表、照片)

形象进度表

分项名称	施工工序	完成情况	备注
光伏区	定位放线	完成 18.3MW	2017 年 10 月 25 日 开始复工 光伏区容量 18.3MW
	预制桩打桩	完成 6938 根	
	组件安装	完成 15.3MW	
	支架安装	完成 15.4MW	
	电气施工	完成 13MW	
35KV 开关站	管理区围墙砌筑	完成 100%	截止 6 月 30 日并网发电 1MW
	主控室 配电室	完成 100%	
	SVG 基础	完成 100%	
	生活辅助厂房	完成 100%	
	一二次设备	完成 100%	
35KV 外线	线路复测	完成 100%	截止 6 月 30 日并网发电 1MW
	基础开挖	完成 100%	
	基础浇筑	完成 100%	
	塔材 导线 金属等材料	完成 100%	
10KV 临时用电线路	水泥杆安装	完成 100%	已经通电
	变压器 吕线等材料	完成 100%	


形象照片

监理例会



道路维修



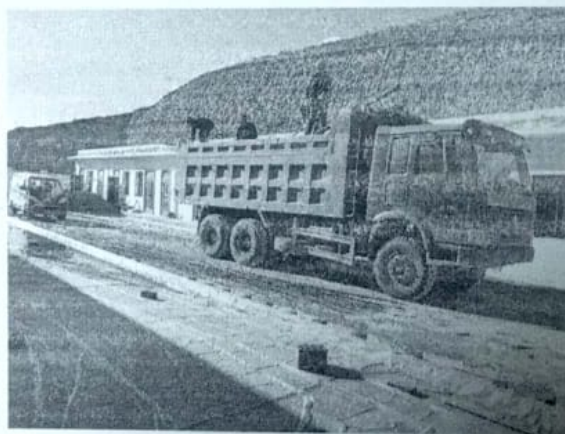

一、 主要监理工作（质量、安全、进度、投资）

在监理过程中，认真执行监理规范的要求，严格按监理规划、监理细则进行操作，按照



有关规范的要求对工程质量、安全、进度、等方面进行全面控制，并严格按照监理程序进行。

为保证工程质量，督促施工单位及时上报工程资料，并对提交的工程资料进行了认真、严格审核；监理部定期召开监理工地例会，对上周工作进行总结，并安排下周工作，对出现的问题进行协调解决，如现场出现特殊问题立即召开专题会议，尽快解决，并将会议纪要整理后下发于各单位。平时通过检查、旁站、巡视、验收，杜绝出现失控现象。在实际操作过程中严格执行验收程序，原材料不经监理验收合格，严禁进场使用，对需复试的原材料严格执行见证取样制度，待复试合格后方可进场使用。上道工序尤其是隐蔽和关键工序验收不合格严禁进入下道工序施工，并且在施工过程中进行全程旁站监理，发现问题及时处理，并做好旁站记录。对工程中出现的质量问题认真对待，由各方共同商定处理方案，并督促其按处理方案进行整改，并再次验收合格后方可进行下道工序施工，确保质量符合要求。

本项目部在日常监理过程中特别重视安全方面的监理工作，汇同各方检查了现场的机械设备、临时用电、消防、场容场貌等项目，针对存在安全隐患的，立即发出监理通知单要求整改，在监理的督促下和各方配合下，本月安全文明生产状况良好，施工现场未发生任何人身伤亡和设备损坏事故。

进度方面督促帮助施工单位合理安排好人力、物力，积极的做好消缺工作。另外本监理部及时对现场情况（如质量、安全、进度等）进行总结，并编制监理周报、月报，较好地促进了工程项目的实施。

三、工程存在问题及建议

在参建各方的共同努力下，本月质量、安全文明总体良好，如：1、开关站集装箱基础施工材料、机械没有及时报验；2、施工单位人员资质没有及时报审；3、个别施工人员未戴安全帽；施工资料不同步等现象；4、施工单位在抢施工进度时要保证施工质量，做好自检工作。针对以上的情况，监理部在现场及时指出，要求施工方项目部加强管理和安全技术交底工作，确保光伏区施工顺利进行。

四、下月监理工作安排

下月工作任务：，开关站集装箱基础施工，要求施工单位及时提交与工程相关的资料，做到资料与工程同步，同时控制好施工安全和质量，对影响质量、安全的因素进行严格控制。10月25号准备并网发电，要提前做好准备工作。

项目监理大事记

工程名称：甘肃临潭 20MWp 光伏电站项目

编号：CZZH-JLYB-2018-08



主 要 内 容

1、2018 年 8 月 17 号光伏区自检消缺。

总监理工程师: 卢洪彦

2018 年 8 月 31 日

本表由项目监理部填写，项目监理部存 1 份。

