

编号: DCGF-JL-004

监 理 月 报

工程名称: 大城县 15 兆瓦光伏发电项目

2016 年 10 月 第 4 期

项目监理部 (章):

总监理工程师: 孙 晓 东



报告日期: 2016 年 10 月 25 日

监理月报

工 程 名 称：大城县 15 兆瓦光伏发电项目

月报开始时间：2016 年 10 月 25 日

监 理 单 位：常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程概况：

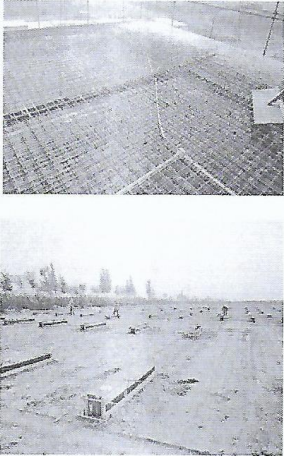
1.1 工程名称：大城县 15 兆瓦光伏发电项目


1.2 工程地点：河北省廊坊市大城县旺村镇马庄

1.3 工程规模：项目总装机容量 15MWp

二、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	大城县 15 兆瓦光伏发电项目	大城县 15 兆瓦光伏发电项目	影像和文字		

专业	事 项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度		1、综合楼二层封顶完成； 2、综合楼墙体砌筑完成； 3、开关站墙体砌筑完成。 4、光伏区 A 区、D 区条形基础浇筑完成，共 3.2MW。	

			
	设备交付进度	无	
	设计交付进度	设计图纸未完善	督促提交齐全
	质量体系运行情况		
	施工图会检	图纸会审未完善	督促业主落实
	设计交底	未完善	加大现场巡视力度
	方案审查	部分完成	督促施工单位提交齐全
	技术交底		
	设计变更	条形基础图纸变更	
安全	安全培训	到场施工人员已全部组织安全培训	
	安全交底		
	安全措施落实情况	要求施工单位施工人员戴好安全帽	检查施工过程安全情况，发现问题及时制止；
	安全文明施工情况	要求材料要摆放整齐有序；要求安装过后及时清理工程垃圾；	
质量	主要工序质量	综合楼二层顶板浇筑，符合设计要求	
	主要原材料质量	光伏区部分立柱焊量不足	
	构（配）件质量		
	设备质量		严格检查进场设备质量和验收
	质量验评情况	光伏区部分立柱焊量不足	
投资	资金情况		
	款项支付情况		

	预算外签证	无	
合同	合同签订情况	施工合同已签订	
	合同执行情况	按照施工合同执行	按照施工合同执行

三、监理重点工作情况

1、全天巡视

2、10月6日下午正式浇筑光伏区条基；

3、10月15日综合楼二层封顶；

4、监理联系单：光伏区立柱焊量不足事宜(DCGF/CZZH-ZH-002)；

关于大城县 15MW 光伏发电项目监理合同期限事宜 (DCGF/CZZH-ZH-003)；

5、监理通知单：现场安全隐患事宜 (DCGF/CZZH-AQ-002)

现场安全隐患事宜 (DCGF/CZZH-AQ-003)

6、监理例会：10月8日召开关于保证条形基础混凝土浇筑质量的现场专题会议；

10月17日在大城县 15MW 光伏发电项目施工现场会议室召开了监

理例会；

四、本月进度情况

1、综合楼二层封顶完成；

2、综合楼墙体砌筑完成；

3、开关站墙体砌筑完成；

4、光伏区 A 区、D 区条形基础浇筑完成，共 3.2MW；

5、10月13日檩条、斜梁开始进场，按计划支架应10月5日到货，进度滞后8天；

6、光伏区支架试装中发现檩条未按现有图纸加工，长度不能满足现场安装要求；

7、设计的檩条长度小于组装后光伏板的长度；

8、10月12日至14日因土地问题导致 C1 区场平暂停；

9、10月19日至今因村民阻工，光伏区全方面停工。

五、安全文明施工情况

开工至今，未发生任何安全生产事故。

六、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位合理安排工序，合理安排 工作时间，保质保量按期完成	督促施工单位增加现场管理，保质保量按期完 成

安全管理	监督施工单位落实现场安全措施，安全管理人员到场到位；监理人员加强监督管理	现场巡视施工单位的施工安全措施，监督落实
技术管理		
造价管理		
物资供应		

常州正衡电力工程监理有限公司

大城县 15 兆瓦光伏发电项目

监理部

2016 年 10 月 25 日
