

GFDZJDM16; 监理月报

编号: CYHG-ZH-JLYB-13

监 理 月 报

工程名称: 朝阳和光光伏并网发电项目

2017年10月1日~2017年10月30日 第 13期

总监理工程师: 张程武



报告日期: 2017年10月23日

监 理 月 报

1、本月工程实施情况

- 1.1、下三家支架、组件安装 706 组全部完成，电缆敷设完成 90%，10KV 汇集线路立杆 8 根，接地安装完成，汇流箱接线完成。
- 1.2、北台子桩基基础浇筑 274 组全部完成，支架安装 60 组。
- 1.3、赵家沟、水泉 144 组支架组件修复全部完成。
- 1.4、王三沟桩基打孔 1320 个，桩基基础浇筑 450 根。
- 1.5、联合桩基打孔 680 个。
- 1.6、辽宁省电力质检中心对本项目进行二次质检。

2、本月监理工作情况


2.1 工程进度控制方面的工作情况：

本月工程进度缓慢，施工人员以及施工机械较少，以及雨天等因素。

2.2 工程质量控制方面的工作情况

本工程 10 月份质量总体是处于受控状态。要求江苏启安建设集团加强过程控制。如事前告知，事中我们检查巡视，发现问题要求及时处理，处理合格后进行核实，事后发现问题要求返工，进行跟踪检查达到合格。

如下：

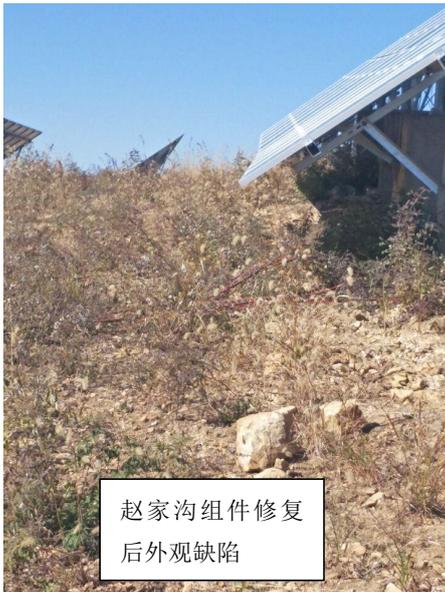




赵家沟汇流箱
倒地



未涂刷脱模
剂

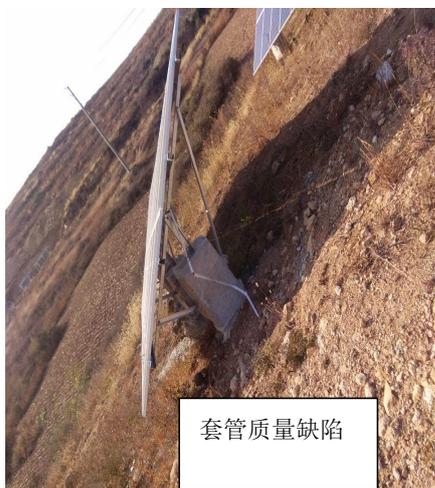

套管质量缺陷

上述质量缺陷已要求 EPC 单位进行整改或返工，整改完成后进行了复验，基本合格。

2.3 安全生产管理方面的工作情况

- 1、定期检查 EPC 单位对施工班组的安全交底记录，三级教育工作，每周的安全检查记录。
- 2、现场大型机械以及危险区域施工时做好安全旁站。
- 3、本月施工现场安全措施基本到位，无安全事故发生。

3 工程存在问题及建议

- 1、组件角度与设计图纸不符，接地焊接焊缝不到位以及防腐处理不到位；要求 EPC 单位指定专业质检员，对施工现场的施工质量做好把控，同时要求 EPC 单位做好技术交底工作。
- 2、东北气候即将步入冬季，要求 EPC 抓紧施工进度，有困难上报业主、监理单位协调解决，争取在气温零下前完成各场区土建工作。
- 3、要求 EPC 单位加强施工现场的防火措施，增加安全警示牌，确保不发生安全事故。
- 4、王三沟桩基成孔后，孔直径不满足设计规范要求，要求 EPC 单位重新打孔。
- 5、现场施工进度严重滞后，要求 EPC 单位增加施工人员以及机械设备。
- 6、王三沟场区地质松软，雨季容易造成水土流失，我单位现场巡查已发现部分桩基基础被冲出，存在质量、安全隐患，要求你单位对此种桩基进行加固。

7、部分场区桩基基础建立在回填后的冲沟上，我单位建议，回填后的冲沟上禁止排布桩基基础，以免往后雨季发生质量事故。

4 下月监理工作重点

- 1、北台子桩支架、组件安装，加强巡检。
- 2、王三沟桩基基础浇筑，加强旁站。
- 3、联合桩基基础浇筑，加强旁站。
- 4、下三家 3.3MWp 并网。

4.2 在项目监理机构内部管理方面的工作重点

组织召开监理周例会，对上月工作总结以及下月工作安排做出要求，本月共计召开 3 次。

其他事项

本月下发监理通知单 1 份，联系单 1 份。
