

正衡监理

编号: CYHG-ZH-JLYB-27

监 理 月 报

工程名称: 朝阳和光光伏并网发电项目

2019 年 03 月第 27 期

项目监理部 (章):

总监理工程师:



报告日期: 2019 年 3 月 24 日



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 月 报

工程名称：朝阳和光光伏并网发电项目

一、 本月工程实际情况

- 1、大三家、北台子、下三家、水泉、赵家沟光伏场区视频监控相
逆变处基础人工开挖完成。
- 2、视频监控预埋件，杆塔、电箱共进 24 套
- 3、升压站土建部分消缺整改施工，上屋面爬梯施工已完成。大门
柱大理石已整改
- 4、大三家、北台子光伏场区围栏柱基础开挖施工

二、 工程进度控制方面的工作情况

- 1、本月朝阳项目工程消缺整改进度缓慢（遗留问题及未施工的情
况众多）总包单位管理人员 1 人，现场施工人员 12 人。不满足
施工现场。
- 2、监理部要求总包单位增加施工人员增加管理员、施工员、资料
员。



三、 工程质量管控方面的工作措施

本工程 3 月份质量总体处于受控状态，项目处于消缺及视频监控基础开挖，围栏柱开挖施工中，本月发出会议纪要一份。联系单 2 份要求启安建设集团加强质量管理及材料进场管控。加强消缺整改及未完成的工作量。

四、 施工生产管理方面的工作情况

- 1、 定期检查总包单位对施工预埋物的安全交底记录，安全生产记录。
- 2、 本月现场安全措施基本到位，无安全事故发生。

五、 工程存在问题及建议

- 1、 视频监控预埋物槽开挖过浅，要求总包单位按照图纸设计施工。
- 2、 升压站配电楼屋面防水层有开裂现象，要求总包单位请专业技术人员消缺整改
- 3、 如修复仍有渗漏现象，重新补做防水层。



未完成工作量如下：

光伏场区消缺整改没有完成，视频监控围柱、升压站土建部分消缺整改、消防本报验，签料图纸未上报。

六、 下周监理工作重点

配合业主单位加强管理力度，要求总包单位加快消缺整改，尽快完成 40WMP 的未完成工程量。


七、 在项目监理机构内容管理方面的工作重点

监理工作内容对现场施工进行分析评估、现象、对工程质量、安全、进度等问题严格管理，及时下发通知单、联系单。对质量安全进度进行管控。







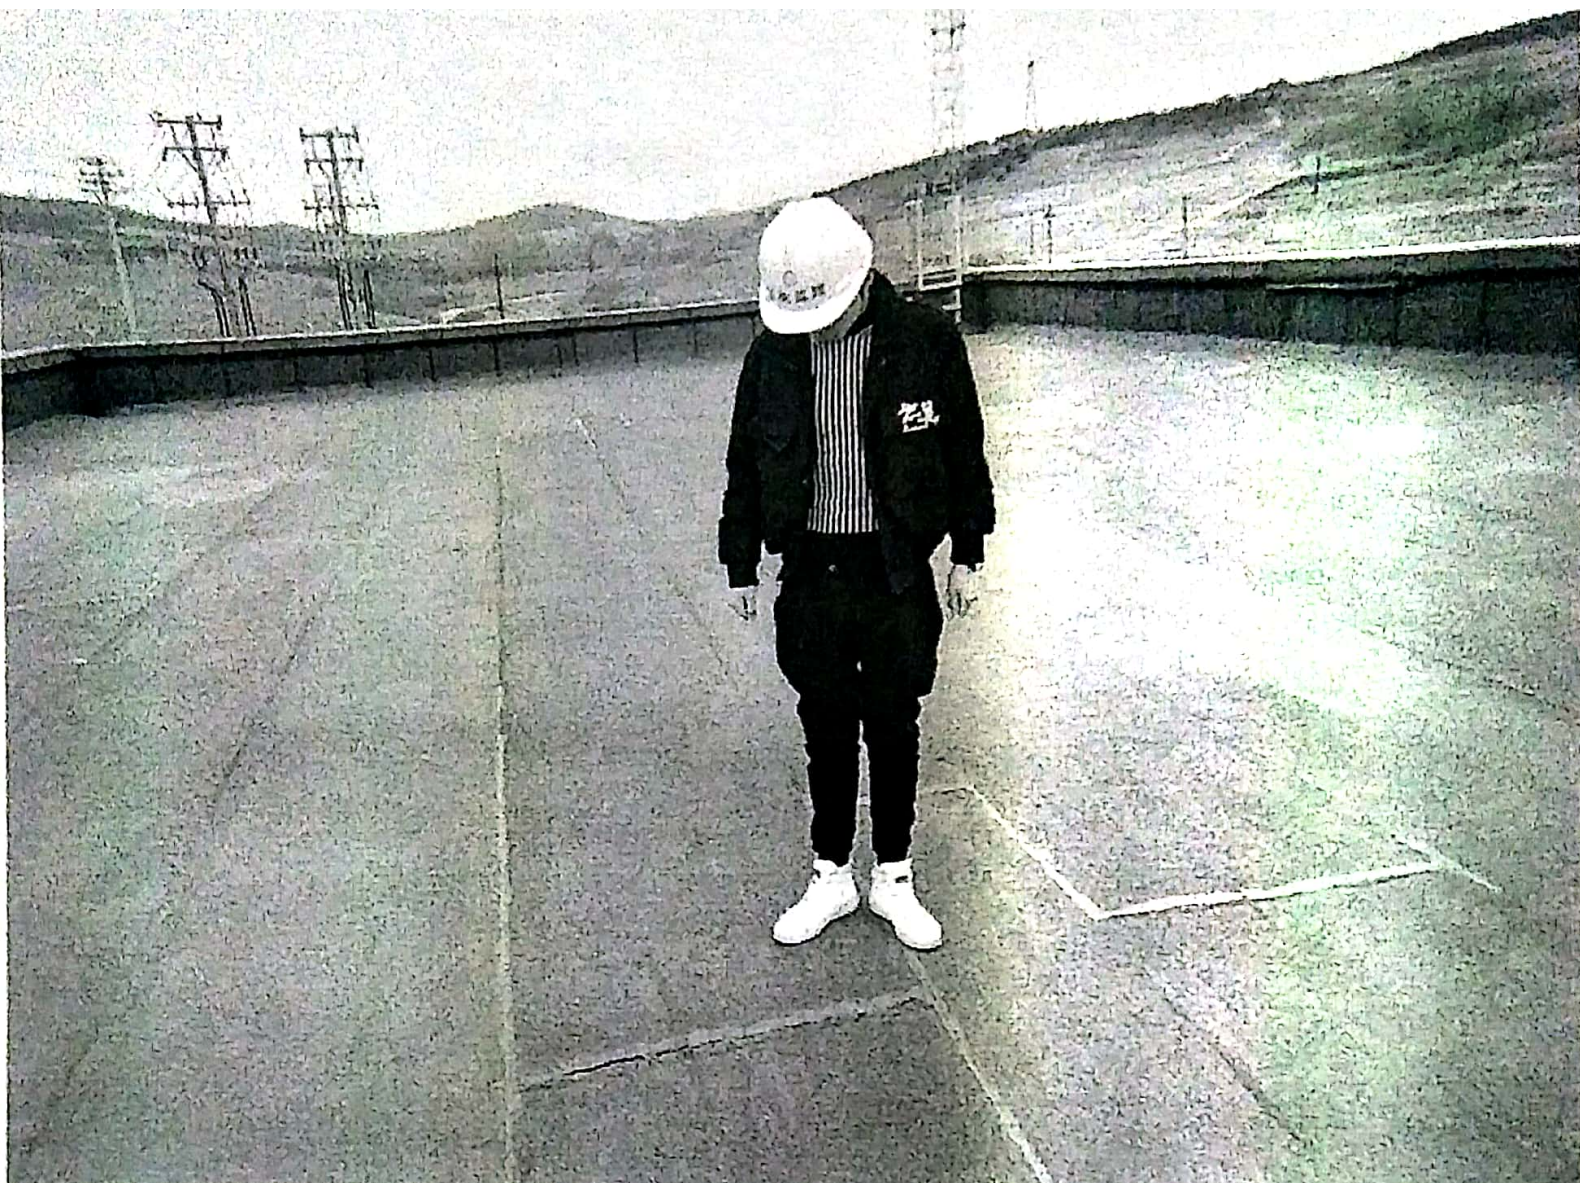

由 扫描全能王 扫描创建
