

编号: LYXM-JL-001

监 理 月 报

工程名称: 耒阳淝田镇 39.6MW 地面分布式光伏电站项目

2016 年 9 月 第 1 期

项目监理部 (章):

总监理工程师:



报告日期: 2016 年 9 月 30 日

监理月报

工 程 名 称： 耒阳淝田镇 39.6MW 地面分布式光伏电站项目

月报开始时间： 2016 年 09 月 01 日

月报结束时间： 2016 年 09 月 30 日

监 理 单 位： 常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程概况：

1.1 工程名称：耒阳市淝田乡 39.6MW 分布式光伏电站项目


1.2 工程地点：湖南省衡阳市耒阳市淝田乡

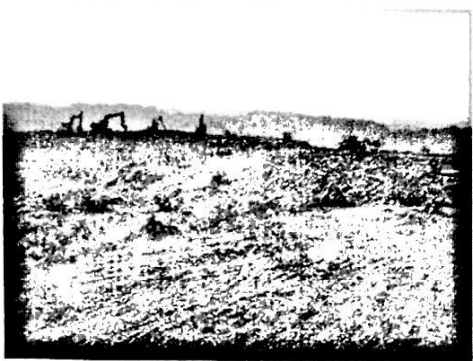
1.3 工程规模：项目总装机容量 39.6MWp

二、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	耒阳淝田镇 39.6MW 地面分布 式光伏电站项目项 目	耒阳市淝田乡 39.6MW 分布式光 伏电站项目	影 像 和 文 字		

三、监理重点工作情况

专业	事 项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度		1、5#、6#清理表面 层。	1、截止 9 月 30 日已完成清 表 13000M³。

			
	设备交付进度	由总包方采购的电气设备提供外形尺寸参数	督促总包尽早提供
	设计交付进度	设计图纸未完善	督促提交齐全
	质量体系运行情况	质量体系运行有不到位的情况	督促施工单位整改
	施工图会检	施工图纸不具备会审条件	督促业主落实
	设计交底	未完善	督促业主交底齐全
	方案审查	提交不全	督促施工单位提交齐全
	技术交底	未完善	督促业主落实
	设计变更	进行中	督促设计院落实
安全	安全培训	到场施工人员已全部组织安全培训	督促新进人员进行安全培训
	安全交底	已全部安全交底	
	安全措施落实情况	要求施工单位施工人员戴好安全帽；	检查施工过程安全情况，发现问题及时制止；
	安全文明施工情况	要求材料要摆放整齐有序；要求安装过后及时清理工程垃圾；	要求材料要摆放整齐有序；要求安装过后及时清理工程垃圾；
质量	主要工序质量	对清表地面标高控制；	加强测量工作，使现场施工符合设计要求标高；
	主要原材料质量	无；	无；
	构（配）件质量	无	无
	设备质量	大型机械相关证件	严格检查进场设备质量和验收
	质量验评情况	合格	

投资	资金情况	无	
	款项支付情况	无	
	预算外签证	无	
合同	合同签订情况	施工合同已签订	
	合同执行情况	按照施工合同执行	按照施工合同执行

四、本月进度情况

序号	任务名称	计划开始日期	计划结束日期	施工开始日期	施工结束日期	本月计划完成 (完成量/总量)	本月实际完成 (完成量/总量)	备注
1	基础灌注桩	2016.10.20	2016.12.10	2016.00.00	2016.00.00	0%	0%	
2	35KV 开关站土建施工	2016.10.01	2016.11.30	2016.00.00	2016.00.00	0%	0%	
3	清表工作	2016.09.11	2016.10.20	2016.09.15		13000M³	10%	
4								

五、下月进度计划

序号	任务名称	计划开始日期	计划结束日期	施工开始日期	施工结束日期	下月计划完成 (完成量/总量)	备注
1	开关站土建施工	2016.10.01	2016.11.30			25%	
2	综合楼施工	2016.00.00	2016.00.00			0%	
3	支架安装	2016.00.00	2016.00.00			0%	
4	组件安装	2016.00.00	2016.00.00			0%	
5	箱逆变基础	2016.00.00	2016.00.00			0%	
6							
7							

六、安全文明施工情况

事故（起）			编制安全 策划文件 （份）	施工人数	安全分包情况			
人身 重伤	机械 设备	电网 事故			分包队 伍数量	分包队 伍人数	系统外队 伍数量	系统外 队伍人数
无	无	无	无	25 人	无	无	无	无

七、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位合理安排工序，增加施工人员，合理安排工作时间，设备、机具及时进场	督促施工单位增加人员，督促材料和设备及时进场
安全管理	监督施工单位落实现场安全措施，安全管理人员到场到位；监理人员加强监督管理	审查施工单位的施工安全措施，监督落实
质量管理	对施工过程进行巡视检查和旁站监理，发现问题及时与施工单位沟通解决	对施工过程进行巡视检查和旁站监理，发现问题及时与施工单位沟通解决
技术管理	督促施工单位施工前，熟悉施工图纸，按图组织施工，	监理人员熟悉图纸，按照图纸要求进行检查和旁站监理
物资供应	督促业主和施工单位的设备和材料及时进场	督促业主和施工单位的设备和材料及时进场

常州正衡电力工程监理有限公司

耒阳淝田镇 39.6MW 地面分布式

光伏电站项目监理部

2016 年 9 月 30 日
