

编号: JL-(TCYZ)-08

监 理 月 报

铜川中广新能源有限公司耀州区二期 50MW 农业光
伏发电项目

2017年5月第8期

项目监理部 (章):

总监理工程师: 张英豪



报告日期: 2017 年 5 月 30 日

监 理 月 报

工程名称: 铜川中广新能源有限公司耀州区 50MW 光伏发电项目 月次 第 7 次 月报开始时间 2016

年 5 月 1 日 结束日期 2016 年 5 月 30 日 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	铜川中广新能源有限公司耀州区 50MW 光伏发电项目		影像	18 张	


一、 监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度		升压站土建全部完成, 设备调试; 试验结束; 并网外部手续已经办理完成; 具备并网条件。 19#、20#、21#、22#、23#单元到升压站集电电缆敷设完成; 22#、23#单元光伏电缆完成 2/46MWP; 汇流箱到逆变器电缆敷设完成	实现道北土地全部交付, 道南土地逐步交付。光伏区电缆敷设 总包对已完工的施工资料与施工同步。外部手续办理完成。 主变在下月带电完成。

  	2/46MEP; 。 光伏区大棚基础换填土完成 22/46MWP; 大棚基础浇筑完成 19/46MWP; 支架安装完成 12,74/46MWP; 组件安装完成 1046MWP; 箱、逆变基础完成 25/46 基; 吊装 17/46 基;	
--	---	--





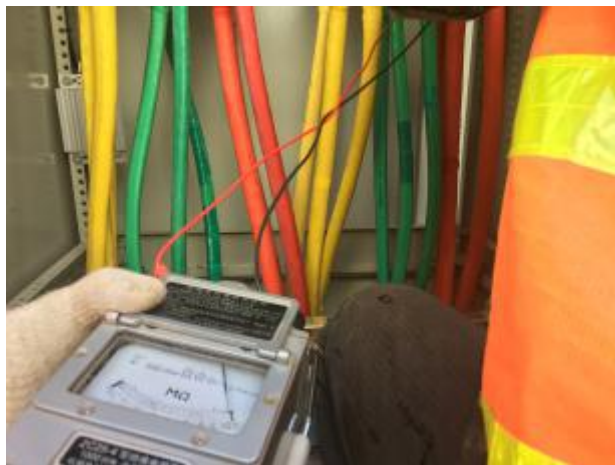



			
	设备交付进度	升压站全部 设备已到齐；光 伏场区到场箱 变 41/46 台；逆	

		变 32/46 台；组件 到 场 123.2/46MWP； 支 架 到 场 14.5/46MWP；汇 流 箱 到 场 370 台；电力电缆到 场 20MWP。	
	设计交付进度	图纸部分未完 成	图纸部分未完 成
	质量体系运作情况	质量体系健全， 运行良好	落实质量保证 体系，并对运行 情况进行检查
	施工图会审	完成	
	设计交底	完成	
	方案审查	提交方案已审 查	督促施工单位 报审其他资料
	技术交底	完成	
	设计变更	光伏区设计优 化已提交，等待 审核	
安全	安全培训情况	新进场员工已 进行安全培训	督促施工单 位对进场新 员工进行安 全教育
	安全交底情况	督促施工单位， 在施工中对危 险原进行识别， 时刻加强安全 意识，每天坚持	督促施工单位， 新进场施工人 员必须全部健 康体检，进行上 岗培训。必须坚

		班前培训进行安全技术交底，每个作业面要求安排一位监护人，时刻对安全进行把控。	持班前培训交底制度。增强安全意识，识别危险源，杜绝事故发生。
	安全措施落实情况	针对现场查出的安全问题已整改落实，但还需要进一步加强。	监督施工单位认真落实安全措施
	安全文明施工情况	现场安全、文明措施良好，有危险地带挂警示牌和警示带，每个区域和作业面挂标识牌，施工人员戴安全帽，高处作业人员扣安全带，穿反光背心。	加强现场安全管理力度
质量	主要工序质量	基础定位放线、开挖、换填土、浇筑、支架及组件安装、电缆敷设、电缆头制作及耐压试验、箱式变压器、逆变器试验能够按	要求各道工序严格按照规范施工，下道工序前一定要监理验收合格后方可进行。

		规范执行。	
	主要原材料质量	电缆外观质量合格，支架外观检查合格，组件观感质量合格；各种进场材料合格证，检测报告齐全，执行开箱检查记录，发现损坏做好记录	建立进场材料进行检查记录制度。
	构（配）件质量	进场材料质量合格	把控好进场材料质量关
	设备质量		进行进场报验、开箱检查
	质量验评情况	工序施工符合要求	加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况	/3000 万元	/
	预算外签证	无	/
合同	合同签订情况	施工合同签订	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行工作

二、 本月进度情况

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	本月实际完成（完成量 / 总量）	累计完成（完成量 / 总量）	备注
江苏华能								
1	定位放线	2017、4、1	2017.5.30	2017.4.15	2017.5.30	4500 个	6800 个	
2	大棚基础换填土	2017.4.1	2017.5.30	2017.4.15	2017.5.30	4500 个	6800 个	
3	基础浇筑	2017.4.1	2017.5.30	2017.4.18	2017.6、1	4500 个	6800 个	
4	支架安装	2017.4.1	2017.6.10	2017、4、12	2017.6.10	8MW	13MW	
5	组件安装	2017.4.1	2017.6.15	2017.4、24	2017.6.20	7MW	10MW	

三、

安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策	施工	安全分包情况			
人身重伤	机械设备	电网事故	划文件(份)	人数	分包队伍数量	分包队伍人数	系统外包队伍数量	系统外队伍人数
无	无	无		120 人	1	/	/	/

四、 施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性	配合建设单位做好并网前准备工作。要求施工单位合理安排施工进度计划，及时调整人力、物力
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。	审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。
质量管理	组件到场进行开箱检查；单位工程重点部	督促施工单位按照施工工艺和设计要求及上海电

	位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	力的规范要求进行施工
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。
造价管理	对施工单位申请的工程款及时进行评审	对工程量实施计量，及时审核施工项目部报送的工程量清单、进度款支付申请
物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	督促施工单位按照复工日期的要求，安排人员、机具进行施工。
