

林州市旭岗新能源科技有限公司东岗镇
20MWp 地面分布式光伏项目
监理月报

第 06 期

2017 年 02 月 13 日 至 2017 年 02 月 25 日

内容提要:

月工程情况概要

月工程质量控制情况评析

月工程安全生产管理工作评析

月工程进度控制情况评析

月工程费用控制情况评析

本月工程其它事项

项目监理机构 (章):

总监理工程师:

日

期:

2017、02、24

本月工程情况概要


相关情况登记			
本月日历天	16 天	实际工作日	15 天
建设单位通知单	0 份	建设单位联系单	0 份
工程暂停令	0 份	监理通知单	1 份
罚款单	0 份	监理联系单	1 份
例会会议纪要	2 份	专题会议纪要	0 份

本月工程现场大事记

- 1、光伏区组件压块、螺栓整改情况，2#地块电压电缆敷设；
- 2、综合楼、35KV 配电间室内抹灰；
- 3、外线杆塔架线；场内集电线路基坑开挖。



（光伏区组件压块、螺栓整改情况，2#地块电压电缆敷设）

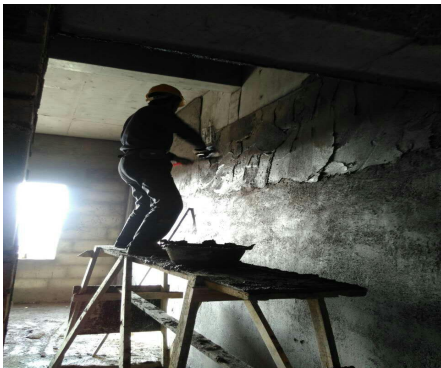

（综合楼、35KV 配电间室内抹灰）



（外线杆塔架线；场内集电线路基坑开挖）

本月工程质量控制情况评析

本月质量控制情况登记			
本月抽查、见证试验次数	4/次	试验结果不合格次数	0/次
设备开箱检查次数	8/次	检查不符合要求次数	0/次
本月查验分项工程	项	其中一次验收合格计	项
发出监理通知单（质量控制类）		1/份	
工程质量情况简析（文字或图表）			
本月主要工作是开关站室内照明线路及室内抹灰施工，光伏区接地施工，电缆槽盒安装施工，低压电缆敷设及场内缚线，外线杆塔架线及接地施工，场内集电线路基坑开挖施工，本月共发现质量缺陷 4 起，包括组件压块未压到位 1 起，组串螺栓为紧固 1 起；桥架支墩浇筑不达标 1 起；光伏区接地扁铁搭接面积不足 1 起； 以上问题除组件压块、螺栓问题正在全场整改，其余问题均已闭环，后期组件压块、螺栓整改情况详见监理日志。			
下月质量情况预计和目标			
下月工程主要进行光伏区低压、高压电缆敷设，场内集电线路基坑开挖、支模及浇筑，开关站室内装修；监理人员要认真审阅图纸，按图纸设计、规范要求施工方，加强现场巡视检查，严格把控安全问题，避免出现安全隐患。			

本月施工安全生产管理工作评析

本月施工生产安全管理工作情况登记	
本月安全检查次数	2/次
发出监理通知单（安全控制类）	0 份
工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表） 施工单位安全生产管理状况： 1、对新进场工人好安全交底、加强施工人员安全教育工作； 2、专职安全员加强巡视检查，光伏区低压、高压电缆敷设要安排专人指挥、监护； 3、落实安全生产管理责任制，专人管理； 履行建设工程安全生产管理法定职责情况： 1. 认真审核施工单位安全生产管理体系及各安全专项方案，要求施工单位严格按审核通过的方案施工； 2. 要求施工单位提供特殊工种人员资格证明和特殊设备的证明文件，报监理项目部审核； 3. 在每日安全巡视工作中发现问题及时要求整改，并且整改完成进行复查。	

本月工程进度控制情况评析

工程开工日期	2016 年 9 月 12 日	工程竣工日期	2016 年 12 月 15 日
本月计划完成至			
本月实际完成至			
本月批准延长工期	/天	累计延长工期	/天
发出监理通知单（进度控制类）		/份	
本月工程进度情况简析（文字或图表）			
本月工程主要是光伏区接地施工，组串汇线施工，低压电缆敷设施工，电缆槽盒安装，光伏区电缆沟开挖施工；开关站室内照明线路敷设，综合楼、35KV 配电间室内抹灰施工；外线杆塔架线及接地焊接、防腐施工，场内集电线路基坑开挖及支模。 。			
下月工程进度展望			
下月将增加机械及施工人员，将光伏区汇线施工及电缆敷设施工完成，并且要在追赶进度的同时还要把控质量及安全，			

本月费用控制情况评析

工程总投资额		约 亿元	
累计完成金额占总投资额百分比		%	
本月监理批准付款	万元	累计批准付款额	万元
本月发生批准索赔	万元	累计发生索赔额	万元
发出监理通知单（造价控制类）		份	
工程费用控制情况简析（文字或图表）			
费用支付主要由建设单位控制。			

本月工程其它事项
