

林州市旭岗新能源科技有限公司东岗镇
20MWp 地面分布式光伏项目
监理月报

第 13 期

2017 年 10 月 25 日 至 2017 年 11 月 25 日

内容提要:

月工程情况概要

月工程质量控制情况评析

月工程安全生产管理工作评析

月工程进度控制情况评析

月工程费用控制情况评析

本月工程其它事项

项目监理机构 (章):

总监理工程师:

日

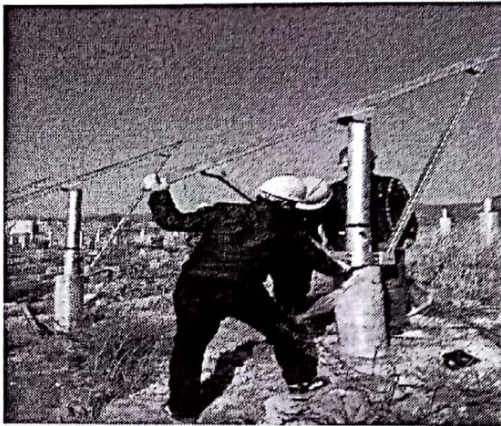
期:

2017. 11. 25



由 扫描全能王 扫描创建

本月工程情况概要

相关情况登记			
本月日历天	31 天	实际工作日	15 天
建设单位通知单	份	建设单位联系单	1 份
工程暂停令	0 份	监理通知单	2 份
罚款单	0 份	监理联系单	4 份
例会会议纪要	2 份	专题会议纪要	0 份
本月工程现场大事记			
1、光伏区 5#地清孔； 2、光伏区 5#地块灌注桩施工、组件安装； 3、光伏区 5#地块接地焊接、支架安装； 4、场内集电基础开挖；			
 (光伏区 5#地块灌注桩施工、组件安装)  (光伏区 5#地块场内集电基础开挖、桩柱防冻措施)			



本月工程质量控制情况评析

本月质量控制情况登记			
本月抽查、见证试验次数	0/次	试验结果不合格次数	0/次
设备开箱检查次数	0/次	检查不符合要求次数	0/次
本月查验分项工程	项	其中一次验收合格计	项
发出监理通知单（质量控制类）		0/份	
工程质量情况简析（文字或图表）			
本月主要光伏区 5#地灌注桩、支架组件安装、场内集电基础开挖、接地沟开挖、接地焊接等 本月共发现质量缺陷 2 起，为光伏区 5#地块断桩问题，现已全程跟踪并整改。			
下月质量情况预计和目标			
下月工程主要进行光伏区 3#地块电气施工及消缺工作，5#地块浇筑桩施工，5#地块钻孔施工，5#地块组件、支架、汇流箱、逆变器安装、5#地块电气施工；3 # 5 # 地块场内集电基础及杆塔安装施工，加强现场旁站及巡视检查，严格把控质量关。			



本月施工安全生产管理工作评析

本月施工生产安全管理工作情况登记	
本月安全检查次数	1 次
发出监理通知单（安全控制类）	0 份
工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表） 施工单位安全生产管理状况： 1、对新进场工人好安全交底、加强施工人员安全教育工作； 2、专职安全员加强巡视检查，光伏区低压、高压电缆敷设要安排专人指挥、监护； 3、落实安全生产管理责任制，专人管理； 履行建设工程安全生产管理法定职责情况： 1. 要求专职安全员必须持证上岗. 2. 认真审核施工单位安全生产管理体系及各安全专项方案，要求施工单位严格按审核通过的方案施工； 3. 要求施工单位提供特殊工种人员资格证明和特殊设备的证明文件，报监理项目部审核； 4. 在每日安全巡视工作中发现问题及时要求整改，并且整改完成进行复查。	



本月工程进度控制情况评析

工程开工日期	2016 年 9 月 12 日	工程竣工日期	2016 年 12 月 15 日
本月计划完成至			
本月实际完成至			
本月批准延长工期	/天	累计延长工期	/天
发出监理通知单（进度控制类）	/份		
本月工程进度情况简析（文字或图表）			
本月由于工程进度款原因影响施工进度，复工迟人数少，主要是 5#地灌注桩、支架组件安装、场内集电基础开挖、部分遗留桩孔等施工、施工人员陆续进场中，进度与计划相差很多。			
下月工程进度展望			
下月工程主要进行光伏区 3#地块电气施工及消缺工作，5#地块浇筑桩施工，5#地块钻孔施工，5#地块组件、支架、汇流箱、逆变器安装、5#地块电气施工、3 # 5 # 地块场内集电基础浇筑、杆塔安装、接地施工等，目前按照进度计划已严重滞后，还需加大人员投入力度，尤其是以后会出现雨雪天气等不确定因素，电气工程还有许多事情要做，施工人员及待多多增加，才能确保 1230 顺利并网。			



本月费用控制情况评析

工程总投资额		约 亿元	
累计完成金额占总投资额百分比		%	
本月监理批准付款	万元	累计批准付款额	万元
本月发生批准索赔	万元	累计发生索赔额	万元
发出监理通知单（造价控制类）		份	
工程费用控制情况简析（文字或图表）			
费用支付主要由建设单位控制。			
预计下月工程发生费用金额			
由业主单位控制			



本月工程其它事项

无

