



正衡监理

编号: JLYB-MXXM-11

监 理 月 报

工程名称: 吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目

2017 年 10 月第 11 期

项目监理部(盖章):



总监理工程师: 张昭武

报告日期: 2017 年 10 月 30 日

常州正衡电力工程监理有限公司妙西项目部


监 理 月 报

工程名称: 吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目第 10 次月报 开始时间 2017 年 10 月 1 日

结束日期 2017 年 10 月 30 日 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

一、 监理重点工作情况

专业	事项:	本月重点工作情况	下月重点工作计划
工 程 影 像 资 料		高压电缆做耐压试验旁站	
		光伏区安装桥架盖板	
		光伏区检查电缆回填	

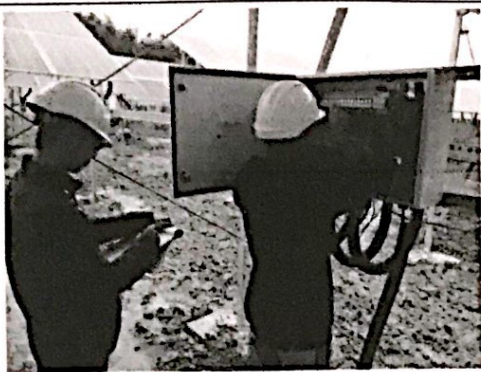

光伏区检查汇流箱电压测试



光伏区巡视排水沟施工



光伏区箱变高压送电



召开监理例会

进度	设备交付进度	光伏区 A 区所有进场材料已经达到 6.8MW 的容量。	10 月 25 日完成光伏区 A 区 6.9MW 的容量。
	设计交付进度	图纸完成	
	质量体系运作情况	质量体系健全，运行良好	落实质量保证体系，并对运行情况进行检查
	施工图会审	完成	
	设计交底	完成	
	方案审查	完成	
	技术交底	完成	
	设计变更	无	
安全	安全培训情况	已经培训	
	安全交底情况	发现安全隐患下发 1 份监理工作联系单。	
	安全措施落实情况	下发的监理工作联系单，总包单位没有整改彻底。	
	安全文明施工情况	个别施工人员没有佩戴安全帽	
质量	主要工序质量	光伏区支架基础施工、支架安装、组件安装、排水沟和围栏施工。	光伏区支架、组件安装消缺、排水沟和围栏施工。
	主要原材料质量	无材料进场	/
	构（配）件质量	无材料进场	/
	设备质量	暂无电气设备进场	/
	质量验评情况	无	/
	资金情况	基本满足 6.8MW 的容量	/
	预算外签证	无	/
合同	合同签订情况	已经续签监理合同	/
	合同执行情况	按合同执行	/

二、 本月进度情况

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	本月实际完成（完成量/总量）	备 注
1	支架基础	2017.09.05	2017.10.10	2017.09.06	2017.10.05	100%	10月25日已经完成A区6.9MW的并网容量。
2	组件安装	2017.09.01	2017.10.09	2017.09.01	2017.10.20	100%	
3	防雷接地	2017.09.05	2017.10.10	2017.09.06	2017.10.28	100%	

三、 下月进度计划

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	下月计划完成（完成量/总量6.8MW）	备 注
1	排水沟	2017.11.01	2017.11.30	2017.11.1	/	100%	计划11月15日A区全部消缺结束。
2	围栏	2017.11.01	2017.11.20	2017.11.1	/	100%	
3	光伏区消缺	2017.11.01	2017.11.15	2017.11.1	/	100%	

四、 安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策	施工	安全分包情况			
人身重伤	机械设备	电网事故	划文件(份)	现场人数	总包管 理人员	分包管 理人员	光伏区施 工队人数	开关站电气 施工人数
无	无	无	/	35人	5人	3人	25	10

五、 施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	支架基础施工、支架安装、组件安装、排水沟施工及开关站的消缺。	排水沟、围栏施工，光伏区安装不合格的组件支架消缺。

安全管理	对施工审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。	督促施工单位对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。
质量管理	督促施工单位按照施工工艺和设计 要求及电力的规范要求进行施工	继续督促施工单位严格按照设计及规范要求施工
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。
造价管理	对施工单位申请的工程款及时进行评审。	对工程量实施计量，及时审核施工项目部报送的工程量清单、进度款支付申请。
物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	督促施工单位按照工程进度计划进行施工，及时消耗进场物资。

常州正衡电力工程监理有限公司

吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目监理部



2017年10月30日
