



正衡监理

编号: JLYB-MXXM-03

监 理 月 报

工程名称: 吴兴区妙西 30MW_p 地面光伏发电项目

2017 年 2 月第 3 期



报告日期: 2017 年 02 月 28 日

常州正衡电力工程监理有限公司妙西项目部


监 理 月 报

工程名称: 吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目 第 3 次 月报 开始时间 2017 年 1 月 1 日

结束日期 2017 年 2 月 28 日 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

一、 监理重点工作情况


专业	事项:	本月重点工作情况	下月重点工作计划
工程 影 像 资 料	 17-2-17 13:49	箱逆变基础砌筑	

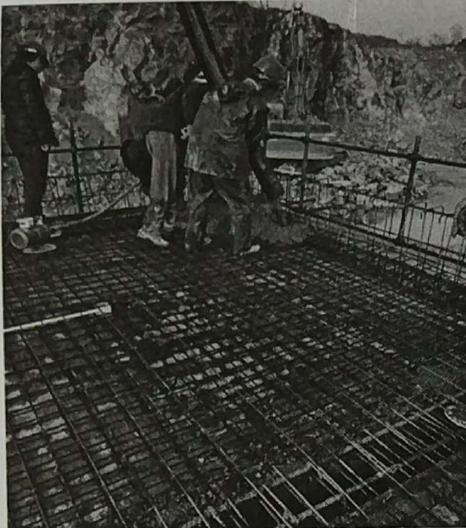

仓库屋面浇砼



仓库模板拆除

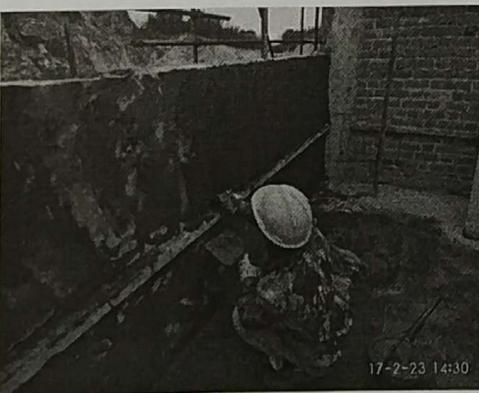

配电室墙面抹灰



仓库墙体砌筑



支架基础土方开挖




支架基础浇筑垫层



支架与组件安装



春节后第一次监理会议

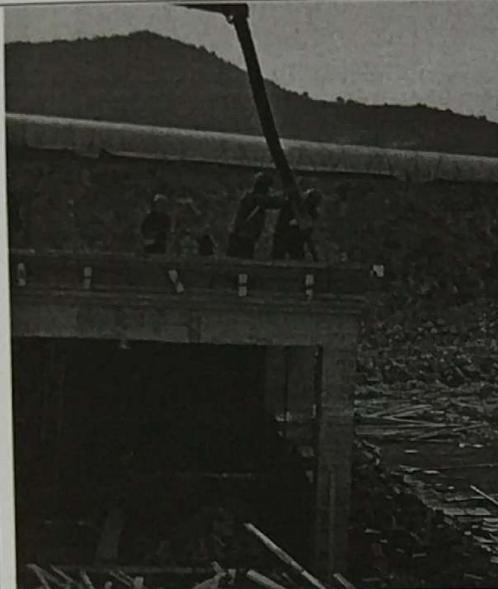

仓库女儿墙浇筑



支架基础砼浇筑

进度	设备交付进度	部分支架、组件、已经到场	其它设备、电缆组件、支架等陆续进场
	设计交付进度	图纸完成	图纸完成
	质量体系运作情况	质量体系健全，运行良好	落实质量保证体系，并对运行情况进行检查
	施工图会审	完成	
	设计交底	完成	
	方案审查	完成	督促施工单位报审其他资料
	技术交底	完成	
	设计变更	无	
安全	安全培训情况	新进场员工已进行安全培训	督促施工单位对进场新员工进行安全教育

	安全交底情况	督促施工单位对危险作业点进行班前交底	继续督促施工单位进行班前交底
	安全措施落实情况	落实不彻底，已要求施工单位认真落实	监督施工单位认真落实安全措施
	安全文明施工情况	现场安全、文明措施良好	加强现场安全管理力度
质量	主要工序质量	开关站配电房、仓库、光伏区土建施工。	开关站仓库土建施工、光伏区支架基础施工、支架安装。
	主要原材料质量	支架、组件、螺栓等材料外观质量合格	对主要材料进行检查
	构(配)件质量	进场材料质量合格	把控好进场材料质量关
	设备质量	暂无电气设备进场	进行进场报验、开箱检查
	质量验评情况	工序施工符合要求	加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况	/	/
	预算外签证	无	/
合同	合同签订情况	/	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行工作

二、本月进度情况

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	本月实际完成(完成量/总量)	累计完成(完成量/总量)	备注
1	定位放线	2017.01.02	/	2017.01.03	2017.02.28	1.5MW	3.2MW	春节放假20天
2	支架基础	2017.01.02	/	2017.01.02	2017.02.28	0.12MW	1.42MW	
3	支架安装	/	/	2017.01.02	2017.02.28	0.74MW	1.34MW	
4	组件安装	/	/	2017.01.02	2017.02.28	0.2MW	0.91MW	
5	配电房	2016.10.20	2016.12.20	2017.01.02	2017.02.28	30%	80%	
6	仓库					45%	50%	

三、下月进度计划

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	下月计划完成(完成量/总量)	本月实际完成(完成量/总量)	权值
1	支架安装		2017.4.30			5MW	0.74MW	
2	组件安装		2017.4.30			4MW	0.2MW	
3	支架基础		2017.4.30			5.5MW	0.12MW	
4	配电房		2017.3.30			100%	80%	
5	仓库		2017.3.30			100%	60%	

四、安全文明施工情况

事故(起)			编制安全策划文件(份)	施工人数	安全分包情况			
人身重伤	机械设备	电网事故			分包队伍数量	分包队伍人数	系统外包队伍数量	系统外队伍人数
无	无	无	/	85	1	79	无	无

五、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性	配合建设单位做好并网前准备工作。要求施工单位合理安排施工进度计划，及时调整人力、物力
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。	审查施工项目部《安全文明措施》及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。
质量管理	材料到场进行开箱检查；单位工程重点部位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	督促施工单位按照施工工艺和设计要求及浙江电力的规范要求进行施工
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。
造价管理	对施工单位申请的工程款及时进行评审	对工程量实施计量，及时审核施工项目部报送的工程量清单、进度款支付申请
物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	督促施工单位按照复工日期的要求，安排人员、机具进行施工。
