



正衡监理

编号：JL-03

# 监 理 月 报

工程名称：辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站一期 20MW 项目

2017 年 11 月 第 10 期



报告日期：2017 年 11 月 30 日

# 监 理 月 报

工程名称：辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站一期 20MWp 项目 10 月 第 9 次 月报开始时间 2017 年 11

月 1 日 结束日期 2017 年 11 月 30 日 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

## 影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	<u>辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站一期 20MWp 项目</u>		影像		

## 一、 监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度		光伏区消缺	光伏区列阵消缺、开始进行竣工资料整理归档。




管理区电动大  
门安装



光伏区消缺



管理区路灯安  
装、光伏区消缺

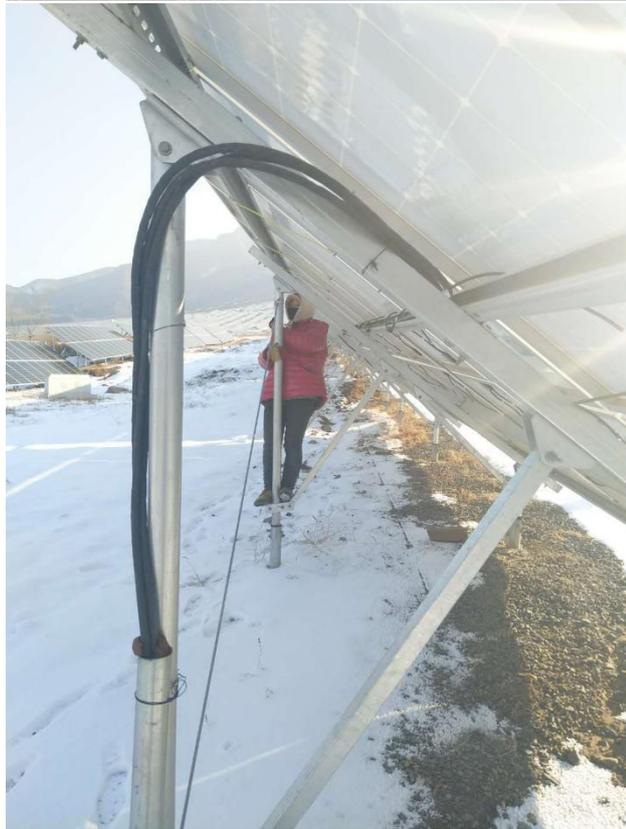

	 <p>“ 辽阳寒岭唐家地面光伏一期 20Mw项目 2017年11月6日 ”</p> <p>门库碑石安装</p>		
	设备交付进度	无	
	设计交付进度	光伏区、管理区、竣工图图纸绘制	
	质量体系运作情况	质量体系健全，运行良好	落实质量保证体系，并对运行情况进行检查
	施工图会审	结束	
	设计交底	完成	
	方案审查	完成	督促施工单位报审其他资料
	技术交底	完成	
	设计变更		
安全	安全培训情况	新进场员工已进行安全培训	督促施工单位对进场新员工进行安全教育
	安全交底情况	督促施工单位对危险作业点进行班前交底	继续督促施工单位进行班前交底
	安全措施落实情况	已认真落实	随时监督抽查施工单位落实

			情况
	安全文明施工情况	现场安全、文明措施良好	加强现场安全管理力度
质量	主要工序质量	光伏区消缺	主要工序质量在可控范围之内
	主要原材料质量		
	构（配）件质量	无	
	设备质量	无	
	质量验评情况	工序施工符合要求	加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况		/
	预算外签证	无	/
合同	合同签订情况	施工合同签订	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行工作

## 二、 本月进度情况

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	本月实际完成（完成量 / 总量）	累计完成（完成量 / 总量）	备注
1	光伏区消		2017.12.5				100%	

	缺							
2								
3								
4								按一项
5								按一项
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								

### 三、 下月进度计划

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	下月计划完成 (完成量 / 总量)	本月实际完成 (完成量 / 总量)	权值
1	光伏区消缺	2017.11.1	2017.12.5					
2	管理区消缺	2017.11.1	2017.12.20					
3	完善资料	2017.11.1	2017.12.30					
4								
5								
6								
7								
8	逆变器安装							

### 四、 安全文明施工情况

事故(起)			编制安全策划文件(份)	施工人数	安全分包情况			
人身重伤	机械设 备	电网事故			分包队伍数量	分包队伍人数	系统外 包队伍 数量	系统外 队伍人 数
无	无	无			1	/	/	/

## 五、 施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，做好工序的衔接工作	一期所有项目消缺要基本完成
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。	审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部施工消缺、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，安全交底情况，做到人证合一
质量管理	做好材料的进场预验收；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	按要求完善资料
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	
造价管理	对施工单位申请的工程款及时进行评审	对工程量实施计量，及时审核施工项目部报送的工程量清单、进度款支付申请
物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	

常州正衡电力工程监理有限公司

辽阳县寒岭镇唐家地面光伏发电一期 20mw 项目监理项目部

2017 年 11 月 30 日
