



编号: JL-03

监 理 月 报

工程名称: 辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站二期 10MW 项目

2017 年 12 月 第 11 期

项目监理部 (章)



总监理工程师: 薛生财

报告日期: 2017 年 12 月 31 日

监 理 月 报

工程名称：辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站二期 10MWp 项目 12 月 第 11 次 月报开始时间 2017 年 12

月 1 日 结束日期 2017 年 12 月 31 日 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司


影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站二期 10MWp 项目		影像		

一、 监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度		120 电缆敷设、箱变高压电缆头制作、支架安装、	开始进行资料整理归档。

	 常州正衡电力工程监理有限公司 Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision Co., LTD. 工程名称: 辽阳县寒岭镇唐家村地面光伏电站二期10wmp项目 施工部位: 组件接线安装 当前日期: 2017年12月10日 2017/12/10  常州正衡电力工程监理有限公司 Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision Co., LTD. 工程名称: 辽阳县寒岭镇唐家村地面光伏电站二期10wmp项目 施工部位: 底压电缆沟开挖 当前日期: 2017年12月10日 2017/12/10  常州正衡电力工程监理有限公司 Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision Co., LTD. 工程名称: 辽阳县寒岭镇唐家村地面光伏电站二期10wmp项目 施工部位: 升压站3x95电缆冷端端头制作 2017/12/10	组件接地线安 装、电缆沟开 挖、电缆头制作	
--	--	--------------------------------------	--

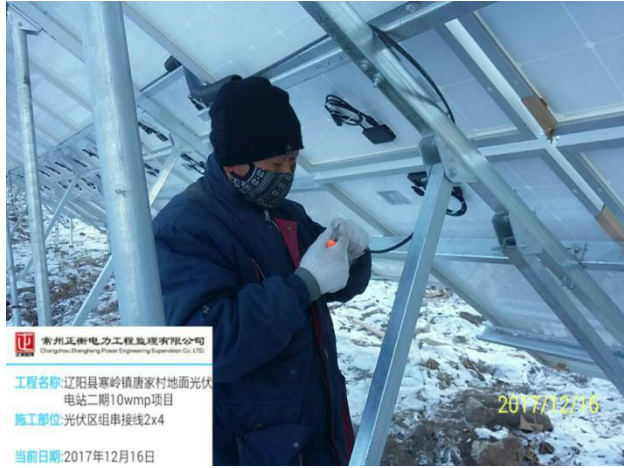

光伏区组串、高压电缆沟开挖、敷设

			
	设备交付进度	无	
	设计交付进度	光伏区图纸完成	
	质量体系运作情况	质量体系健全，运行良好	落实质量保证体系，并对运行情况进行检查
	施工图会审	结束	
	设计交底	完成	
	方案审查	完成	督促施工单位报审其他资料
	技术交底	完成	
	设计变更	无	
安全	安全培训情况	新进场员工已进行安全培训	督促施工单位对进场新员工进行安全教育
	安全交底情况	督促施工单位对危险作业点进行班前交底	继续督促施工单位进行班前交底
	安全措施落实情况	已认真落实	随时监督检查施工单位落实情况

	安全文明施工情况	现场安全、文明措施良好	加强现场安全管理力度
质量	主要工序质量	支架、组件安装、电气安装、符合标准	主要工序质量在可控范围之内
	主要原材料质量	接地扁钢进行检查	对主要材料进行取样送检
	构（配）件质量	无	
	设备质量	无	
	质量验评情况	工序施工符合要求	加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况		/
	预算外签证	无	/
合同	合同签订情况	施工合同签订	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行工作

二、 本月进度情况

三、 下月进度计划

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	下月计划完成（完成量 / 总量）	本月实际完成（完成量 / 总量）	权值

1	完善资料		2018.1.10					
2	现场清理 与围护		2018.1.10					
3								
4								
5								

四、 安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策	施工	安全分包情况			
人身重 伤	机械设 备	电网事 故	划文件(份)	人数	分包队 伍数量	分包队 伍人数	系统外 包队伍 数量	系统外 队伍人 数
无	无	无			1	/	/	/

五、 施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置， 做好工序的衔接工作	
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查； 对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。	做好停工前现场安全管理工作、督促并落实
质量管理	做好材料的进场预验收；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	按要求完善资料
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底， 现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	
造价管理	对施工单位申请的工程款及时进行评审	对工程量实施计量，及时审核施工项目部报送的

		工程量清单、进度款支付申请
物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	

常州正衡电力工程监理有限公司

辽阳县寒岭镇唐家地面光伏发电二期 10mw 项目监理项目部

2017 年 12 月 31 日
