



编号：JL-03

监 理 月 报

工程名称：辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站二期 10MW 项目

2018 年 08 月 第 17 期



报告日期：2018 年 08 月 31 日

监 理 月 报

工程名称: 辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站二期 10MWp 项目 08 月 第 17 次 月报开始时间 2018 年 08

月 01 日 结束日期 2018 年 08 月 31 日 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站二期 10MWp 项目		影像		

一、 监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度		耐压试验	44 亩地支架、组件安装完成。电气施工完成、并网发电。




电缆沟开挖



箱变吊装



组件安装

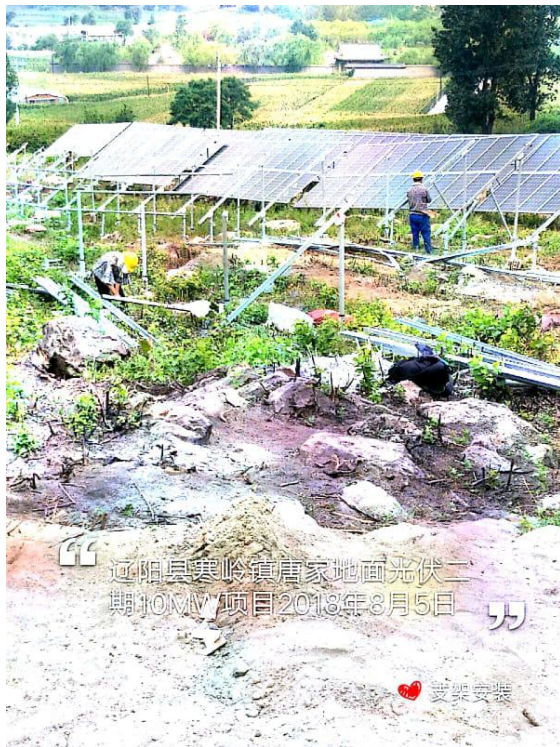

支架安装

	设备交付进度	无	
	设计交付进度	光伏区图纸完成	44亩地光伏区图纸完成
	质量体系运作情况	质量体系健全，运行良好	落实质量保证体系，并对运行情况进行检查
	施工图会审	结束	
	设计交底	完成	
	方案审查	完成	督促施工单位报审其他资料
	技术交底	完成	
	设计变更	无	
安全	安全培训情况	新进场员工已进行安全培训	督促施工单位对进场新员工进行安全教育
	安全交底情况	督促施工单位对危险作业点进行班前交底	继续督促施工单位进行班前交底
	安全措施落实情况	已认真落实	随时监督检查施工单位落实情况
	安全文明施工情况	现场安全、文明措施良好	加强现场安全管理力度
质量	主要工序质量	支架、组件安装、电气安装、符合标准	主要工序质量在可控范围之内
	主要原材料质量	无	
	构（配）件质量	无	

	设备质量	无	
	质量验评情况	工序施工符合要求	加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况		/
	预算外签证	无	/
合同	合同签订情况	施工合同签订	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行工作

二、 本月进度情况

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	下月计划完成（完成量 / 总量）	本月实际完成（完成量 / 总量）	权值
113 亩地								
1	箱变基础					30%	30%	
2	现场消缺							
3	剩余土地场坪完成						100%	
4	引孔					20%	30%	
5	灌桩					20%	30%	
6	支架安装					20%	35%	
7	组件安装					20%	35%	

三、 下月进度计划

序	任务名	计划开始时	计划结	施工开始	施工结	下月计	本月实	权值
---	-----	-------	-----	------	-----	-----	-----	----

号	称	间	束时间	日期	束日期	划完成 (完成 量 / 总 量)	际完成 (完成 量 / 总 量)	
44 亩地施工								
1	箱变基础		2018.9.15			35%		
2	电缆沟					30%		
3	逆变器、 汇流箱			2018.9.10		30%		
4	引孔					20%		
5	灌桩					20%		
6	支架安装					20%		
7	组件安装					20%		

四、 安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策 划文件(份)	施工 人数	安全分包情况			
人身重 伤	机械设 备	电网事 故			分包队 伍数量	分包队 伍人数	系统外 包队伍 数量	系统外 队伍人 数
无	无	无			1	/	/	/

五、 施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置， 做好工序的衔接工作	剩余 44 亩地土地、引孔、灌桩、支架安装、组件 安装全部完成。已完成安装部分全部并网。
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查； 对施工人员进行安全培训、考试，提高作 业人员安全防范意识，落实安全文明施工 措施。	认真做好剩余土地安装的安全工作。
质量管理	做好材料的进场预验收；督促施工单位质 量通病防治措施；监督施工项目部落实强 制性条文的执行计划。	提高施工人员自身素质，加强施工过程质量控制

技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	认真做好消缺工作，不遗漏。加强施工过程中的技术控制。
造价管理	对施工单位申请的工程款及时进行评审	对工程量实施计量，及时审核施工项目部报送的工程量清单、进度款支付申请
物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	

常州正衡电力工程监理有限公司

辽阳县寒岭镇唐家地面光伏发电二期 10mw 项目监理项目部

2018 年 08 月 31 日
