

正衡监理

监 理 月 报

工程名称：衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

2017 年 07 月第 9 期



项目监理部(章):

总监理工程师：李维军

报告日期：2017 年 07 月 31 日

监 理 月 报

工程名称: 衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目 月次 第 9 次 月报开始时间 2017 年 07 月 1 日 结

束日期 2017 年 08 月 1 日 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司


一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目		影像	80 张	

一、 监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度	 常州正衡电力工程监理有限公司 Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervisor CO.,LTD 工程名称:衢州杭泰柯城160MW光伏生态园 施工部位:光伏区8区二次灌浆 当前日期:2017年7月16日  常州正衡电力工程监理有限公司 Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervisor CO.,LTD 工程名称:衢州杭泰柯城160MW光伏生态园 施工部位:中易公司17-21区成品回收 当前日期:2017年7月02日	本月升压站工程已完成大部份, 目前进行消缺及场区平整, 围墙立柱喷真石漆, 围栏安装、室内消缺等工作, 光伏区本月的重点工作在消缺施工, 主要是对桩基础的二次灌浆, 立柱垂直度调整, 组件安装	

	 常州正衡电力工程监理有限公司 Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervisor QD 138 工程名称: 衢州杭泰柯城160MW光伏发电项目 施工部位: SVG安装雨棚支架 当前日期: 2017年7月03日 2017/07/03  常州正衡电力工程监理有限公司 Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervisor QD 138 工程名称: 衢州杭泰柯城160MW光伏发电项目 施工部位: 警卫室外刮腻子 当前日期: 2017年7月04日 2017/07/04  常州正衡电力工程监理有限公司 Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervisor QD 138 工程名称: 衢州杭泰柯城160MW光伏发电项目 施工部位: 配电楼西侧墙面喷真石漆 当前日期: 2017年7月07日 2017/07/07  常州正衡电力工程监理有限公司 Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervisor QD 138 工程名称: 衢州杭泰柯城160MW光伏发电项目 施工部位: 配电楼南侧墙面油漆施工 当前日期: 2017年7月06日 2017/07/06	平整度, U 型螺栓、压块调整, 电缆敷设、回填等工作。	
--	--	-------------------------------------	--

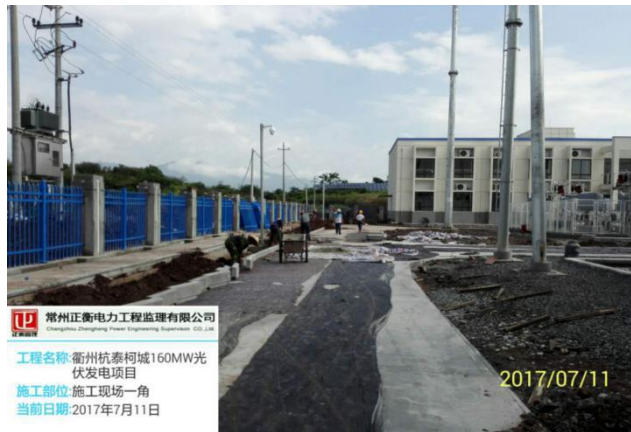



	 常州正衡电力工程监理有限公司 Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervisor CO.,LTD 工程名称: 衢州杭泰柯城160MW光伏发电项目 施工部位: 光伏区28到29区过山电缆沟开挖深度 当前日期: 2017年7月22日 2017/07/22 常州正衡电力工程监理有限公司 Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervisor CO.,LTD 工程名称: 衢州杭泰柯城160MW光伏发电项目 施工部位: 光伏区支架整改 当前日期: 2017年7月23日 2017/07/23		
	设备交付进度	本月设备全部交付完成，已并网发电	无
	图纸		
	质量体系运作情况	目前质量运行体系良好	加强对质量管理体系管理
	施工图会审	完成	
	设计交底	无	
	方案审查	无	无
	技术交底	无	
	设计变更	无	
安全	安全培训情况	加强安全管理及人员安全意识培训，要求	

		施工单位对施工人员进行早班安全教育	
	安全交底情况	\	
	安全措施落实情况	现场安全体系健全，本月天气干燥炎热，要求施工单位做好现场安全工作，注意人员防暑降温工作，现场施工作业的发电机设备、接地焊接施工作业需要配置灭火器	严格落实安全施工措施，做到安全防患于未然。
	安全文明施工情况	对现场进行安全巡视检查，现场安全文明体系良好	加强安全文明施工巡查力度。
质量	主要工序质量		
	主要原材料质量	/	/
	构（配）件质量	对新进场的构（配）件进行开箱检查	把控好进场材料质量关
	设备质量	/	进行进场报验、开箱检查
	质量验评情况	进行质量检查评估，按标准	加强过程检查力度，加大工序

		检查，是否符合要求	报验抽查力度
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况	/	/
	预算外签证	无	/
合同	合同签订情况	施工合同签订	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行工作

二、 本月进度情况

德京集团有限公司

序号	任务名称	本月施工进度情况	备注
1	主控楼	本月主控楼已投入使用	
2	综合楼	本月基本施工已完成	
3	配电楼	已完成，投入使用	
4	主变基础	已完成，投入使用	
5	SVG 室	已完成，投入使用	
6	消防水池及泵房	已完成	
7	滤波装置	已完成，投入使用	
8	场内接地极和排水	已完成	
9	门卫	门卫室主体结构墙体砌筑已完成，目前进行粉刷施工	
10	围墙	围墙构造浇筑完成，围栏安装完成	

中易建设有限公司

1	光伏区	光伏区截止本月支架安装 16.66MW, 组件安装 15.78MW。
---	-----	------------------------------------

鲲鹏集团建设有限公司

2	光伏区	光伏区截止本月支架安装 11.00MW、组件安装 10.6MW
---	-----	---------------------------------

衢州光明电力工程有限公司

3	升压站厂区电气安装	本月升压站场区设备全部安装完成，已投入使用
---	-----------	-----------------------

江苏天力建设有限公司		
4	光伏区电气安装	目前进行箱变安装，光伏区电缆沟开挖，进行电缆敷设，带电区域部分电缆回填工作

三、安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策	施工	安全分包情况			
人身重	机械设	电网事	划文件(份)	人数	分包队	分包队	系统外	系统外
伤	备	故			伍数量	伍人数	包队伍	队伍人
							数量	数
无	无	无		50 人	4	/	/	/

四、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	本月由于天气炎热，施工进度比较缓慢已要求施工单位对上下班时间进行调整，合理安排施工，加强进度管理制度	根据天气情况合理安排施工时间，调整人力、物力增加施工进度
安全管理	对现场施工人员进行安全教育，加强现场安全管理，对有安全隐患的区域早检查，早发现，早处理	认真落实安全教育，对施工现场加大安全隐患排查力度
质量管理	做好现场巡视检查，控制各施工节点质量，把控施工质量。	控制各节点质量检查力度，做好平行检验及旁站记录
技术管理	要求施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	
造价管理	/	/
物资供应	协助建设单位、施工单位做好物资进场工作，保证物资管理及保管。	做好物资保管工作，合理安排物资使用情况。

常州正衡电力工程监理有限公司
衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目监理部

2017 年 07 月 31 日
