



正衡监理

## 监 理 月 报

工程名称：衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

2017 年 08 月第 10 期



项目监理部（章）：

总监理工程师：李维军

报告日期：2017 年 08 月 31 日

# 监 理 月 报

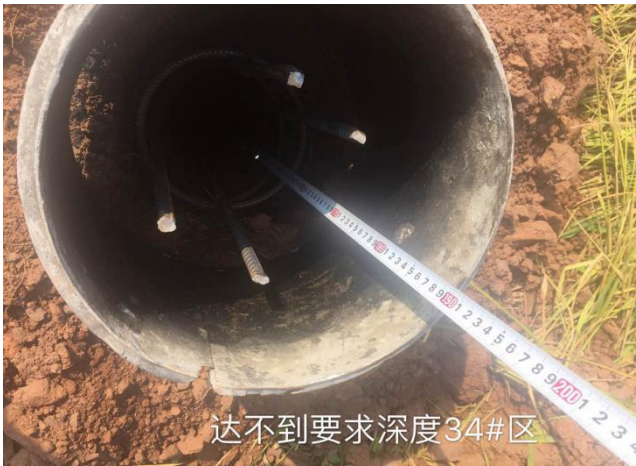
工程名称:衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目 月次 第 10 次 月报开始时间 2017 年 08 月 1 日 结

束日期 2017 年 09 月 1 日 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

## 一、工程影像资料

| 序号 | 单位工程标准名称            | 施工项目名称 | 资料类型 | 资料数量 | 备注 |
|----|---------------------|--------|------|------|----|
| 1  | 衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目 |        | 影像   | 80 张 |    |

## 一、 监理重点工作情况

| 专业 | 事项                                                                                                                                                                         | 本月重点工作情况                                                                                         | 下月重点工作计划 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 进度 | <br> | 本月升压站工程已完成大部份, 目前进行消缺及场区平整, 围墙立柱喷真石漆, 围栏安装、室内消缺等工作, 光伏区本月的重点工作在消缺施工, 主要是对桩基础的二次灌浆, 立柱垂直度调整, 组件安装 |          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <div data-bbox="336 197 975 645">  </div> <div data-bbox="336 645 975 1093">  <p>常州正衡电力工程监理有限公司<br/>Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision CO.,LTD</p> <p>工程名称: 衢州杭泰柯城160MW光伏发电项目<br/>施工部位: 光伏区19区方阵间接地焊接<br/>当前日期: 2017年8月05日</p> </div> <div data-bbox="336 1093 975 1541">  <p>常州正衡电力工程监理有限公司<br/>Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision CO.,LTD</p> <p>工程名称: 衢州杭泰柯城160MW光伏发电项目<br/>施工部位: 光伏区16区方阵间接地焊接<br/>当前日期: 2017年8月04日</p> </div> <div data-bbox="336 1541 975 1998">  <p>常州正衡电力工程监理有限公司<br/>Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision CO.,LTD</p> <p>工程名称: 衢州杭泰柯城160MW光伏发电项目<br/>施工部位: 光伏区12区部分直流电缆沟回填<br/>当前日期: 2017年8月03日</p> </div> | <p>平整度, U 型螺栓、压块调整, 电缆敷设、回填等工作。</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|





|                                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <div></div> |                                                                                  |                                                 |
| 设备交付进度                                                                                                                                                                         | 已并网发电                                                                            | 无                                               |
| 图纸                                                                                                                                                                             | /                                                                                |                                                 |
| 质量体系运作情况                                                                                                                                                                       | 本月质量情况<br>相 对 上 月 较<br>差，光伏区桩<br>基浇筑、组件、<br>支架安装等施<br>工情况，都有<br>不同程度的施<br>工质量问题。 | 加强施工管理，<br>加大现场巡查<br>和监控力度，对<br>现场施工部位<br>进行抽查。 |
| 施工图会审                                                                                                                                                                          | 完成                                                                               |                                                 |
| 设计交底                                                                                                                                                                           | 无                                                                                |                                                 |
| 方案审查                                                                                                                                                                           | 无                                                                                | 无                                               |
| 技术交底                                                                                                                                                                           | 无                                                                                |                                                 |

|    |          |                                              |                                     |
|----|----------|----------------------------------------------|-------------------------------------|
|    | 设计变更     | 无                                            |                                     |
| 安全 | 安全培训情况   | 要求施工单位对现场施工人员进行安全教育，在早班前进行安全意识讲解，注意现场施工安全事宜。 | 加强安全管理及人员安全意识培训，要求施工单位对施工人员进行早班安全教育 |
|    | 安全交底情况   | \                                            |                                     |
|    | 安全措施落实情况 | 现场安全设施配备齐全，对有安全隐患施工部位及时排查确保安全施工。             |                                     |
|    | 安全文明施工情况 | 现场安全文明施工安全良好，安全设备齐全。                         | 对现场安全隐患进行排查，加强现场安全巡视。               |
| 质量 | 主要工序质量   |                                              |                                     |
|    | 主要原材料质量  | /                                            | /                                   |
|    | 构（配）件质量  | 对新进场的构（配）件进行开箱检查                             | 把控好进场材料质量关                          |
|    | 设备质量     | /                                            | 进行进场报验、开箱检查                         |
|    | 质量验评情况   | 对现场施工质量进行检查，                                 | 加强过程检查力度，加大工序                       |

|    |        |                                     |          |
|----|--------|-------------------------------------|----------|
|    |        | 对施工存在质量问题，要求施工立即整改，整改完成我监理人员进行现场验收。 | 报验抽查力度   |
| 投资 | 资金情况   | /                                   | /        |
|    | 款项支付情况 | /                                   | /        |
|    | 预算外签证  | 无                                   | /        |
| 合同 | 合同签订情况 | 施工合同签订                              | /        |
|    | 合同执行情况 | 按合同执行                               | 做好合同执行工作 |

## 二、 本月进度情况

### 德京集团有限公司

| 序号 | 任务名称     | 本月施工进度情况   | 备注 |
|----|----------|------------|----|
| 1  | 主控楼      | 本月主控楼已投入使用 |    |
| 2  | 综合楼      | 本月基本施工已完成  |    |
| 3  | 配电楼      | 已完成，投入使用   |    |
| 4  | 主变基础     | 已完成，投入使用   |    |
| 5  | SVG 室    | 已完成，投入使用   |    |
| 6  | 消防水池及泵房  | 已完成        |    |
| 7  | 滤波装置     | 已完成，投入使用   |    |
| 8  | 场内接地极和排水 | 已完成        |    |
| 9  | 门卫       | 已完成        |    |
| 10 | 围墙       | 已完成        |    |

### 中易建设有限公司

|   |     |                                    |
|---|-----|------------------------------------|
| 1 | 光伏区 | 光伏区截止本月支架安装 16.66MW, 组件安装 15.78MW。 |
|---|-----|------------------------------------|

### 鲲鹏集团建设有限公司

|              |                   |                                       |
|--------------|-------------------|---------------------------------------|
| 2            | 光伏区               | 光伏区截止本月支架安装 11.00MW、组件安装 10.6MW       |
| 衢州光明电力工程有限公司 |                   |                                       |
| 3            | 升压站<br>厂区电<br>气安装 | 本月升压站场区设备全部安装完成，已投入使用                 |
| 江苏天力建设有限公司   |                   |                                       |
| 4            | 光伏区电<br>气安装       | 目前进行箱变安装，光伏区电缆沟开挖，进行电缆敷设，带电区域部分电缆回填工作 |

### 三、安全文明施工情况

| 事故（起）    |          |          | 编制安全策<br>划文件（份） | 施工<br>人数 | 安全分包情况     |            |                  |                 |
|----------|----------|----------|-----------------|----------|------------|------------|------------------|-----------------|
| 人身重<br>伤 | 机械设<br>备 | 电网事<br>故 |                 |          | 分包队<br>伍数量 | 分包队<br>伍人数 | 系统外<br>包队伍<br>数量 | 系统外<br>队伍人<br>数 |
| 无        | 无        | 无        |                 | 40 人     | 3          | /          | /                | /               |

### 四、施工重点工作情况

| 专业   | 本月重点工作情况                                        | 下月重点工作计划                                        |
|------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 进度管理 | 目前施工重点工作在光伏区消缺工作中，消缺施工应天气原因，上班时间的调整等因素，使施工进度缓慢。 | 要求施工合理安排施工时间，根据现场施工需求，加快施工进度。                   |
| 安全管理 | 安全措施良好，现场安全教育及时到位，现场安全设备配备齐全。                   | 要求各施工单位加大现场安全管理，加强对现场安全隐患区域排查，重点工作是对现场施工人员安全教育。 |
| 质量管理 | 对现场重要的施工部位进行旁站，控制施工施工质量，做好现场平行检查记录。             | 加强现场施工巡查力度，对重要的施工节点进行严控制。                       |
| 技术管理 | /                                               | /                                               |
| 造价管理 | /                                               | /                                               |
| 物资供应 | 协助建设单位、施工单位做好物资进场工                              | 做好物资保管工作，合理安排物资使用情况。                            |

|  |              |  |
|--|--------------|--|
|  | 作，保证物资管理及保管。 |  |
|--|--------------|--|

常州正衡电力工程监理有限公司  
衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目监理部  
2017 年 8 月 31 日
