



正衡监理

编号: JL-WD-02

监 理 月 报

工程名称: 无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏发
电站

2016 年 12 月第 2 期

项目监理部 (章):

总监理工程师: 洪震



报告日期: 2016年12月31日

监 理 月 报

工程名称: 无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏电站

月次 第 2 次 月报开

始时间 2016 年 12 月 1 日 结束日期 2016 年 12 月 31 日 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司


一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏电站		影像	5 张	

一、 监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度		20#--35# 单元打桩、支架组装及组件组装、汇流箱安装、逆变器基础浇筑, 接地电缆敷设, 直流电缆敷设, 低压电缆施工	35#--43# 单元打桩, 1#--43# 单元支架组装、组件安装、接地电缆敷设, 直流电缆敷设, 低压电缆施工

压电缆施工

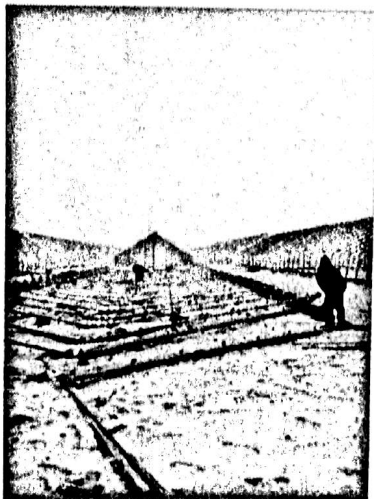



			
设备交付进度	设备、支架、组件、电缆、箱逆变器 etc 进场	组件供货，逆变器进场	
设计交付进度	图纸完成	图纸完成	
质量体系运作情况	质量体系健全，运行良好	落实质量保证体系，并对运行情况进行检查	
施工图会审	完成		
设计交底	完成		
方案审查	未交付	督促施工单位报审其他资料	
技术交底	完成		
设计变更	无		
安全			
安全培训情况	新进场员工已	督促施工单位	

			进行安全教育
	安全交底情况	督促施工单位对危险作业点进行班前交底	继续督促施工单位进行班前交底
	安全措施落实情况	落实不彻底,已要求施工单位认真落实	监督施工单位认真落实安全措施
	安全文明施工情况	现场安全、文明措施良好	加强现场安全管理力度
质量	主要工序质量	打桩, 支架组装, 组件安装, 电缆接地敷设	打桩, 支架组装, 组件组装, 电缆接地敷设
	主要原材料质量	电缆外观质量合格, 支架外观检查合格, 组件观感质量合格;	对主要材料进行检查
	构(配)件质量	进场材料质量合格	把控好进场材料质量关
	设备质量		进行进场报验、开箱检查
	质量验评情况	工序施工符合要求	加强过程检查力度, 加大工序报验抽查力度
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况		/
	预算外签证	无	/
合同	合同签订情况	施工合同签订	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行工作

二、本月进度情况

三、下月进度计划

5

			5		
2	支架安装		2017.3.10	2016.10.29	
3	组件安装		2017.3.10	2016.10.29	
4	直流电缆		2017.3.10	2016.10.29	
5	高压电缆		2017.3.10		
6	接地敷设		2017.3.10	2016.10.29	
7	汇流箱安装		2017.3.10	2016.11.20	
8	箱式变压器安装		2017.3.10	2016.3.16	
9	逆变器安装		2017.3.10	2016.3.16	

0MWp	0MWp	
23MWp/6	23MWp/6	
0MWp	0MWp	
23MWp/6	2MWp/60	
0MWp	0MWp	
22MWp/6	2MWp/60	
0MWp	0MWp	
4公里/12	2公里/12	
公里	公里	
60台	350台	
46台	46台	
4台/43		
台		
4台/43		
台		

四、安全文明施工情况

事故(起)			编制安全策 划文件(份)	施工 人数	安全文明施工情况		
人身重 伤	机械设 备	电网事 故			分包队 伍数量	分包队 伍人数	系统外 包队伍 数量 系统外 队伍人 数
无	无	无		412人	5		/

五、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	本月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性	要求施工单位安排施工进度计划，及时调整人力、物力
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。	审查施工项目《安全文明措施》及施工项目部施工安全管理、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，加强安全监理，发现问题及时提出整改要求并督促改正。
质量管理	组件到场进行开箱检查；单位工程重点部	督促施工单位按照施工工艺和设计要求及上海电

	位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	力的规范要求	施工
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	参与过程中	（关键）环节的施工技术交底会，监督检查
造价管理	对施工单位申请的工程款及时进行评审	对工程量清单	此，及时审核施工项目部报送的工程量清单、工程款支付申请
物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	督促施工单位	（复工日期的要求，安排人员、机具进行

无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏发电项目监理部

2016 年 12 月 31 日
