



编号: JL-WD-08

监 理 月 报

工程名称: 无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏发电
电站

2017 年 9 月第 8 期

项目监理部(章):



总监理工程师: 卢洪彦

报告日期: 2017 年 9 月 30 日



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 月 报

工程名称: 无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏发电站

月次 第 1 次 月报开


始时间 2017 年 9 月 1 日 结束日期 2017 年 9 月 30 日 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏发电站		影像	4 张	

一、 监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度	 	箱变、逆 变设备 消缺、电 缆刷防 火漆。光 伏区大 棚支架 消缺、 组件消 缺、1×4 电缆消	箱变、逆变 设备消缺、 电缆刷防 火漆。光伏 区大棚支 架消缺、 组件消缺 、1×4 电 缆消缺。汇 流箱安装 、底梁与 连接件焊

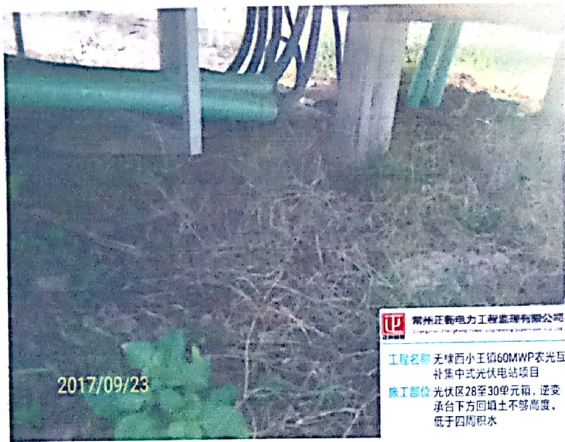

	 2017/09/23 常州正衡电力工程监理有限公司 工程名称 无锡西小王60MW农光互补集中式光伏电站项目 施工部位 光伏区23单元7号大棚接地扁铁外落	缺。汇流箱安装、底梁与连接件焊接	接消缺。工程材料归类并整理。
	 2017/09/23 常州正衡电力工程监理有限公司 工程名称 无锡西小王60MW农光互补集中式光伏电站项目 施工部位 光伏区28至30单元箱、逆变器台下方回填土不够高度，低于四周积水	消缺。工程材料归类并整理	下个光伏区 20WMP 暂无定做不做。
	设备交付进度	组件进场整理	光伏区用
	设计交付进度	图纸完成	图纸完成
	质量体系运作情况	质量体系不健全，	要求施工单位健全质量体系
	施工图会审	有	未提交监理
	设计交底	有	未提交监理
	方案审查	提交	未提交监理
	技术交底	有	未提交监理
	设计变更	无	
安全	安全培训情况	督促施工单位对新进场员工进行安全培训	督促施工单位对进场新员工进行安全教育



	安全交底情况	督促施工单位 对危险作业点 进行班前交底	继续督促施工单 位进行班前交底
	安全措施落实情况	落实不彻底， 已要求施工单 位认真落实	监督施工单位认 真落实安全措施
	安全文明施工情况	现场安全、文 明措施基本较 差	要求施工单加强 现场安全管理力 度
质量	主要工序质量	底梁焊接，支 架安装，组件 安装，接地扁 铁焊接等消缺	光伏区、升压站 消缺
	主要原材料质量	电缆外观质量 合格，构架、支 架、设备观感质 量合格；	对主要材料进行 检查
	构（配）件质量	进场材料、设 备质量合格	把控好进场材料 与设备质量关
	设备质量	未提交质保 资料	未提交质保资 料
	质量验评情况	工序施工基本 符合要求	加强过程检查力 度，要求施工方 工序报验
投资	资金情况	支付工程进度 款（合同内）	未提交合同
	款项支付情况	工程进度款	工程进度款
	预算外签证	有	有



合同	合同签订情况	施工合同签订	未提交合同
	合同执行情况	要求提供合同	要求提供合同， 做好合同执行工作

二本月进度情况

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	本月实际完成(完成量/总量)	累计完成(完成量/总量)	备注
1	定位放线	2016.10.21	2016.11.30	2016.10.21	2016.11.30	100%	100%	
2	基础施工	2016.10.22	2016.12.30	2016.10.22	2016.12.30	100%	100%	
3	构架、支架安装	2017.6.30	2017.7.27	2017.6.30	2017.7.27	80%	80%	
4	设备安装	2016.11.30	2017.2.30	2016.11.30	2017.10.30	66.6%	66.67%	
5	敷设电缆	2017.6.30	2017.3.10	2016.10.29	2017.6.18	66.67%	66.67%	
6	高压电缆	2017.6.17	2017.7.27	2017.6/30	2017.7.27	66.67%	66.67%	
7	接地焊接	2017.6.30	2017.3.10	2016.10.28	2017.6.28	66.67%	66.67%	
8	收集资料并审核	2017.7.18	2017.7.31	2017.7.18	2017.7.31			
9	并网发电	2017.7.18	2017.7.31	2017.7.18	2017.8.23	40WMP	40WMP	
10	整改质量缺陷与整改资料	2017.7.25	2017.7.31	2017.7.25	2017.8.31	暂无定期	暂无定期	

三、下月进度计划

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	下月计划完成(完成量/总量)	本月实际完成(完成量/总量)	权值
1	电气部分	消缺	消缺	消缺	消缺	消缺	消缺	
2	底梁焊接	消缺	消缺	消缺	消缺	消缺	消缺	
3	支架安装	消缺	消缺	消缺	消缺	消缺	消缺	
4	组件安装	消缺	消缺	消缺	消缺	消缺	消缺	

四、安全文明施工情况



事故(起)			编制安全策	施工	安全分包情况			
人身重	机械设	电网事	划文件(份)	人数	分包队	分包队	系统外队伍	系统外队伍
伤	备	故			伍数量	伍人数	伍数量	人数
无	无	无		30人	2	30人	2	30人

五、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置,充分调动施工人员的积极性	要求施工单位合理安排施工进度计划,及时调整人力、物力,进行削缺整改,20MW开工准备。
安全管理	督促施工单位按《安全文明施工管理制度》,安委会要求定期对现场进行安全检查;对施工人员进行安全培训、考试,提高作业人员安全防范意识,落实安全文明施工措施。	检查:施工项目部《安全文明措施》落实情况。施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件,实施安全监理,发现问题及时提出整改要求并限期改正。
质量管理	检查:单位工程重点部位消缺施工;督促施工单位质量通病防治措施;监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	督促施工单位按照施工工艺和设计要求及相关电力规范要求消缺施工
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底,现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	要求施工单位对过程中重要(关键)环节的施工技术交底会,并监督检查执行情况。
造价管理	要求施工单位提供施工合同	要求施工单位提供施工合同
物资供应	无	无

无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏发电项目监理部

2017 年 9 月 30 日

