

表号: 05



守法、诚信、公正、科学

监 理 月 报

工程名称: 内蒙古清佑新能源科技有限公司察右中旗 40MWp (二期
10MWp) 光伏扶贫新村项目

2017 年 05-06 月 第 5 期

项目监理部 (章):

总监理工程师: 李全忠

报告日期: 2017 年 06 月 25 日



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 月 报

工程名称：内蒙古清佑新能源科技有限公司察右中旗 40MWp（二期 10MWp）

光伏扶贫新村项目


编号：05

本月工程情况概要

相关情况登记			
本月日历天	31 天	实际工作日	31 天
建设单位通知单	0 份	建设单位联系单	0 份
工程暂停令	0 份	监理工程师通知单	0 份
监理工程师备忘录	0 份	监理工程师联系单	0 份
例会会议纪要	0 份	专题会议纪要	0 份
本月工程现场大事记			
1、05 月 25 日：16#桩基加固、16#连接光伏区接地、厂区围栏安装。 2、05 月 31 日：开始架设外线电缆； 3、06 月 02 日：外线电缆架设完成； 4、06 月 04 日：16#接地完成； 5、06 月 08 日：16#桩基加固完成；18#桩基加固开始； 6、06 月 10 日：17#电缆铺设完成；14#围栏安装完成； 7、06 月 12 日：18#接地完成；17#接地开始连接；15#围栏安装完成； 8、06 月 13 日：18#、17#箱逆变接口防火封堵完成；18#桩基加固完成；17#桩基加固开始； 9、06 月 14 日：1 号、3 号铁塔安装电缆固定支架完成；16#围栏安装完成； 10、06 月 16 日：ADSS 光纤开始架设； 11、06 月 17 日：ADSS 光纤架设完成； 12、06 月 19 日：线路电缆及进入升压站电缆连接线路电缆终端完成；主线电缆耐压试验完成； 13、06 月 20 日：盘柜内控制线路连接完成；各交接试验完成； 14、06 月 25 日：线路埋标志桩埋设完成；			



本月工程质量控制情况评析

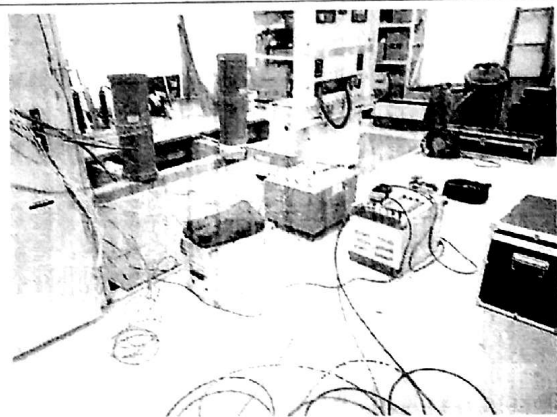本月抽查、见证试验次数	5 次	试验结果不合格次数	/次
设备开箱检查次数	0 次	检查不符合要求次数	/次
本月查验分项工程	0 项	其中一次验收合格计	/项
发出监理联系单（质量控制类）	0 次 0 份		
工程质量情况简析（文字或图表）			
			
下月质量情况预计和目标			
6 月 30 日并网完成，进入消缺状态。16#、17#、18#支架加固开始，监理做到工程质量的事前控制措施，保证施工质量，确保 6.30 并网成功。			

本月施工安全生产管理工作评析


本月施工生产安全管理工作情况登记	
本月安全检查次数	2 次
发出监理通知单（安全控制类）	0 份
工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表）	
施工单位安全生产管理状况：现场安全文明施工处于可控状态 监理单位履行监理安全责任情况： 监理人员现场每天跟踪检查，没有发现有违反重大安全条例的事情发生。	
下月施工安全生产管理工作展望和目标	
下月继续保持安全工作的好连续性，严格执行安全施工条例，总结安全工作出现的问题，及时把安全隐患消灭在萌芽状态，确保整个工程安全“0”事故。	



本月工程进度控制情况评析

工程开工日期	2016. 09. 24	工程竣工日期	2017. 06. 30
本月计划完成至	2017. 06. 25		
本月实际完成至	2017. 06. 25		
本月批准延长工期	0 天	累计延长工期	0 天
发出监理通知单（进度控制类）			0 份

本月工程进度情况简析（文字或图表）

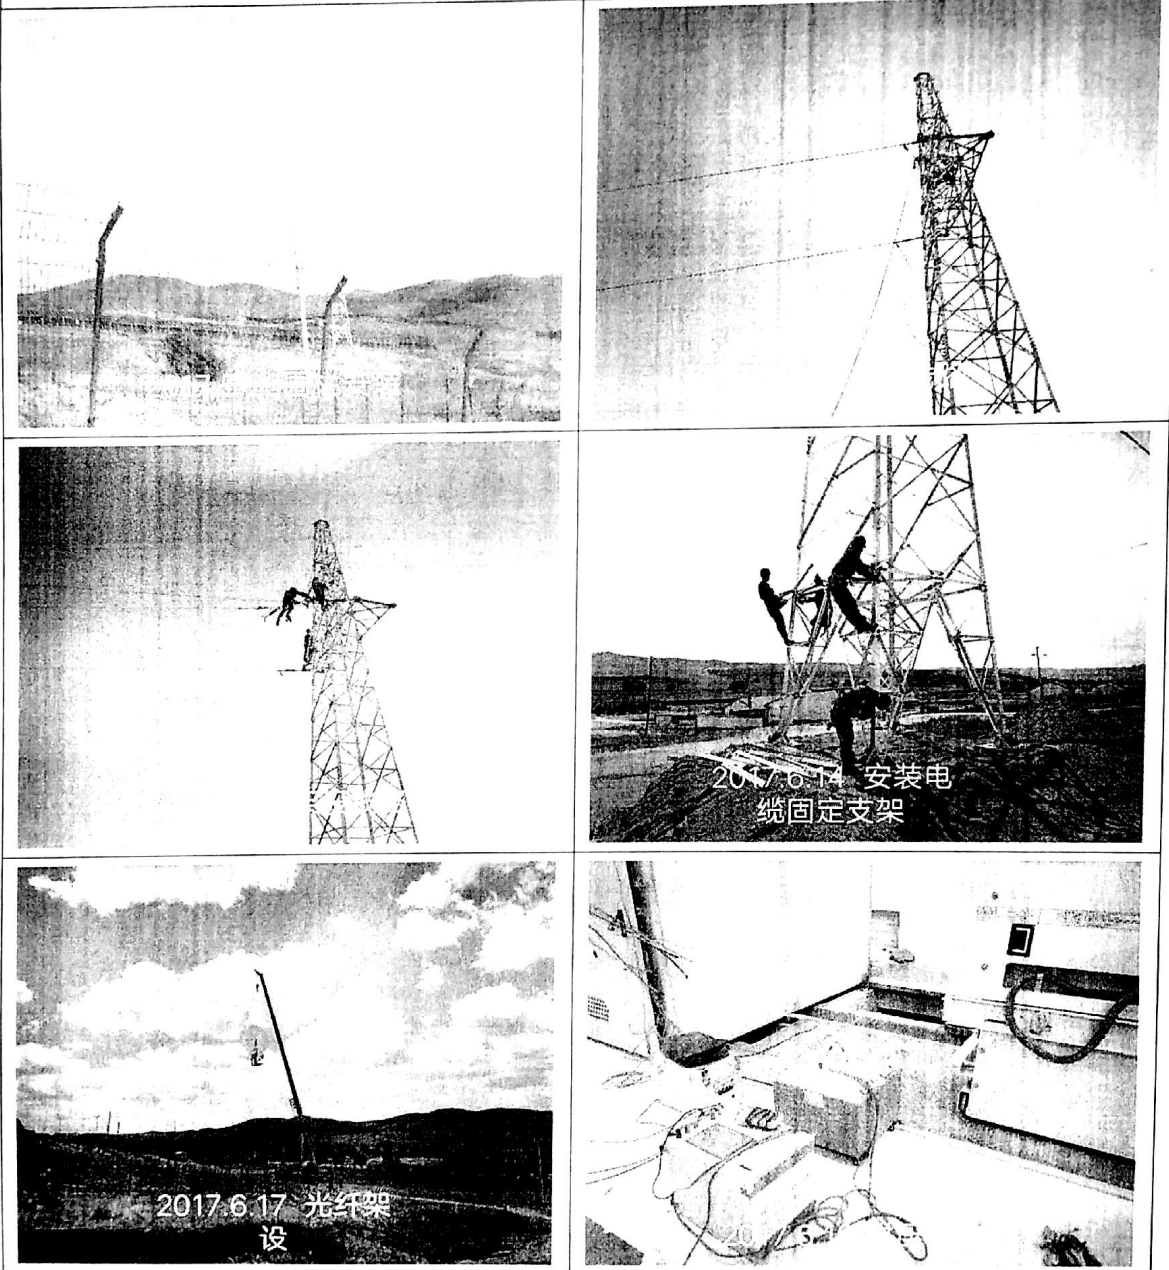

下月工程进度展望

06 月 30 日满足并网



本月费用控制情况评析

工程总投资额		/ 万元	
累计完成金额占总投资额百分比		/ %	
本月监理批准付款	/ 万元	累计批准付款额	/ 万元
本月发生批准索赔	/ 万元	累计发生索赔额	/ 万元
发出监理通知单（造价控制类）		/份	
工程费用控制情况简析（文字或图表）			
根据合同规定，工程费用按节点支付，监理部进行工程量复核，费用由总包单位控制。			
预计下月工程发生费用金额			
同上			

本月工程其它事项

1, 本工程已经安全生产 270 天。

