



正衡监理

编号: JL- (QZYW) -02

监 理 月 报

工程名称: 青州尧王制药有限公司 12MWP 屋顶分布式电站项目

2016 年 12 月第 2 期

项目监理部 (章):



总监理工程师: 徐彪

报告日期: 2016 年 12 月 30 日

监 理 月 报

工程名称：青州尧王制药有限公司 12MWP 屋顶分布式电站项目 月次 第 2 次 月报开始时间 2016 年

12 月 1 日 结束日期 2016 年 12 月 30 日 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

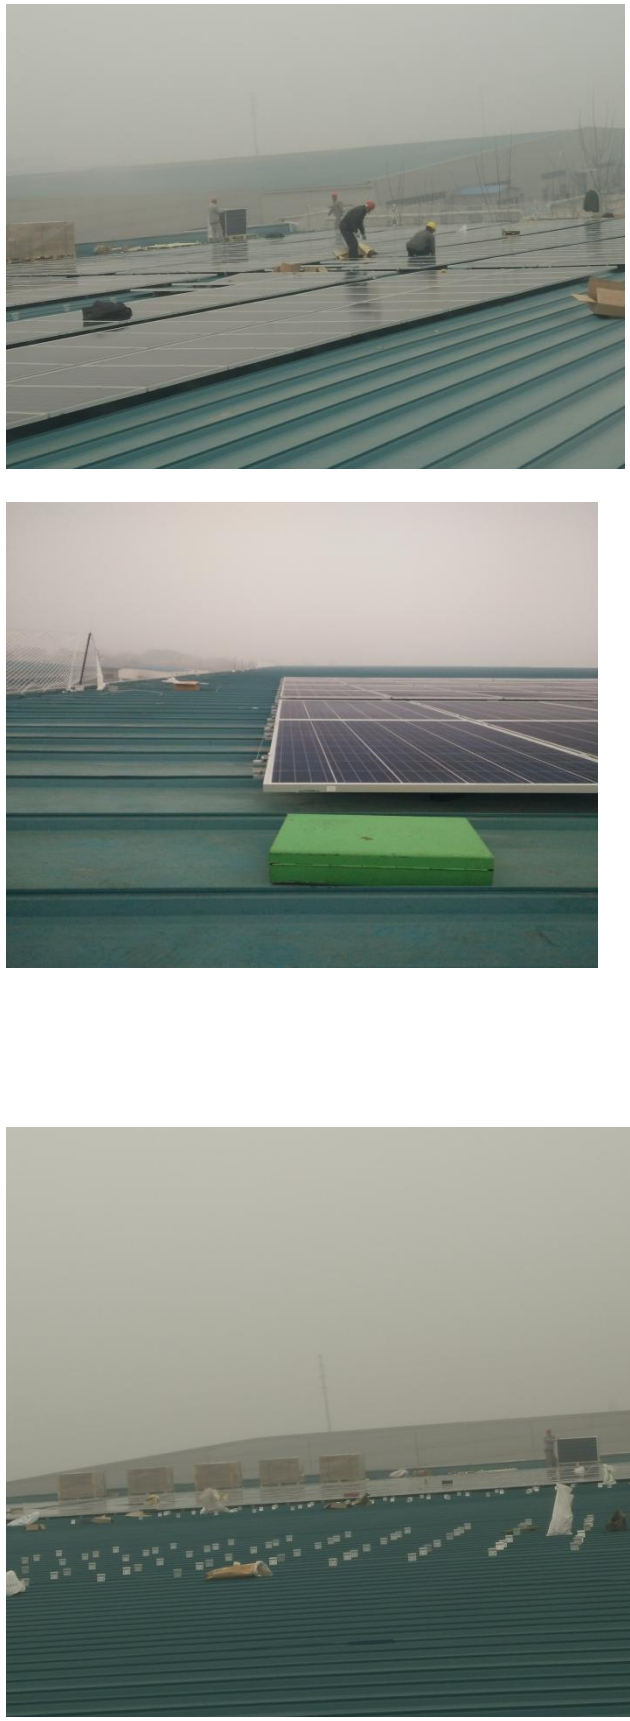
序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	青州尧王制药有限公司 12MWP 屋顶分布式电站项目		影像	40 张	

一、 监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度		一、供应商材料、设备进场情况 1、屋顶厂房区为彩钢瓦结构，目前夹具、组件材料断断续续供应不足，到场的材料基本安装完毕。厂房屋顶正在组件安装，现在施工人员主要工作就是夹具组装，厂	所有光伏板安装完成，自发自用 6MWP 并网发电； 夹具安装调整完成； 组件安装调整完成，全容量并网； 光伏区汇流箱安装完成； 光伏区光伏电缆敷设、接线完成。

  		房屋顶做安全防护，组件安装工作。除此以外的所有材料设备均在采购中。 2、组件现在还有部分未到场，夹具到场断断续续，影响施工进度。 二、施工情况 1、现场仓库厂房加固、防腐刷漆已经完成，组件安装与外线安装同时进行。 其他分项工程截至今日均未开展。施工进度有点慢，甲方又要求在本月完成 6MW 自发自用并网，时间非常紧，施工任务相当繁重，估计一二三零不了网。 2、其他箱变基础、开关站基础
--	--	--

  	施工都未进行施工。 三、监理工作情况 1、我方本月抄发联系单九份，会议纪要六份 2、业主对我方给予的业务及技术支持和帮助很大。 3、目前我方驻场人员两人，所有工作联系都靠电话。 4、现场进场材料较多，且放置区域不集中，加大了工作量。 5、施工方资料报送不及时，我方在收集资料方面很困难。 6、因施工环境特殊，安全工作的落实十分重要。 7、对加固完成报审的厂房进	
--	---	--

		行检验，检验出现的问题以下联系单要求施工方整改。 四、其他 资料方面已经督促施工方进一步完善。 五、总结 项目开工至今顺利进行，就是施工方所备材料滞后赶不上进度。要求施工方加大管理力度，合理利用资金和用工，在保质保量保安全的前提下，加快施工进度，完成目标工期。	
	设备交付进度	设备、组件、电	组件供货

		缆、等进场	
	设计交付进度	图纸未完成	图纸完成
	质量体系运作情况	质量体系健全，运行良好	落实质量保证体系，并对运行情况进行检查
	施工图会审	未完成	
	设计交底	完成	
	方案审查	未交付	督促施工单位报审其他资料
	技术交底	完成	
	设计变更	无	
安全	安全培训情况	新进场员工已进行安全培训	督促施工单位对进场新员工进行安全教育
	安全交底情况	督促施工单位对危险作业点进行班前交底	继续督促施工单位进行班前交底
	安全措施落实情况	落实不彻底，已要求施工单位认真落实	监督施工单位认真落实安全措施
	安全文明施工情况	现场安全、文明措施良好	加强现场安全管理力度
质量	主要工序质量	组件安装，电缆敷设，电缆头制作及耐压试验，钢结构加固报审检验。	组件安装；电缆敷设，电缆头制作及耐压试验；逆变器试验及调试。
	主要原材料质量	电缆外观质量合格，组件观感	对主要材料进行检查

		质量合格；	
	构（配）件质量	进场材料质量合格	把控好进场材料质量关
	设备质量	进行进场报验、开箱检查	进行进场报验、开箱检查
	质量验评情况	工序施工符合要求	加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况	申请支付490000万元	/
	预算外签证	无	/
合同	合同签订情况	施工合同签订	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行工作

二、 本月进度情况

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	本月实际完成（完成量 / 总量）	累计完成（完成量 / 总量）	备注
江苏省江建集团有限公司								
1	钢结构加固		2016.12.15	2016.11.3	2016.12.25	完成		
2	防腐刷漆		2016.12.20	2016.11.10	2016.12.26	完成		
3	组件安装	2016.12.15		2016.12.19		1/3		
4	外线路	2016.12.18		2016.12.20				

三、 下月进度计划

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	下月计划完成（完成量 / 总量）	本月实际完成（完成量 / 总量）	权值
江苏省江建集团有限公司								
1	组件安装		2017.1.20			完成		
2	外线路		2017.1.20			完成		

四、安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策	施工	安全分包情况			
人身重伤	机械设 备	电网事故	划文件(份)	人数	分包队 伍数量	分包队 伍人数	系统外 包队伍 数量	系统外 队伍人 数
无	无	无	2	80 人	/	/	/	/

五、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性	配合建设单位做好并网前准备工作。要求施工单位合理安排施工进度计划，及时调整人力、物力
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。	审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。
质量管理	组件到场进行开箱检查；单位工程重点部位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	督促施工单位按照施工工艺和设计要求和规范要求施工
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。

造价管理	对施工单位申请的工程款及时进行评审	对工程量实施计量，及时审核施工项目部报送的工程量清单、进度款支付申请
物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	督促施工单位按照复工日期的要求，安排人员、机具进行施工。

常州正衡电力工程监理有限公司

青州尧王制药有限公司 12MWP 屋顶分布式电站项目监理
部

2016 年 12 月 30 日
