

定边县公布井光伏园区 P2 区 110KV 升压站建设工程

监理月报

第 3 期

2017 年 2 月 14 日 至 2017 年 2 月 28 日

内容提要:


月工程情况概要


月工程质量控制情况评析

月工程安全生产管理工作评析

月工程进度控制情况评析

本月工程其它事项

项目监理机构 (章): 

总监理工程师: 

日 期: 2017 年 2 月 25 日

本月工程情况概要

相关情况登记			
本月日历天	28 天	实际工作日	14 天
建设单位通知单	0 份	建设单位联系单	0 份
工程暂停令	0 份	监理工程师通知单	0 份
监理工程师备忘录	0 份	监理工程师联系单	0 份
例会会议纪要	0 份	专题会议纪要	0 份
本月工程现场大事记			
1、春节放假，2月16日，施工单位进场继续施工。 2、2月15日，工地现场召开工作计划安排会议。 3、2月16日110KV送出线路安全检查。 4、下发监理工程师复工令。 5、全场区主网接地开始施工。 6、2月20日大雪，现场清扫积雪。 7、2月25日电气楼开始搭设脚手架，现场进行安全交底			

本月工程质量控制情况评析

本月抽查、见证试验次数	0次	试验结果不合格次数	0次
设备开箱检查次数	0次	检查不符合要求次数	0次
本月查验分项工程	0项	其中一次验收合格计	0项
发出监理联系单（质量控制类）			0次

工程质量情况简析（文字或图表）

- 1、本月中电气楼施工正常。
- 2、全场区接地正常施工。
- 3、设备基础正常施工。

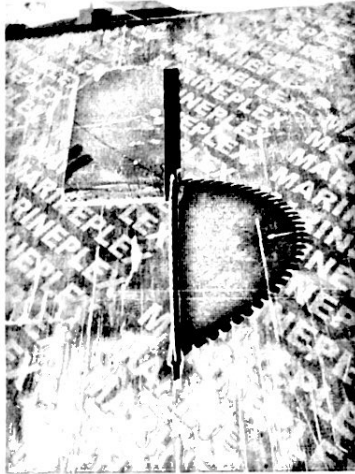


p2 区综合楼外墙构造柱混凝土施工
漏浆，有蜂窝麻面

下月质量情况预计和目标

- 1、室外设备基础 3 月 5 日全部完成。
- 2、电气楼 3 月 25 日封顶。
- 3、事故油池 3 月 15 日完成。
- 4、综合楼 3 月 10 日主体完成。

本月施工安全生产管理工作评析

本月施工生产安全管理工作情况登记	
本月安全检查次数	1 次
发出监理通知单（安全控制类）	0 份
工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表）	
施工单位安全生产管理状况：现场安全文明施工处于可控状态 监理单位履行监理安全责任情况： 监理人员在对现场施工的人员基本上每天都要检查，没有发现有违反安全条例的事情发生。	
	
在升压站发现氧气瓶与液化气瓶距离小于安全距离，已督促施工单位整改	p2 区圆盘锯使用未添加安全保护罩，已要求施工单位整改
下月施工安全生产管理工作展望和目标	
下月继续保持安全工作的良好连续性，严格执行安全施工条例，定期召开安全例会，总结安全工作出现的问题，把安全隐患消灭在萌芽状态，确保整个工程安全“0”事故。	

监理单位
（6）

本月工程进度控制情况评析

工程开工日期	2016. 11. 14	工程竣工日期	2017. 5. 30
本月计划完成至	2017. 2. 28		
本月实际完成至	2017. 2. 28		
本月批准延长工期	0 天	累计延长工期	0 天
发出监理通知单（进度控制类）	0 份		

本月工程进度情况简析（文字或图表）



2017.2.25 公司党志东、袁克鹏、监理在 p2 区测试主网接地电阻_(5)



2017.2.23 下午监理和质检部在 p2 区电气房巡视_(2)

下月工程进度展望

- 1、室外设备基础 3 月 5 日全部完成。
- 2、电气楼 3 月 25 日封顶。
- 3、事故油池 3 月 15 日完成。
- 4、综合楼 3 月 10 日主体完成。

本月工程其它事项

1, 本工程已经安全生产 81 天。
