

定边县公布井光伏园区 P3 区 110KV 升压站建设工程

监理月报

第 7 期

2017 年 6 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

内容提要:

月工程情况概要

月工程质量控制情况评析

月工程安全生产管理工作评析

月工程进度控制情况评析

本月工程其他事项

项目监理机构

总监理工程师

日

期 2017 年 6 月 25 日



本月工程情况概要

相关情况登记			
本月日历天	30 天	实际工作日	30 天
建设单位通知单	0 份	建设单位联系单	0 份
工程暂停令	0 份	监理工程师通知单	2 份
监理工程师备忘录	0 份	监理工程师联系单	0 份
例会会议纪要	4 份	专题会议纪要	0 份
本月工程现场大事记			
1、6月1日，电气防顶做防水。 2、6月2日，全场消防管道铺设完毕。 3、6月7日，电气房内焊接安装明敷接地干线。 4、6月14日，管理区道路浇筑。 5、6月22日，电气楼外围开挖安装排水管道。			

本月工程质量控制情况评析


本月抽查、见证试验次数	0 次	试验结果不合格次数	0 次
设备开箱检查次数	0 次	检查不符合要求次数	0 次
本月查验分项工程	0 项	其中一次验收合格计	0 项
发出监理联系单（质量控制内）		0 次	

工程质量情况简析

- 1、本月中电气楼施工正常。
- 2、全场区接地正常施工。
- 3、设备基础正常施工。



2017.6.15 在 p3 管理区浇筑道路

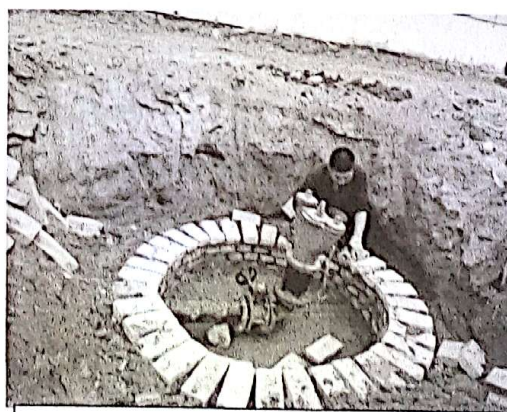

砖砌消防阀门井

下月质量情况预计和目标

- 1、7 月 2 日前道路浇筑全部完成。
- 2、7 月 8 日前电气楼外围安装排水管道全部完成。

本月施工安全生产管理工作评析

本月施工生产安全管理工作情况登记

本月安全检查次数	1 次
发出监理通知单（安全控制内）	1 份

工程施工安全管理工作简析（文字或图表）

施工单位安全生产管理状况：现场安全文明施工处于可控状态

监理单位履行监理安全责任情况：监理人员对现场施工的人员基本上每天都要检查，没有发现有违反安全条例的事情发生。



2017.6.7 日在 p3 升压站检查二次等电位接地焊接



2017.6.15 在 p3 综合楼二层和质检部检查粘砖


下月施工安全生产管理工作展望和目标

下月继续保持安全工作的好连续性，严格执行安全施工条例，定期召开安全例会，总结安全工作出现的问题，把安全隐患消灭在萌芽状态，确保整个工程安全“0”事故。

本月工程进度控制情况评析

工程开工日期	2016.11.14	工程竣工日期	2017.6.30
本月计划完成至	2017.6.30		
本月实际完成至	2017.6.30		
本月批准延长工期	0 天	累计延长工期	0 天
发出监理通知单（进度控制内）	0 份		

本月工程进度情况简析（文字或图表）

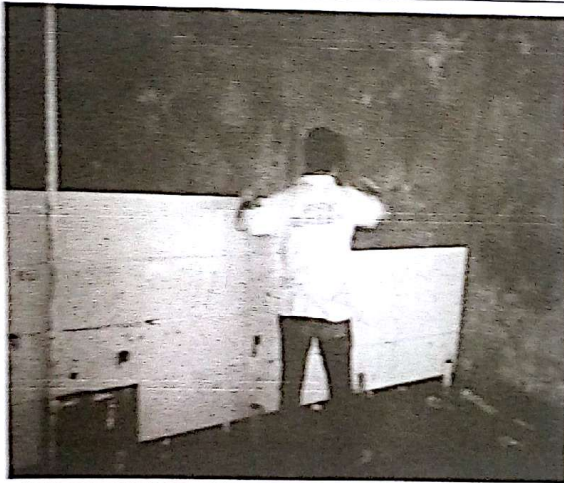

20170611_p3 综合楼粘砖



20170622_测试 p3 区防雷接地

本月工程其他事项

- 1、本工程已经安全生产 202 天
