

定边县公布井光伏园区 P3 区 110KV 升压站建设工程

监理月报

第 3 期

2017 年 2 月 14 日 至 2017 年 2 月 28 日

内容提要:

月工程情况概要

月工程质量控制情况评析

月工程安全生产管理工作评析

月工程进度控制情况评析

本月工程其它事项

项目监理机构 (章):

总监理工程师:

日

期: 2017 年 2 月 25 日

本月工程情况概要


相关情况登记			
本月日历天	28 天	实际工作日	14 天
建设单位通知单	0 份	建设单位联系单	0 份
工程暂停令	0 份	监理工程师通知单	0 份
监理工程师备忘录	0 份	监理工程师联系单	0 份
例会会议纪要	0 份	专题会议纪要	0 份
本月工程现场大事记			
1、春节放假，2月16日，施工单位进场继续施工。 2、2月15日，工地现场召开工作计划安排会议。 3、2月16日110KV送出线路安全检查。 4、下发监理工程师复工令。 5、全场区主网接地开始施工。 6、2月20日大雪，现场清扫积雪。 7、2月26日，综合楼脚手架固定。 8、2月27日，砌筑电缆沟。			

本月工程质量控制情况评析

本月抽查、见证试验次数	0次	试验结果不合格次数	0次
设备开箱检查次数	0次	检查不符合要求次数	0次
本月查验分项工程	0项	其中一次验收合格计	0项
发出监理联系单（质量控制类）			0次

工程质量情况简析（文字或图表）

- 1、本月中电气楼施工正常。
- 2、全场区接地正常施工。
- 3、设备基础正常施工。

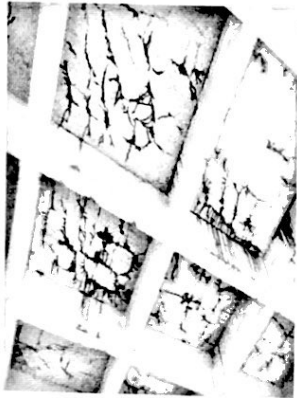

p3 区电气楼屋面严重渗漏




2017.2.27 下午 p3 电气楼外围主接地垂直接地极未使用镀锌钢管且焊接截面积不符合要求

下月质量情况预计和目标

- 1、35KV 及主变基础 3 月 15 日全部完成。
- 2、110KV 设备基础 3 月 5 日全部完成。
- 3、全场区接地 3 月 5 日全部完成。
- 4、全场区电缆沟 3 月 15 日全部完成。
- 5、综合楼主控室 3 月 10 日全部完成。

本月施工安全生产管理工作评析

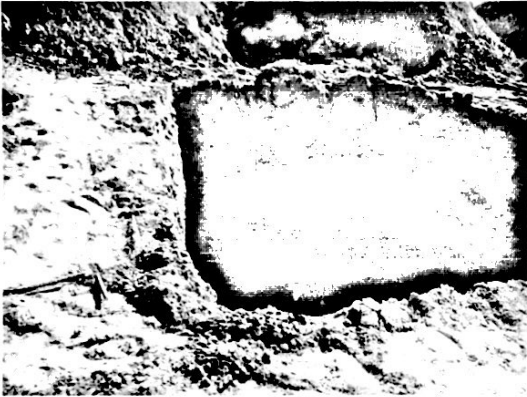本月施工生产安全管理工作情况登记	
本月安全检查次数	1 次
发出监理通知单（安全控制类）	0 份
工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表）	
施工单位安全生产管理状况：现场安全文明施工处于可控状态 监理单位履行监理安全责任情况： 监理人员在对现场施工的人员基本上每天都要检查，没有发现有违反安全条例的事情发生。  2017.2.24 室外设备基础 无护坡	
下月施工安全生产管理工作展望和目标	
下月继续保持安全工作良好连续性，严格执行安全施工条例，定期召开安全例会，总结安全工作出现的问题，把安全隐患消灭在萌芽状态，确保整个工程安全“0”事故。	

本月工程进度控制情况评析

工程开工日期	2016. 11. 14	工程竣工日期	2017. 5. 30
本月计划完成至	2017. 2. 28		
本月实际完成至	2017. 2. 28		
本月批准延长工期	0 天	累计延长工期	0 天
发出监理通知单（进度控制类）	0 份		

本月工程进度情况简析（文字或图表）



2017.2.27p3 区 svg 电缆沟正在施工中



2017.3.15 监理和正信项目部及质检部在 p3 区主体验收

本月工程其它事项

- 1, 本工程已经安全生产 81 天。
