

定边县公布井光伏园区 P3 区 110KV 升压站建设工程

监理月报

第 6 期

2017 年 5 月 1 日至 2017 年 5 月 31 日

内容提要:


月工程情况概要

月工程质量控制情况评析

月工程安全生产管理工作评析

月工程进度控制情况评析

本月工程其他事项



项目监理机构

总监理工程师

梅波

日

期 2017 年 5 月 28 日

本月工程情况概要

相关情况登记

本月日历天	31 天	实际工作日	31 天
建设单位通知单	2 份	建设单位联系单	0 份
工程暂停令	0 份	监理工程师通知单	1 份
监理工程师备忘录	0 份	监理工程师联系单	1 份
例会会议纪要	4 份	专题会议纪要	0 份

本月工程现场大事记

- 1、5月1日，一层主控室地坪施工。
- 2、5月5日，综合楼外墙保温。
- 3、5月6日，综合楼屋面盖瓦。
- 4、5月7日，综合楼屋面做防水，屋内抹灰。
- 5、5月12日，综合楼屋面做透气孔盖板。
- 6、5月20日，综合楼外墙喷漆。
- 7、5月26日，综合楼吊顶装修。

本月工程质量控制情况评析


本月抽查、见证试验次数	0 次	试验结果不合格次数	0 次
设备开箱检查次数	0 次	检查不符合要求次数	0 次
本月查验分项工程	0 项	其中一次验收合格计	0 项
发出监理联系单（质量控制内）		0 次	

工程质量情况简析

- 1、本月中电气楼施工正常。
- 2、全场区接地正常施工。
- 3、设备基础正常施工。



2017.5.16 日在 p3 综合楼屋面
盖瓦

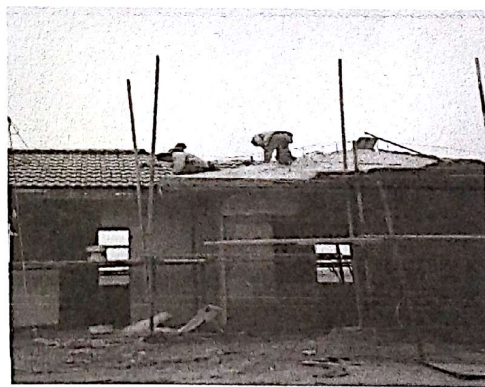

2017.5.22 日上午在 p3 区门卫盖瓦

下月质量情况预计和目标

- 1、5 月 2 日前屋面防水全部完成。
- 2、5 月 7 日前全场道路全部完成。

本月施工安全生产管理工作评析


本月施工生产安全管理工作情况登记

本月安全检查次数	1 次
发出监理通知单（安全控制内）	1 份


工程施工安全管理工作简析（文字或图表）

施工单位安全生产管理状况：现场安全文明施工处于可控状态

监理单位履行监理安全责任情况：监理人员对现场施工的人员基本上每天都要检查，没有发现有违反安全条例的事情发生。

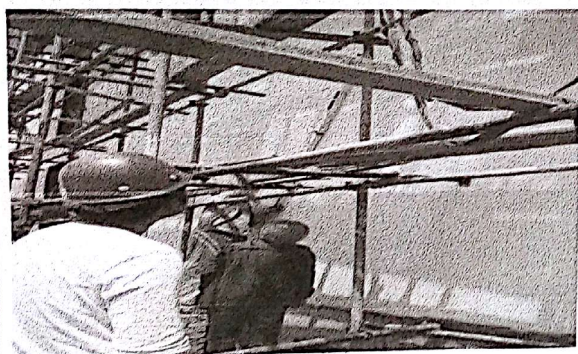

2017.5.8 监理和质检部检查主控室保温墙面。

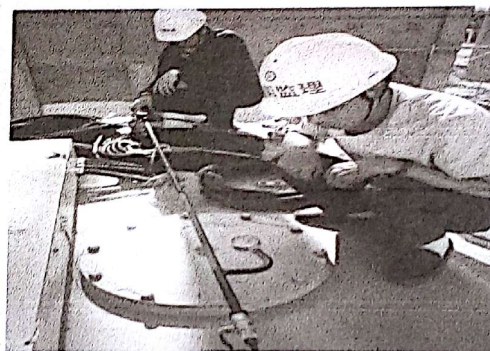

2017.5.12 日下午和业主验收主变


下月施工安全生产管理工作展望和目标

下月继续保持安全工作的好连续性，严格执行安全施工条例，定期召开安全例会，总结安全工作出现的问题，把安全隐患消灭在萌芽状态，确保整个工程安全“0”事故。


本月工程进度控制情况评析

工程开工日期	2016.11.14	工程竣工日期	2017.5.30
本月计划完成至	2017.5.30		
工程暂停令	2017.5.30		
本月批准延长工期	0 天	累计延长工期	0 天
发出监理通知单（进度控制内）			

本月工程进度情况简析（文字或图表）

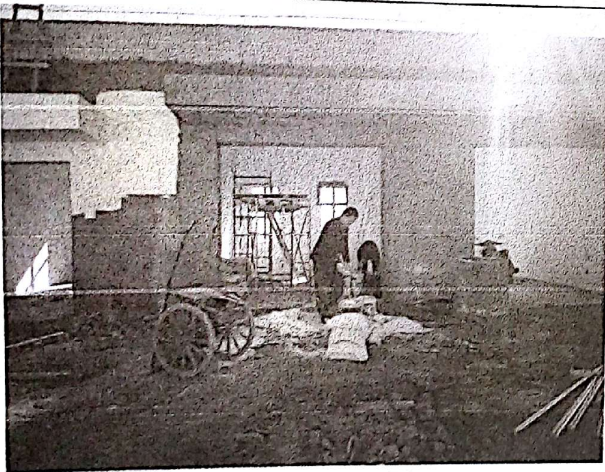

20170525p3 库房批腻子

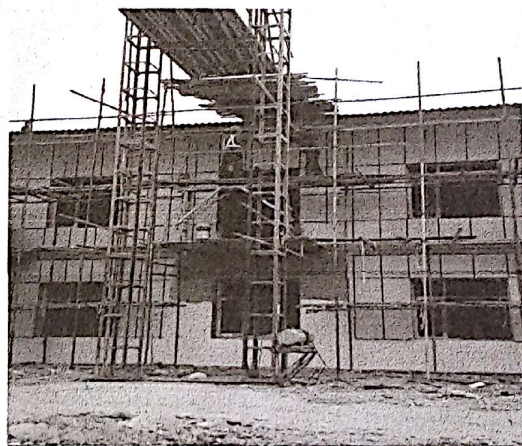

2017.5.22 日 p3 区综合楼外墙喷漆

本月工程其他事项

- 1、本工程已经安全生产 172 天
