

定边县公布井光伏园区 P4 区 110KV 升压站建设工程

监理月报

第 4 期

2017 年 3 月 1 日 至 2017 年 3 月 31 日

内容提要:

月工程情况概要

月工程质量控制情况评析

月工程安全生产管理工作评析

月工程进度控制情况评析

本月工程其它事项

项目监理机构（章）: 

总监理工程师: 梅波

日 期: 2017 年 3 月 25 日

本月工程情况概要


相关情况登记			
本月日历天	31 天	实际工作日	31 天
建设单位通知单	0 份	建设单位联系单	1 份
工程暂停令	0 份	监理工程师通知单	1 份
监理工程师备忘录	0 份	监理工程师联系单	1 份
例会会议纪要	4 份	专题会议纪要	0 份
本月工程现场大事记			
1、3月1日，全场区主网接地开挖。 2、3月4日，电气楼墙体砌筑。 3、3月6日，室外设备基础模板支护。 4、3月14日，接地变及电阻柜基础砼浇筑。 5、3月18日，综合楼脚手架拆除。 6、3月24日，电缆沟模板支护。			

本月工程质量控制情况评析

本月抽查、见证试验次数	0次	试验结果不合格次数	0次
设备开箱检查次数	0次	检查不符合要求次数	0次
本月查验分项工程	0项	其中一次验收合格计	0项
发出监理联系单（质量控制类）	0次		

工程质量情况简析（文字或图表）

- 1、本月中电气楼施工正常。
- 2、全场区接地正常施工。
- 3、设备基础正常施工。

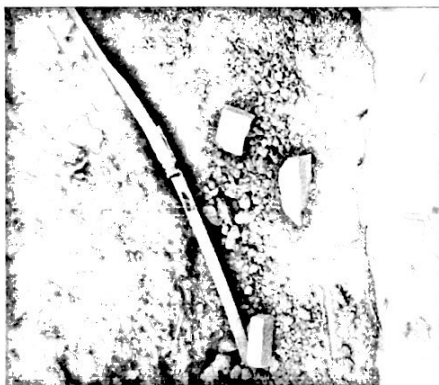

2017.3.8 上午在 p4 区巡视
发现 1_主变基础西侧 5x50



2017.3.11 中午在 p4 区巡
视检查发现设备底座不符
合要求

下月质量情况预计和目标

- 1、消防泵房 4 月 1 日全部完成。
- 2、综合楼一般用房 4 月 1 日主体完成。
- 3、消防水池、消防泵房 4 月 30 日前完成。
- 4、门卫室门头、库房、化粪池、污水池 4 月 30 日前全部完成。
- 5、办公区道路 4 月 30 日前砼浇筑完成。

本月施工安全生产管理工作评析

本月施工生产安全管理工作情况登记	
本月安全检查次数	1 次
发出监理通知单（安全控制类）	1 份
工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表）	
施工单位安全生产管理状况：现场安全文明施工处于可控状态 监理单位履行监理安全责任情况： 监理人员在对现场施工的人员基本上每天都要检查，没有发现有违反安全条例的事情发生。	
下月施工安全生产管理工作展望和目标	
下月继续保持安全工作的好连续性，严格执行安全施工条例，定期召开安全例会，总结安全工作出现的问题，把安全隐患消灭在萌芽状态，确保整个工程安全“0”事故。	

本月工程进度控制情况评析

工程开工日期	2016. 11. 14	工程竣工日期	2017. 5. 30
本月计划完成至	2017. 3. 31		
本月实际完成至	2017. 3. 31		
本月批准延长工期	0 天	累计延长工期	0 天
发出监理通知单（进度控制类）			0 份

本月工程进度情况简析（文字或图表）



2017. 3. 20 在 p4 砖砌电气房



2017.3.16p4 电缆沟支模

本月工程其它事项

1, 本工程已经安全生产 112 天。
