



编号: JL-(XCXXX)-05

监 理 月 报

工程名称: 西昌市西溪乡兴国寺水库 20MWP 渔光一体光伏

发电项目

2018 年 04 月第 25 期

项目监理部(章):

总监理工程师: 卢洪彦



报告日期: 2018 年 04 月 25 日

监 理 月 报

工程名称：西昌市西溪乡兴国寺水库 20MWP 渔光一体光伏发电项目

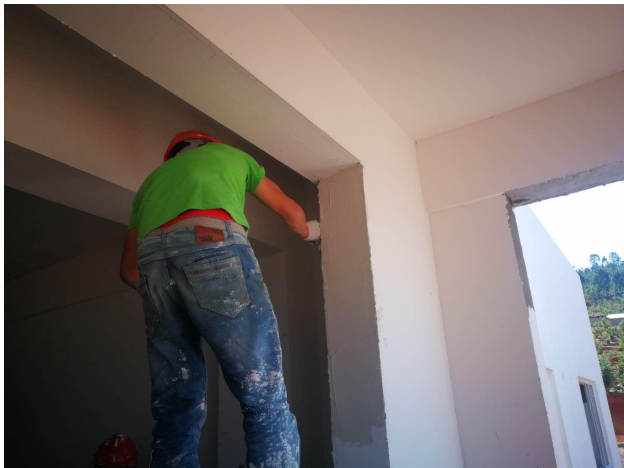
月次 第 5 次 月报开始时间 2018 年 04 月 26 日 结束日期 2018

年 04 月 25 日 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	西昌市西溪乡兴国寺水库 20MWP 渔光一体光伏发电 项目		影像	324 张	

二、监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度	 墙体腻子找补  卫生间地砖粘贴	1、综合楼墙地砖完成 100%。 2、综合楼穿线及桥架完成 100%。 3、综合楼堡坎完成 100%。 4、综合楼吊顶完成 100%。 5、综合楼门窗安装完成 100%。 6、综合楼内墙涂料完成 100%。 7、综合楼消防水箱安装完成 100%。 8、综合楼开关盒及临电安装完成 100%。 9、综合楼灯具、洁具安装完成 100%。	1、综合楼室内室外装修全部完成。 2、综合楼管理区排水管道、厂区平整硬化全部完成。 3、由于升压站图纸未确定，升压站具体完成时间以拿到最终图纸为准。 4、光伏区组件安装，因组件具体到货日期未定，组件安装完成以到货时间为准，工期要求 45 天。



综合楼挡土墙砌筑



综合楼场地平整



化粪池基坑开挖

	 综合楼吊顶施工  管理区排水管道施工		
	设备交付进度	设备、支架、组件、桥架、电缆、箱逆变器等已进场安装完成	组件供货计划5月初到货
	设计交付进度	综合楼图纸完成	升压站图纸未完成
	质量体系运作情况	质量体系健全，运行良好	落实质量保证体系，并对运行情况进行检查
	施工图会审	完成	
	设计交底	完成	

	方案审查	完成	督促施工单位报 审其他资料
	技术交底	完成	
	设计变更	对化粪池进行变更	变更图纸已提供
安全	安全培训情况	新进场员工已进行 安全培训	督促施工单位对 进场新员工进行 安全教育
	安全交底情况	督促施工单位对危 险作业点进行班前 交底	继续督促施工单 位进行班前交底
	安全措施落实情况	落实不彻底，已要 求施工单位认真落 实	监督施工单位认 真落实安全措施
	安全文明施工情况	现场安全、文明措 施良好	加强现场安全文 明管理力度
质量	主要工序质量	回填土夯实；钢筋 绑扎；电缆敷设； 混凝土浇筑；混凝 土养护。	钢筋未按规定要 求施工；振捣不密 实
	主要原材料质量	电缆外观质量合 格，支架外观检查 合格	对主要材料进行 检查
	构（配）件质量	进场材料质量合格	把控好进场材料 质量关
	设备质量	进行进场报验、开 箱检查	进行进场报验、开 箱检查
	质量验评情况	工序施工符合要求	加强过程检查力 度，加大工序报验 抽查力度

合同	合同签订情况	按合同执行	做好合同执行工作
----	--------	-------	----------

三、本月进度情况

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	本月实际完成（完成量/总量）	累计完成（完成量/总量）	备注
四川锦龙-综合楼								
1.	墙地砖			2018.03.26	2018.04.03	100%	100%	
2.	室内墙面施工			2018.03.26	2018.03.15	100%	100%	
3.	堡坎施工			2018.04.04	2018.04.07	100%	100%	
4.	桥架安装及电缆穿设			2018.04.01	2018.04.06	100%	100%	
5.	吊顶施工			2018.04.03	2018.04.25	100%	100%	含后增加的部分
6.	门窗安装			2018.04.05	2018.04.020	100%	100%	
7.	外墙砖施工			2018.04.01	2018.04.25	60%	60%	考虑到现场实际情况,外墙发到最后做
8.	内墙涂料施工			2018.04.09	2018.04.21	100%	100%	
9.	水井打设			2018.04.09	2018.04.15	100%	100%	
10.	室外排水管道施工			2018.04.14	2018.04.25	60%	60%	
11.	化粪池基础施工			2018.04.15	2018.04.25	20%	20%	因业主变更方案
12.	消防水箱安装			2018.04.15	2018.04.25	100%	100%	

四、下月进度计划

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	下月计划完成（完成量 / 总量）	本月实际完成（完成量 / 总量）	权值
1	综合楼室外装修	2018.05.10	2018.05.30			100%		
2	综合楼室内装修	2018.04.26	2018.04.30			100%		
3	综合楼水电安装	2018.04.26	2018.04.30			100%		
4	升压站							因图纸未定，实际开工日期以拿到图纸为准
5	组件安装							组件具体到货日期未定，实际开工日期以拿到组件到货时间为准

五、安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策划文件（份）	施工人数	安全分包情况			
人身重伤	机械设备	电网事故			分包队伍数量	分包队伍人数	系统外包队伍数量	系统外队伍人数
无	无	无		20 人	1	/	/	/

六、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性	配合建设单位做好并网前准备工作。要求施工单位合理安排施工进度计划，及时调整人力、物力
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。	审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。
质量管理	组件到场进行开箱检查；单位工程重点部位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	督促施工单位按照施工工艺和设计要求及上海电力的规范要求进行施工
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。
造价管理	对施工单位申请的工程款及时进行评审	对工程量实施计量，及时审核施工项目部报送的工程量清单、进度款支付申请
物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	督促施工单位按照复工日期的要求，安排人员、机具进行施工。

常州正衡电力工程监理有限公司

西昌市西溪乡兴国寺水库 20MWP 渔光一体光伏发电

项目监理部

2018 年 04 月 25 日
