



编号: GFDZJBM-YB-003

## 监 理 月 报

工程名称: 盐城 8MWP 屋顶分布式光伏发电项目

2017年2月25日 第3期

项目监理部(章):

总监理工程师: 郑艳华

报告日期: 2017年2月25日

# 监 理 月 报

工程名称: 盐城 8MWP 屋顶分布式光伏发电项目 第 3 次 月报

开始时间 2016 年 12 月 10 日 结束日期      监理周期 120 天

监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

## 一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	盐城 8MWP 屋顶分布式光伏发电项目	组件安装	影像	10 张	

## 一、 监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度		亿昌厂区组件安装; (织造车间)	组件进行安装, 桥架采购进场安装, 相关汇流箱逆变器设备进场, 位置确认, 土建施工, 电缆敷设。




亿昌厂区组件安装；（前道车间一）

组件进场进行安装，桥架采购进场安装，相关汇流箱逆变器设备进场，位置确认，土建施工，电缆敷设。



亿昌厂区组件安装；（前道车间二）

组件进场进行安装，桥架采购进场安装，相关汇流箱逆变器设备进场，位置确认，土建施工，电缆敷设。

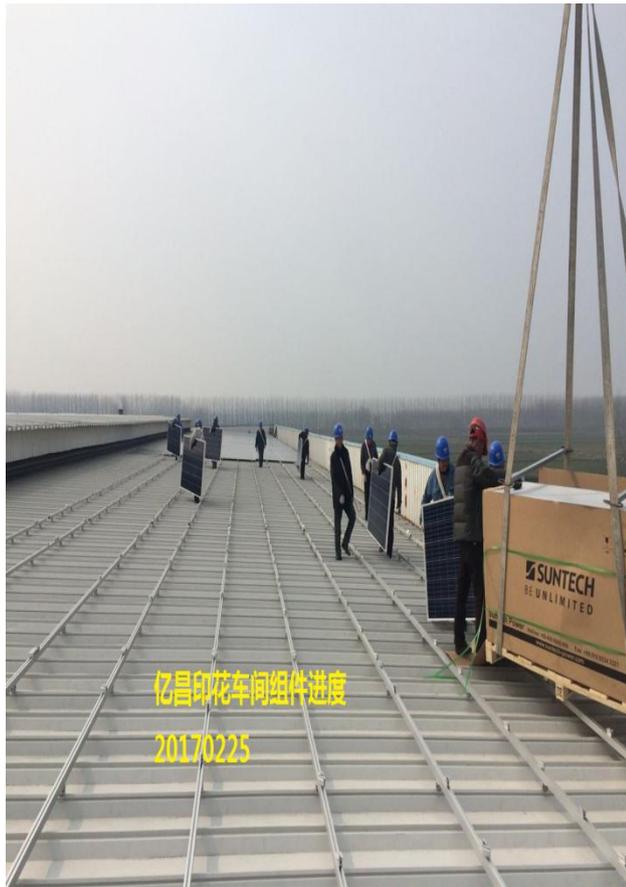


亿昌厂区支架  
安装；（印花车  
间）

组件进场进行  
安装，桥架采购  
进场安装，相关  
汇流箱逆变器  
设备进场，位置  
确认，土建施  
工，电缆敷设。



亿昌厂区支架  
安装；（仓库）

组件进场进行  
安装，桥架采购  
进场安装，相关  
汇流箱逆变器  
设备进场，位置  
确认，土建施  
工，电缆敷设。

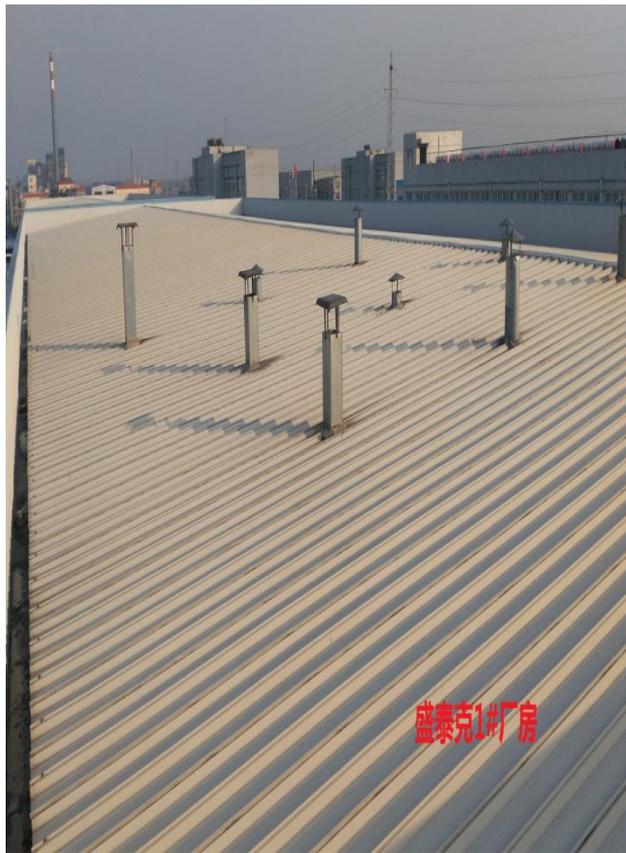


盛泰克厂区 1# 厂房，屋面有障碍物，暂未施工，等待设计出方案。

等待设计出方案后安装支架，组件进场进行安装，桥架采购进场安装，相关汇流箱逆变器设备进场，位置确认，土建施工，电缆敷设。  
(合作厂方暂时不准许进场)




盛泰克厂区 2# 厂房支架安装完成。

组件进场进行安装，桥架采购进场安装，相关汇流箱逆变器设备进场，位置确认，土建施工，电缆敷设。  
(合作厂方暂时不准许进场)

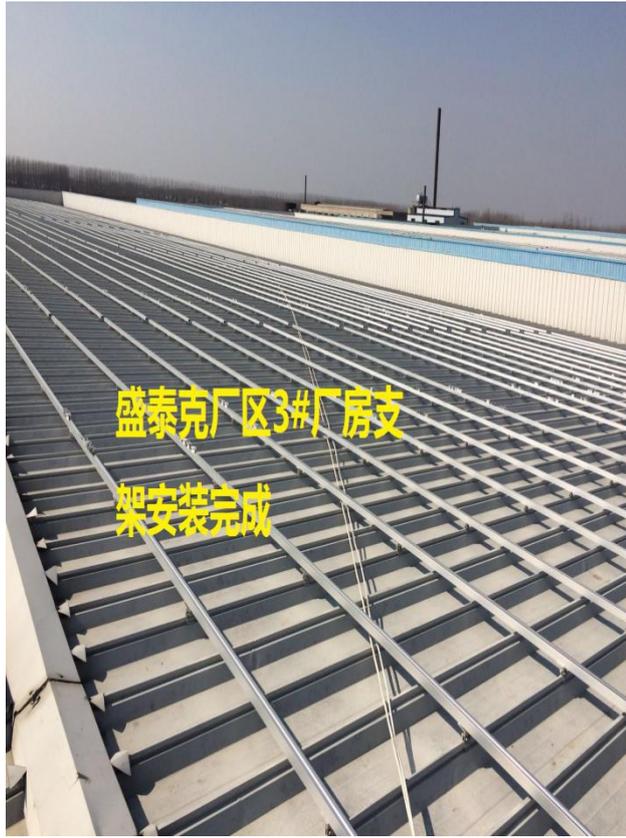

盛泰克厂区 3#  
厂房支架安装  
完成。

组件进场进行  
安装，桥架采购  
进场安装，相关  
汇流箱逆变器  
设备进场，位置  
确认，土建施  
工，电缆敷设。  
(合作厂方暂  
时不准许进场)

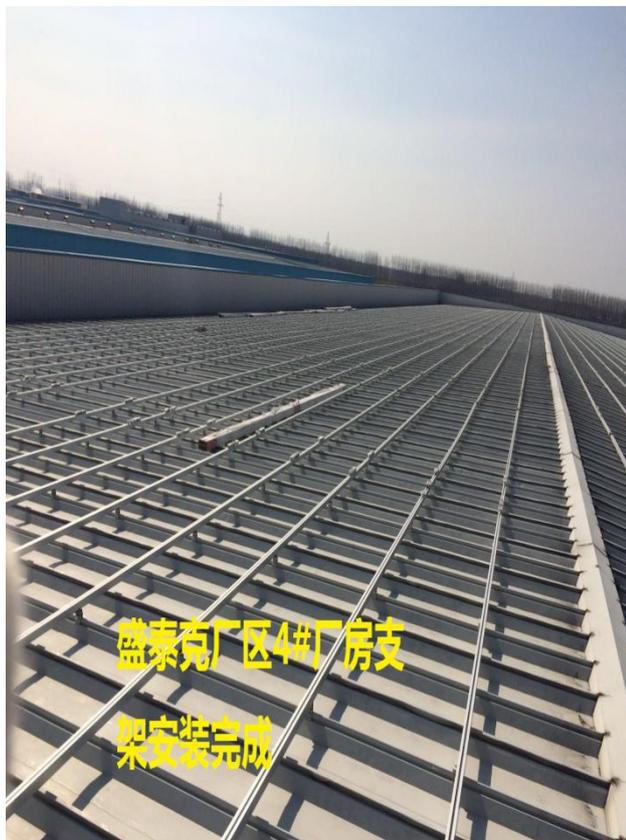

盛泰克厂区 4#  
厂房支架安装  
完成。

组件进场进行  
安装，桥架采购  
进场安装，相关  
汇流箱逆变器  
设备进场，位置  
确认，土建施  
工，电缆敷设。  
(合作厂方暂  
时不准许进场)

	<p>盛泰克厂区 5# 厂房支架未安装，等待设计出方案。</p>	<p>等待设计出方案后安装支架，组件进场进行安装，桥架采购进场安装，相关汇流箱逆变器设备进场，位置确认，土建施工，电缆敷设。 (合作厂方暂时不准许进场)</p>
<p>设备交付进度</p>	<p>支架(已经进场安装完毕)、组件(亿昌厂区已进场安装 80%)、桥架、电缆、汇流箱逆变器等等(未进场)</p>	<p>桥架、电缆、汇流箱，逆变器等供货</p>
<p>设计交付进度</p>	<p>图纸未完成</p>	<p>图纸完成</p>
<p>质量体系运作情况</p>	<p>质量体系健全，运行良好</p>	<p>落实质量保证体系，并对运行情况进行检查</p>
<p>施工图会审</p>	<p>设计未提供未完成</p>	<p>督促中</p>
<p>设计交底</p>	<p>设计未提供未完成</p>	<p>督促中</p>

	方案审查	未提供未交付	督促施工单位 报审其他资料
	技术交底	未提供未完成	督促中
	设计变更	亿昌厂区屋面 需增加透气天 窗，暂时预留面 积，未收到纸质 变更通知	督促设计下变 更通知
安全	安全培训情况	新进场员工已 进行安全培训	督促施工单位 对进场新员工 进行安全教育
	安全交底情况	督促施工单位 对危险作业点 进行班前交底	继续督促施工 单位进行班前 交底
	安全措施落实情况	落实不彻底，已 要求施工单位 认真落实	监督施工单位 认真落实安全 措施
	安全文明施工情况	现场安全、文明 措施良好	加强现场安全 管理力度
质量	主要工序质量	组件安装，	组件验收；电缆 敷设，相关土建 工程平行施工
	主要原材料质量	组件外观检查 合格	对主要材料进 行检查
	构（配）件质量	进场材料质量 合格	把控好进场材 料质量关
	设备质量	组件报验开箱 合格	进行进场报验、 开箱检查
	质量验评情况	工序施工符合	加强过程检查

		要求	力度，加大工序报验抽查力度
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况	无	/
	预算外签证	无	/
合同	合同签订情况	施工合同签订	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行工作

## 二、 本月进度情况

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	本月实际完成 (完成量 / 总量)	累计完成 (完成量 / 总量)	备注
亿昌厂区								
1	定位放线	2016.12.9	2016.12.16	2016.12.9	2017.1.2	4MW	4MW	
2	支架安装	2016.12.10	2016.12.20	2016.12.14	2016.12.25	4MW/4MW	4MW/4MW	经由业主集团公司技术部要求，夹具需增补
3	组件安装	2017.2.12	2017.2.30	2017.2.12	2017.2.30	4MW/4MW	4MW/4MW	完成 80%
盛泰克厂区								
1	定位放线	2017.1.9	2017.1.14	2017.1.13	2017.1.21	2.44MW/4MW	4MW/4MW	共 5 个厂房只完成三个厂房
2	支架安装	2017.1.10	2017.1.17	2017.1.14	2017.1.21	2.4MW/4MW	2.4MW/4MW	共 5 个厂房只完成三个厂房
3	组件安装	由于合作厂方原因，暂时不准许进场	由于合作厂方原因，暂时不准许进场	由于合作厂方原因，暂时不准许进场	由于合作厂方原因，暂时不准许进场	由于合作厂方原因，暂时不准许进场	由于合作厂方原因，暂时不准许进场	我监理部多次通知单提出给出进场计划，总包方仍未提供

### 三、 下月进度计划

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	下月计划完成 (完成量 / 总量)	本月实际完成 (完成量 / 总量)	备注:
亿昌厂区								
1	夹具增补	2017-2-8						我监理部多次通知单提出给出施工进度计划, 总包未提供
2	电缆桥架							
3	汇流箱							
4	逆变器							
5	电缆敷设							
盛泰克厂区								
1	组件安装	2017-2-12						我监理部多次通知单提出给出施工进度计划, 总包未提供
2	电缆桥架							
3	汇流箱							
4	逆变器							
5	电缆敷设							

### 四、 安全文明施工情况

事故(起)			编制安全策 划文件(份)	施工 人数	安全分包情况			
人身重 伤	机械设 备	电网事 故			分包队 伍数量	分包队 伍人数	系统外 包队伍 数量	系统外 队伍人 数
无	无	无		26人		/	/	/

## 五、 施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性	配合建设单位做好并网前准备工作。要求施工单位合理安排施工进度计划，及时调整人力、物力
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。	审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。
质量管理	组件到场进行开箱检查；单位工程重点部位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	督促施工单位按照施工工艺和设计要求及上海电力的规范要求进行施工
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。
造价管理	对施工单位申请的工程款及时进行评审	对工程量实施计量，及时审核施工项目部报送的工程量清单、进度款支付申请
物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	督促施工单位按照复工日期的要求，安排人员、机具进行施工。

常州正衡电力工程监理有限公司

盐城 8MWP 屋顶分布式光伏发电项目监理部

2017 年 2 月 25 日

