

编号: JXM15--002

监 理 月 报

工程名称: 内乡县乍曲乡 100MW 光伏电站项目

2017 年 1 月 第 2 期

总监理工程师: 赵自良



2017 年 1 月 29 日

监 理 月 报

1、本月工程实施情况

外线铁塔基础开挖完成 41 基，浇筑完成 41 基。升压站场地爆破完成三分之一。光伏区 GPS 放点累计完成 5569 个、桩机引孔 3785 个、桩基浇筑 1857 个。光伏区支架、组件试安装。

2、本月监理工作情况

2.1 工程进度控制方面的工作情况

由于连续的阴雨天气，造成施工滞后。要求各施工项目部及时调整施工进度计划，根据现场施工进度，及时调配施工机械，组织充足施工人员进场。又临近春节，在争抢工期的同时，各施工项目部想尽一切办法稳定施工人员情绪。确保施工进度。

2.2 工程质量控制方面的工作情况

组织各项目部人员现场对支架、组件试安装各个工序进行探讨。同时对外线铁塔基础浇筑及回填进行紧密的跟踪，并对存在的问题及时下发工作联系单，且对隐蔽工程进行现场见证及拍照存档。有效的保证了工程质量。

2.3 安全生产管理方面的工作情况

临近春节，要求各施工方在春节放假前必须安排人员对现场材料进行看护，防止出现材料丢失现象；并要求施工方对外线开挖完成的基坑周围必须设置醒目的警示带；同时要求各施工项目部加强现场车辆的管理，进入项目施工区域必须减速慢行，并定期对现场施工人员进行安全培训；要求各施工项目部加强冬季施工安全管理，重点对用

电及施工现场防火进行安全交底。

2.4 工程计量与工程款支付方面的工作情况

监理项目部及时对外线基础放线进行复测，对土方开挖及时进行验槽。

3、工程存在问题及建议

由于光伏区内岩石较多，对桩机引孔精度造成一定的影响，建议施工方在桩机引孔时，先用 15cm 的圆筒进行定位。避免出现桩基间距误差较大现象。

4、下月监理工作重点

4.1 工程管理方面的监理工作重点

下月施工人员陆续进场，监理项目部重点督促各施工方及时组织人员进行施工；对设备、材料的进场进行验收；对现场施工各个工序进行密切跟踪；要求施工方对施工现场安全进行不定期的排查。


4.2 项目监理机构内部管理方面的工作重点

监理项目部针对春节后现场施工的特点，内部管理的工作重点做以下安排：（1）按照公司本年度的监理工作要求，对监理项目部人员进行培训，明确公司的各项政策及规定，保证监理项目部工作的顺利开展；（2）按照现场施工情况，及时调整人员的配置，满足施工现场管理需要。

5、进度照片



光伏区 GPS 放点

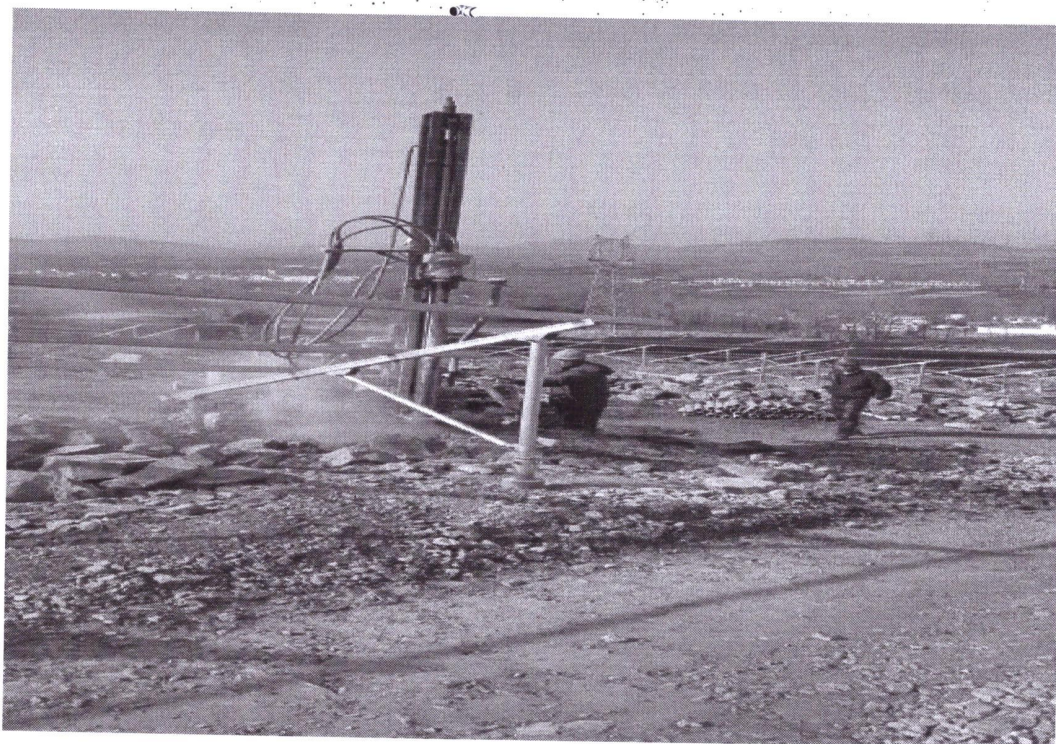

光伏区桩基引孔
