



正衡监理

监 理 月 报

工程名称：洛阳丰墨新能源有限公司 60MWp 光伏电站项

2017 年 3 月第 4 期

项目监理部（章）：



总监理工程师：纪现壮

报告日期：2017 年 03 月 31 日

监 理 月 报


工程名称: 洛阳丰盈新能源有限公司 60MWp 光伏电站项目 3 月次 第 4 次 月报开始时间 2017 年 3 月 1

日 结束日期 2017 年 3 月 31 日 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	洛阳丰盈新能源有限公司 60MWp 光伏电站项目		影像	40 张	

一、 监理重点工作情况

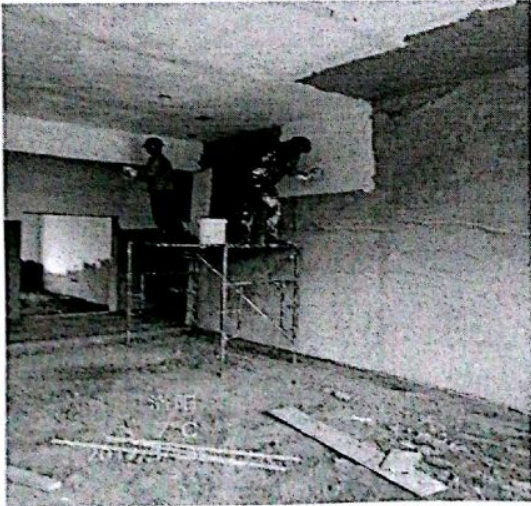专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度		管理区道路完成, 场平完成, 绿化未开始施工; 综合楼内墙刮白;	



我在这里
☁ 8°C
2017/3/25

光伏区支架安
装;
光伏区组件安
装;
光伏区箱逆变
基础砌筑;




洛阳
☀ 2°C
2017.2.8



洛阳
☀ 9°C
2017/3/15

升压站设备基
础绑扎钢筋、支
护模板;

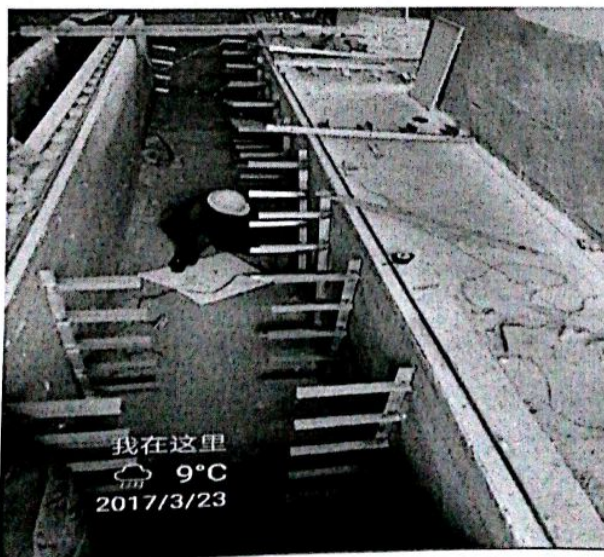



	设备交付进度	支架、组件、管桩、等进场	组件供货
	设计交付进度	图纸未完成	图纸未完成
	质量体系运作情况	质量体系健全，运行良好	落实质量保证体系，并对运行情况进行检查
	施工图会审	未完成	
	设计交底	未完成	
	方案审查	未交付	督促施工单位报审其他资料
	技术交底	无	
	设计变更	无	
安全	安全培训情况	新进场员工已进行安全培训	督促施工单位对进场新员工进行安全教育
	安全交底情况	督促施工单位对危险作业点进行班前交底	继续督促施工单位进行班前交底

	安全措施落实情况	落实不彻底，已 要求施工单位 认真落实	监督施工单位 认真落实安全 措施
	安全文明施工情况	现场安全、文明 措施良好	加强现场安全 管理力度
质量	主要工序质量	支架及组件安 装；	支架及组件安 装。
	主要原材料质量	支架外观检查 合格，组件观感 质量合格；	对主要材料进 行检查
	构（配）件质量	进场材料质量 合格	把控好进场材 料质量关
	设备质量		进行进场报验、 开箱检查
	质量验评情况	工序施工符合 要求	加强过程检查 力度，加大工序 报验抽查力度
投资	资金情况	/	/
	预算外签证	无	/
	合同签订情况	施工合同签订	/
合同	合同执行情况	按合同执行	/
			做好合同执行 工作

二、本月进度情况

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	本月实际完成量(完成量/总量)	累计完成量(完成量/总量)	备注
强盛电力								
1	定位放线		2017.3.20	2016.12.10		17MW	20MW	
2	基础打桩		2017.3.26	2016.12.15		7MW	18MW	
3	支架安装		2017.4.30	2016.12.20		9MW/60MW	13.5MW/60MW	
4	组件安装		2017.4.30	2016.12.24		3MW/60MW	8MW/60MW	
5	电缆桥架(直流)					未施工		
6	电缆桥架(高压)					未施工		
7	直流电缆					未施工		
8	高压电缆					未施工		
9	高压电缆					未施工		
10	箱式变压器安装					0台		
11	逆变器安装					0台		
12	SVG补偿装置安装					0套		
13	厂用变安装					0台		
14	开关柜					0台		
15	二次室设备					0台		
16	配电楼地砖					未施工		

17	配电楼 静电地板					未施工		
18	配电楼 吊顶					未施工		
19	配电楼 涂料					已施工	80%	
20	配电楼 电气					已施工	70%	
21	办公楼 地砖					未施工		

二、 下月进度计划

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	本月实际完成 (完成量 / 总量)	累计完成(完成量 / 总量)	备注
强盛电力								
1	定位放线		2017.3.20	2016.12.10		5MW	25MW	
2	基础打桩		2017.3.26	2016.12.15		5MW	23MW	
3	支架安装		2017.4.30	2016.12.20		5MW/60MW	14.5MW/60MW	
4	组件安装		2017.4.30	2016.12.24		10MW/60MW	18MW/60MW	
5	电缆桥架 (直流)					未施工		
6	电缆桥架(高压)					未施工		
7	直流电缆					未施工		
8	高压电缆					未施工		
9	箱式变压器安装					0台		
10	逆变器安装					0台		
11	SVG 补					0套		

	偿装置 安装							
12	厂用变 安装					0台		
13	开关柜					0台		
14	开关柜					0台		
15	二次室 设备					0台		
16	配电楼 地砖					100%	100%	
17	配电楼 静电地 板					未施工		
18	配电楼 吊顶					100%	100%	
19	配电楼 涂料					20%	100%	
20	配电楼 电气					30%	100%	
20	办公楼 地砖					100%	100%	

三、安全文明施工情况

事故(起)			编制安全策 划文件(份)	施工 人数	安全分包情况			
人身重 伤	机械设 备	电网事 故			分包队 伍数量	分包队 伍人数	系统外 包队伍 数量	系统外 队伍人 数
无	无	无		180人	2	/	/	/

四、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性	配合建设单位做好开网前准备工作。要求施工单位合理安排施工进度计划，及时调整人力、物力
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作	审查施工项目部《安全文明措施》及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出

	业人员安全防范意识,落实安全文明施工措施。	整改要求并限期改正。
质量管理	组件到场进行开箱检查;单位工程重点部位施工进行旁站;督促施工单位质量通病防治措施;监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	督促施工单位按照施工工艺和设计要求及上海电力的规范要求施工
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底,现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	参与过程中重要(关键)环节的施工技术交底会,监督检查执行情况。
造价管理	对施工单位申请的工程款及时进行评审	对工程量实施计量,及时审核施工项目部报送的工程量清单、进度款支付申请
物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作,督促施工单位做好物资保管工作,要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查,确保物资不遗失。	督促施工单位按照复工日期的要求,安排人员、机具进行施工。

常州正衡电力工程监理有限公司

洛阳丰翌新能源有限公司 60MWp 光伏电站项目监理部

2017 年 3 月 31 日
