

监 理 月 报

工程名称：洛阳丰墨新能源有限公司 60MWp
光伏电站项目

2017 年 8 月 第 9 期

总监理工程师：纪现壮



监理项目部 (章)

报告日期：2017 年 8 月 31 日

监 理 月 报

工程名称：洛阳丰墨新能源有限公司 60MWp 光伏电站项目 8 月次 第 9 次 月报开始时间

2017 年 8 月 1 日 结束日期 2017 年 8 月 31 日 监理单位：常州正衡电力工程监理有限

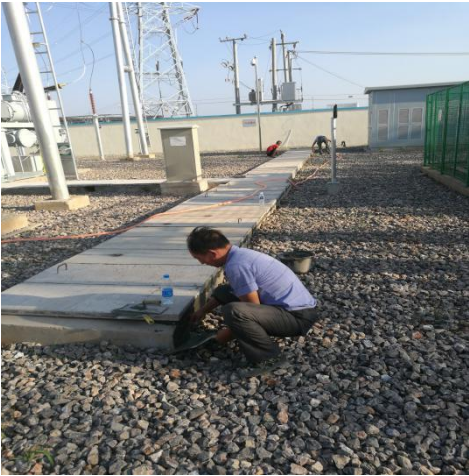
公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	洛阳丰墨新能源有限公司 60MWp 光伏电站项目		影像	40 张	

一、 监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
----	----	----------	----------

	  	寺上光伏区焊接防雷接地； 寺上升压站电缆沟盖板消缺； 寺上生活区消缺； 寺上生活区门卫室抹灰；	
--	--	---	--

	  		寺上光伏区消缺； 寺上升压站运行； 寺上光伏区回填电缆沟；	
--	--	--	--	--

			
	设备交付进度		电气设备供货
	设计交付进度	图纸已完成	图纸已完成
	质量体系运作情况	质量体系健全，运行良好	落实质量保证体系，并对运行情况进行检查
	施工图会审	已完成	
	设计交底	已完成	
	方案审查	已交付	督促施工单位报审其他资料
	技术交底	无	
	设计变更	无	
安全	安全培训情况	新进场员工已进行安全培训	督促施工单位对进场新员工进行安全教育
	安全交底情况	督促施工单位对危险作业点进行班前交底	继续督促施工单位进行班前交底

	安全措施落实情况	落实不彻底，已 要求施工单 位 认真落实	监 督 施 工 单 位 认 真 落 实 安 全 措施
	安全文明施工情况	现场安全、文明 措施良好	加 强 现 场 安 全 管理力度
质量	主要工序质量	支 架 及 组 件 安 装；	支 架 及 组 件 安 装。
	主要原材料质量	支 架 外 观 检 查 合格，组件观感 质量合格；	对 主 要 材 料 进 行检查
	构（配）件质量	进 场 材 料 质 量 合格	把 控 好 进 场 材 料质量关
	设备质量		进 行 进 场 报 验、 开箱检查
	质量验评情况	工 序 施 工 符 合 要求	加 强 过 程 检 查 力度，加大工序 报验抽查力度
投资	资金情况	/	/
	预算外签证	无	/
	合同签订情况	施工合同签订	/
合同	合同执行情况	按合同执行	/
			做 好 合 同 执 行 工作

二、本月进度情况

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	本月实际完成（完成量 / 总量）	累计完成（完成量 / 总量）	备注
强盛电力								
1	定位放线		2017.6.10	2016.12.10		0MW	30MW	
2	基础打桩		2017.6.15	2016.12.15		0MW	28MW	
3	支架安装		2017.6.20	2016.12.20		0MW/6 0MW	28MW/6 0MW	
4	组件安装		2017.6.20	2016.12.24		0MW/6 0MW	28MW/6 0MW	
5	电缆桥架 (直流)					已完成	100%	
6	电缆桥架（高压）					已完成	100%	
7	直流电缆					已完成	100%	
8	高压电缆					已完成	100%	
9	高压电缆					已完成	100%	
10	箱式变压器安装					5 台		
11	逆变器安装					5 台		
12	SVG 补偿装置安装					1 套		
13	厂用变安装					1 台		
14	开关柜					11 台		
15	二次室设备					27 面		
16	配电楼地砖					已完成	100%	
17	配电楼静电地板					无		

18	配 电 楼 吊顶					已完成	100%	
19	配 电 楼 涂料					100%	100%	
20	配 电 楼 电气					已完成	100%	
21	办 公 楼 地砖					已完成	100%	

二、 下月进度计划

序号	任 务 名 称	计划开始时间	计 划 结 束时间	施工开始日期	施 工 结 束日期	本 月 实 际 完 成 (完 成 量 / 总 量)	累 计 完 成 (完 成 量 / 总 量)	备注
强盛电力								
1	定 位 放 线		2017.6.20	2016.12.10		20MW	48MW	
2	基 础 打 桩		2017.6.20	2016.12.15		20MW	48MW	
3	支 架 安 装		2017.6.10	2016.12.20		20MW/ 60MW	48MW/6 0MW	
4	组 件 安 装		2017.6.20	2016.12.24		20MW/ 60MW	48MW/6 0MW	
5	电 缆 桥 架 (直流)					100%	100%	
6	电 缆 桥 架 (高 压)					100%	100%	
7	直 流 电 缆					100%	100%	
8	高 压 电 缆					100%	100%	
9	箱 式 变 压 器 安 装					20 台	48/60	
10	逆 变 器 安 装					20 台	48/60	
11	SVG 补 偿 装 置 安 装					1 套	1 套	
12	厂 用 变					1 台	1 台	

	安装							
13	开关柜					11 台		
15	二次室设备					28 面	28 面	
16	配电楼地砖					100%	100%	
17	配电楼静电地板					100%	100%	
18	配电楼吊顶					100%	100%	
19	配电楼涂料					100%	100%	
20	配电楼电气					100%	100%	
20	办公楼地砖					100%	100%	

三、安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策	施工	安全分包情况			
人身重	机械设	电网事	划文件（份）	人数	分包队	分包队	系统外	系统外
伤	备	故			伍数量	伍人数	包队伍	队伍人
							数量	数
无	无	无		180 人	1	/	/	/

四、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性	配合建设单位做好并网前准备工作。要求施工单位合理安排施工进度计划，及时调整人力、物力
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。	审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。
质量管理	组件到场进行开箱检查；单位工程重点部	督促施工单位按照施工工艺和设计要求及上海电

	位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	力的规范要求进行施工
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。
造价管理	对施工单位申请的工程款及时进行评审	对工程量实施计量，及时审核施工项目部报送的工程量清单、进度款支付申请
物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	督促施工单位按照复工日期的要求，安排人员、机具进行施工。

常州正衡电力工程监理有限公司

洛阳丰墨新能源有限公司 60MWp 光伏电站项目监理部

2017 年 8 月 31 日
