



编号：AQ-GF-ZH-YB-02

监 理 月 报

工程名称：安丘市 60MW 光伏扶贫电站项目

安丘市 80MW 光伏扶贫电站项目

2017 年 3 月第 2 期

项目监理部(章):



总监理工程师：张昭武



报告日期：2017 年 03 月 31 日

监 理 月 报

工程名称：安丘市 60MW 光伏扶贫电站项目

安丘市 80MW 光伏扶贫电站项目

月报开始时间 2017 年 3 月 1 日 结束日期 2017 年 3 月 31 日

监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料


序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	安丘市 60MW 光伏电站项目 安丘市 80MW 光伏电站项目		影像	50 张	

二、监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度	 常州正衡电力工程监理有限公司 工程名称:安丘惠永60MW+惠利80MW 光伏扶贫电站项目 施工部位:石埠子22区施工钻孔无水平 当前日期:2017年3月20日	土建专业: 1、电控楼基础开挖完成 20%，累计完成 20%； 2、综合楼基础开挖完成 100%，累计完成 100%； 子系统专业: 1、子系统基础打孔完成 22.38MW，累计完成 32.88MW；	土建专业: 1、电控楼基础开挖完成 80%，基础浇筑完成 100%，主体封顶完成 100%； 2、综合楼基础浇筑完成 100%，主体封顶完成 100%； 3、水泵房基础开挖完成 100%，基础

	 常州正衡电力工程监理有限公司 Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision CO.,LTD 工程名称: 安丘惠永60MW惠利80MW光伏扶贫电站项目 活动内容: 新增七号施工区地锚浇筑现场 当前日期: 2017年3月20日 2017/03/20  常州正衡电力工程监理有限公司 Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision CO.,LTD 工程名称: 安丘惠永60MW+惠利80MW光伏扶贫电站项目 施工部位: 石埠子4区地锚桩监理在检查 当前日期: 2017年3月23日 2017/03/23	2、子系统基础浇筑完成 24.54MW, 累计完成 24.54MW; 3、子系统箱变基础开挖完成 80 个, 浇筑完成 80 个; 公用系统专业: 无 场内集电线路专业: 1、集电线路因征地事宜, 设计总平变更, 现正在加班设计线路 浇筑完成 100%, 主体封顶完成 100%; 4、室外设备基础开挖完成 100%, 基础浇筑完成 100%, 主体封顶完成 100%; 子系统专业: 子系统基础打孔完成 120MW, 基础浇筑完成 70MW, 支架安装完成 70MW; 公用系统专业: 1、设备槽钢基础施工完成 100%; 2、主变压器系统设备安装完成 80%; 3、35Kv 室内配电装置设备安装完成 60%; 4、220Kv 封闭式组合电气安装完成 50%; 5、控制直流系统设备安装完成 50%; 6、站用电系统设备安装完成 100%; 7、无功补偿系统设备安
--	--	--

钢筋送检见证取样

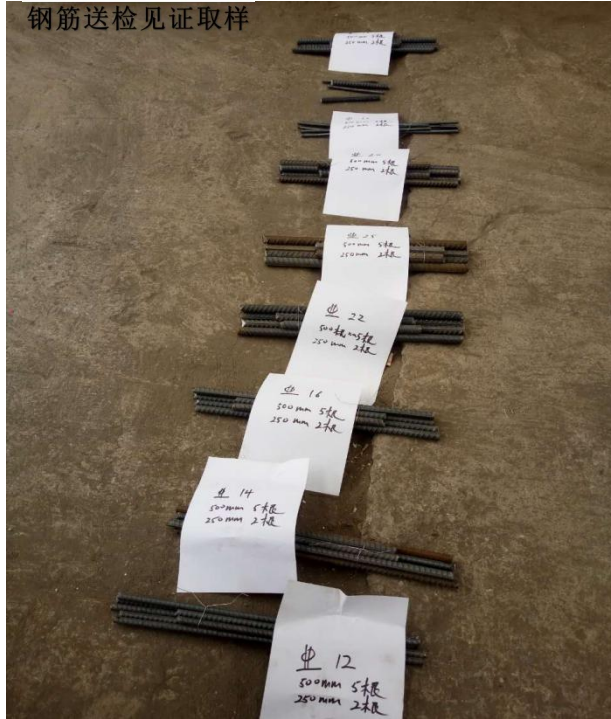

常州正衡电力工程监理有限公司
Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervisor CO., Ltd.
工程名称 安丘惠永60+惠利80扶贫
光伏发电项目
活动内容 新增六号施工区地锚浇筑
现场
当前日期 2017年3月26日

装完成 60%；
场内集电线
路专业：

1、定位放线
完成 100%，
基础开挖完
成 50%；基
础浇筑完成
50%；

	 常州正衡电力工程监理有限公司 Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision Co., Ltd. 工程名称 安丘惠永60MW惠利 80MW光伏扶贫电站项目 活动内容 石埠子1施工区地锚孔浇筑现场 当前日期 2017年3月17日		
设备交付进度		暂无	
设计交付进度		升压站进场 道路图/升压 站场平图/电 控楼基础图/ 电控楼建筑 结构图/综合 楼基础图/综 合楼建筑结 构图 /220Kv 配电装置构 架图/动态无 功补偿装置 设备基础图/ 避雷针图纸 /GIS 基础图/ 围栏示意图/ 光伏支架基 础图已完成	
质量体系运作情况		质量体系健全， 运行一般	落实质量保证 体系，并对运行

			情况进行检查
	施工图会审	土建图已召开	
	设计交底	已召开	
	方案审查	正在提交	督促施工单位 报审其他资料
	技术交底	暂无	
	设计变更	图纸变更频繁	
安全	安全培训情况	新进场员工已 进行安全培训	督促施工单位 对进场新员工 进行安全教育
	安全交底情况	督促施工单位 对危险作业点 进行班前交底	继续督促施工 单位进行班前 交底
	安全措施落实情况	落实不彻底，已 要求施工单位 认真落实	监督施工单位 认真落实安全 措施
	安全文明施工情况	现场安全、文明 措施落实不彻 底	加强现场管理 力度
质量	主要工序质量	地锚桩钻孔质 量、地锚桩浇筑 质量	现场施工管理 人员、监理、业 主实时把控
	主要原材料质量	对进场地锚桩 材料抽检	对主要材料进 行抽检
	构（配）件质量	暂无	把控好进场材 料质量关
	设备质量	暂无	进行进场报验、 开箱检查
	质量验评情况	工序施工部分	要求施工队进

		不符合要求	行整改，加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况	/	/
	预算外签证	/	/
合同	合同签订情况	施工合同签订	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行工作

三、本月进度情况

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	本月实际完成（完成量/总量）	累计完成（完成量/总量）	备注
中国核工业二三建设有限公司								
1	定位钻孔	2017.02.12	2017.04.09	2016.02.12	/	22.2MW	32.8MW	
2	基础浇筑	2017.02.20	2017.04.14	2016.02.20	/	24.5MW	24.5MW	
3	支架安装	2017.03.16	2017.05.17	/		/	/	
4	组件安装	2017.03.28	2017.05.20	/		/	/	
5	电缆桥架（直流）							
6	电缆桥架（高压）							
7	直流电缆4mm ²							
8	直流电缆2*70mm ²							
9	高压电缆3*50/3*70敷设							

10	高压电缆 3*50/3*7 0 安装							
11	箱式变压器安装	2017.04.14	2017.05.11	/	/	/	/	
12	逆变器安装	2017.03.25	2017.05.21	/	/	/	/	
13	SVG 补偿装置安装	2017.03.20	2017.03.20	/	/	/	/	
14	厂用变安装							
15	35KV 开关柜							
16	0.4KV 开关柜							
17	二次室设备							
中国核工业二三建设有限公司								
1	配电楼地砖							
2	配电楼静电地板							
3	配电楼吊顶							
4	配电楼涂料							
5	配电楼电气							
6	办公楼地砖							
7	办公楼吊顶							
8	办公楼涂料							
9	办公楼电气							
10	办公楼给排水							
11	办公楼通风							
中国核工业二三建设有限公司								
1	铁塔基础							
2	铁塔架设							
3	导线施放							
4	蒲河变改造							

四、下月进度计划

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	本月实际完成（完成量 / 总量）	累计完成（完成量 / 总量）	备注
中国核工业二三建设有限公司								
1	定位钻孔	2017.02.12	2017.04.09	2016.02.12	/	120MW	152.8 MW	
2	基础浇筑	2017.02.20	2017.04.14	2016.02.20	/	70MW	94.5MW	
3	支架安装	2017.03.16	2017.05.17	/		70MW	70MW	
4	组件安装	2017.03.28	2017.05.20					
5	电缆桥架（直流）							
6	电缆桥架（高压）							
7	直流电缆 4mm2							
8	直流电缆 2*70mm2							
9	高压电缆 3*50/3*70 敷设							
10	高压电缆 3*50/3*70 安装							
11	箱式变压器安装	2017.04.14	2017.05.11	/	/	/	/	
12	逆变器安装	2017.03.25	2017.05.21	/	/	/	/	
13	SVG 补偿装置安装	2017.03.20	2017.03.20	/	/	/	/	
14	厂用变安装							
15	35KV 开关柜							
16	0.4KV 开关柜							
17	二次室设备							

中国核工业二三建设有限公司								
1	配电楼地砖							
2	配电楼静电地板							
3	配电楼吊顶							
4	配电楼涂料							
5	配电楼电气							

五、安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策 划文件（份）	施工 人数	安全分包情况			
人身重 伤	机械设 备	电网事 故			分包队 伍数量	分包队 伍人数	系统外 包队伍 数量	系统外 队伍人 数
无	无	无	有	336 人	8	/	/	/

六、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性	配合建设单位做好并网前准备工作。要求施工单位合理安排施工进度计划，及时调整人力、物力
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。	审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。
质量管理	现场地锚桩钻孔质量、地锚桩浇筑质量把控	督促施工单位按照施工工艺和设计要求进行施工
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。
造价管理	对施工单位申请的工程款及时进行评审	对工程量实施计量，及时审核施工项目部报送的工程量清单、进度款支付申请

物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	督促施工单位按照复工日期的要求，安排人员、机具进行施工。
------	--	------------------------------

常州正衡电力工程监理有限公司

安丘市 60MW 光伏扶贫电站项目

安丘市 80MW 光伏扶贫电站项目

2017 年 03 月 31 日
