



编号: JL- (HNHR) -01

监 理 月 报

工程名称: 湖南华容县北景港镇上横州 20MWp 和平
20MWp 分布式农光互补光伏发电项目

2017 年 03 月第 1 期

项目监理部 (章)

总监理工程师: 胡德林



报告日期: 2017 年 03 月 31 日



由 扫描全能王 扫描创建


监 理 月 报

工程名称: 湖南华容县北景港镇上横州 20MWp 和平 20MWp 分布式农光互补光伏发电项目月报 第 1 次
月报开始时间 2017 年 03 月 01 日 结束日期 2017 年 03 月 30 日 监理单位: 常州正德电力工程
监理有限公司


一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	湖南华容县北景港镇上横州 20MWp 和平 20MWp 分布式农光互补光伏发电项目		影像		

一、 监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度		一光伏区: 1、管桩完成 1013 根, 累计完成 10132 根; 2、支架完成 290 组, 累计完成 290 组; 3、组件完成 0 组, 累计完成 0 组; 二. 升压站: 1、配电楼主体砖墙砌筑, 室内回填沙石。检测楼主体砖墙砌筑, 圈梁 1# 2# 主变基础开挖	一、升压站: 1、配电楼整体完 检测楼整体完成。 二、光伏区工程: 1、立柱焊接 支架安装 管桩施工 组件安装。 2、光伏区全场道路铺筑。 三、外线工程: 剩余 12 座塔基浇筑并立塔。



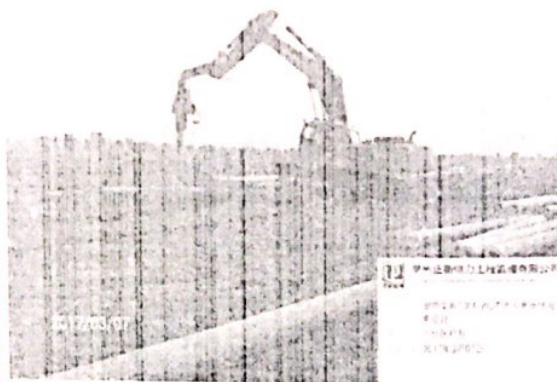

钢筋绑扎并浇筑完成。



三外线：(5# 8# 9#

10# 11# 12# 13# 14#



15# 20# 21#) 共 11

基塔基完成基础施

工。

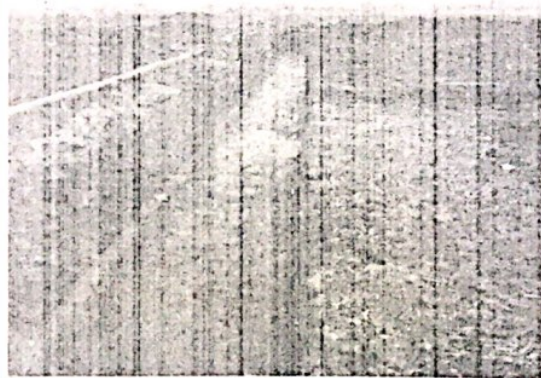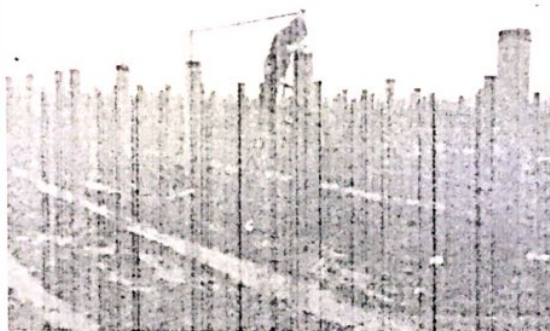



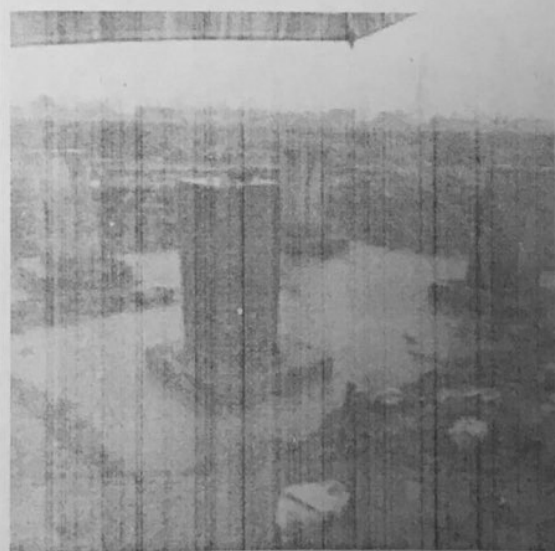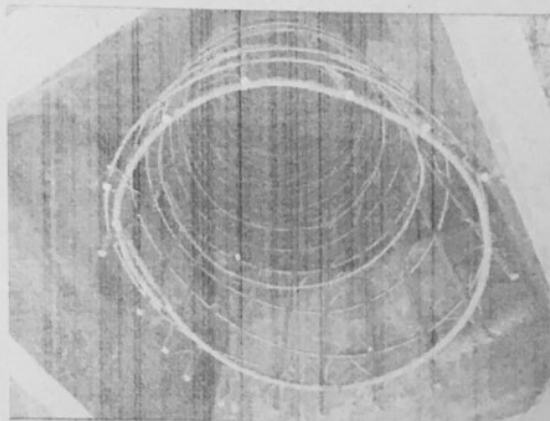

	设备交付进度	支架、组件、电缆、箱逆变、汇流箱按计划进场。	管桩等按计划供货。
	设计交付进度	40MWp 光伏区图纸、外线、升压站图纸已交付	图纸完成
	质量体系运作情况	质量体系健全，运行良好	落实质量保证体系，并对运行情况进行检查
	施工图会审	完成	
	设计交底	完成	
	方案审查	已交付	严格按方案施行
	技术交底	完成	
	设计变更	无	
安全	安全培训情况	新进场员工已进行安全培训	督促施工单位对进场员工进行安全教育
	安全交底情况	督促施工单位对危险作业点进行班前交底	继续督促施工单位进行班前交底
	安全措施落实情况	落实不彻底，已要求施工单位认真落实	监督施工单位认真落实安全措施
	安全文明施工情况	现场安全、文明施工良好	加强现场安全管理力度



质量	主要工序质量	升压站土建施工：管桩施工、支架及组件安装；外线铁塔基础施工。	升压站土建施工：管桩施工、支架及组件安装；外线铁塔基础、塔杆安装施工。
	主要原材料质量	钢材、水泥、砖、检测合格；支架外观检查合格，管桩外观检查合格。	对主要材料进行检查
	构（配）件质量	管桩及支架有出厂合格证，质量合格。	把控好进场材料质量关
	设备质量		
	质量验评情况	工序施工符合要求	加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况	无	
	预算外签证	无	/
合同	合同签订情况	EPC 合同已签订	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行工作

二、 本月进度情况

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	本月实际完成(完成量/总量)	累计完成(完成量/总量)	备注
通能、天人								
1	定位放线		2017.5.10	2016.12.8		20MW	20MW	
2	基础打桩		2017.5.15	2016.12.10		16.6MW	16.6MW	
华网电力								



1	支架安装		2017.6.5	2017.2.24		3.4MW	3.4MW	
2	组件安装		2017.6.15	2016.4.5		0MW	0MW	
3	箱式变压器安装							
4	逆变器安装							
5	SVG 补偿装置安装							
6	厂用变安装							
7	35KV 开关柜							
8	0.4KV 开关柜							
9	二次室设备							
10	配电楼地砖							
11	配电楼静电地板							
12	配电楼吊顶							
13	配电楼涂料							
14	配电楼电气							
15	办公楼地砖							
16	办公楼吊顶							
17	办公楼涂料							
18	办公楼电气							
19	办公楼给排水							
20	办公楼通风							
21	支架基础		2017.4.30			1013/31360	10132/31360	
22	铁塔架设							
23	导线施放							

三、 下月进度计划



序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	下月计划完成(完成量/总量)	本月实际完成(完成量/总量)	权值
1	支架安装		2017.4.30	2017.4.1		15MW/40MW	3.4MW/40MW	
2	组件安装		2016.10.30	2016.10.1		10MW/40MW	0MW/40MW	
3	直流电缆 4mm ²							
4	直流电缆 70mm ²							
5	箱变逆变器接线							
6	升压站							
7	35KV出线							
8	35KV进线					0MW		
1	配电楼		2017.4.30	2017.4.30		完成	40%	
2	办公楼			2017.4.1		主体完	20%	
3	围墙							
4	管理区回填土							
5	室外排水							
1	外线架设							

四、安全文明施工情况

事故(起)			编制安全策	施工	安全分包情况			
人身重 伤	机械设 备	电网事 故	划文件(份)	人数	分包队 伍数量	分包队 伍人数	系统外 包队伍 数量	系统外 队伍人 数
无	无	无	1	120人	3	/	/	/

五、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置,	要求施工单位合理安排施工进度计划,及时调整



	充分调动施工人员的积极性	人力、物力,加快施工进度。
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》,安委会要定期对现场进行安全检查;对施工人员进行安全培训、考试,提高作业人员安全防范意识,落实安全文明施工措施。	审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件,实施安全监理,发现问题及时提出整改要求并限期改正。
质量管理	组件到场进行开箱检查;单位工程重点部位施工进行旁站;督促施工单位质量通病防治措施;监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	督促施工单位按照施工工艺和设计要求及上海电力的规范要求进行施工
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底,现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	参与过程中重要(关键)环节的施工技术交底会,监督检查执行情况。
造价管理	对施工单位申请的工程款及时进行评审	对工程量实施计量,及时审核施工项目部报送的工程量清单、进度款支付申请
物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作,督促施工单位做好物资保管工作,要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查,确保物资不遗失。	督促施工单位按照复工日期的要求,安排人员、机具进行施工。

常州正衡电力工程监理有限公司

湖南华容县北景港镇上横州 20MWp 和平 20MWp
分布式农光互补光伏发电项目监理部

2017 年 03 月 30 日

