



常州正衡电力工程监理有限公司
Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision CO., Ltd.

监 理 月 报

兴泰晟旭辉屋顶 2.70MW 分布式光伏发电项目

批准: 任仲峰

审核: 戚平

编辑: 刘瑞光

2017 年 08 月 第 03 期

报告日期: 2017 年 08 月 31 日



监 理 月 报

工程名称：兴泰晟旭辉屋顶 2.70MW 分布式光伏发电项目

月报开始时间：2017 年 08 月 01 日 结束日期：2017 年 08 月 31 日


监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	兴泰晟旭辉屋顶 2.70MW 分布式光伏发电项目		影像	6 张	

一、 监理重点工作情况

专业	项目进度照片	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度		兴泰晟旭辉屋顶 2.70MW 分布式光伏发电项目 3 个屋面均为彩钢瓦屋面。交流电缆到货 3875 米，占总体 85%。因厂家要求对其屋面进行防腐刷漆，光伏暂未施工。屋面防腐刷漆施工人员进场施工。钢结构加固施工工程完成 90%。施工现场安全文明施工；	加大对人力物力的投入，确保 9 月 15 日前完成施工，并具备并网发电条件。

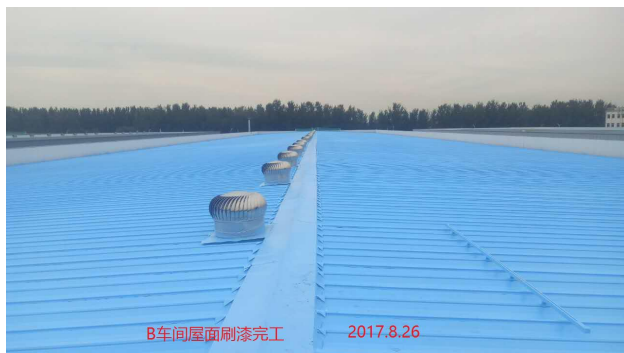

	设备交付进度	1、组件到货 25%， 导轨到货 99%，夹具 到货 99%，光伏专用 电缆到货 50%。交流 电缆到货 3875 米， 占总体 85%。2、桥 架、接地、汇流箱、 逆变器、开关柜均 未到货。	
	设计交付进度	图纸完成	图纸完成
	质量体系运作情况	质量体系健全，运 行良好	落实质量保证体 系，并对运行情况 进行检查
	施工图会审	完成	
	设计交底	完成	
	方案审查	未交付	督促施工单位及时 报审各项资料
	技术交底	完成	
	设计变更	无	
安全	安全培训情况	新进场员工已进行 安全培训	督促施工单位对进 场新员工进行安全 教育
	安全交底情况	督促施工单位对危 险作业点进行班前 交底	继续督促施工单位 进行班前交底
	安全措施落实情况	落实不彻底，已要 求施工单位认真落 实	监督施工单位认真 落实安全措施
	安全文明施工情况	现场安全、文明措	加强现场安全管理

		施良好	力度
质量	主要工序质量	支架及组件安装，	支架及组件安装； 电缆敷设，桥架安装，接地施工。
	主要原材料质量	支架外观检查合格，组件观感质量合格；	对主要材料进行检查
	构（配）件质量	进场材料质量合格	把控好进场材料质量关
	设备质量		进行进场报验、开箱检查
	质量验评情况	工序施工符合要求	加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况	/	/
	预算外签证	无	/
合同	合同签订情况	施工合同签订	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行工作

二、安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策划文件（份）	施工人数	安全分包情况			
人身重伤	机械设备	电网事故			分包队伍数量	分包队伍人数	系统外包队伍数量	系统外队伍人数
无	无	无		10 人	1	/	/	/

三、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性	加快施工进度确保施工质量，8月30前具备并网发电。
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。	审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。
质量管理	组件到场进行开箱检查；单位工程重点部位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	督促施工单位按照施工规范和设计要求进行施工。
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	参与过程中重要(关键)环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。

常州正衡电力工程监理有限公司

兴泰晟旭辉屋顶 2.70MW 分布式光伏发电项目监理部

2017 年 08 月 31 日
