



正衡监理

监 理 月 报

工程名称：兴泰晟东鹏博大屋顶 4.61MW 分布式光伏项目

批准：任仲峰

审核：戚平

编辑：邓伟

2017年10月第5期

报告日期：2017年10月13日



监 理 月 报

工程名称：兴泰晟东鹏博大屋顶 4.61MW 分布式光伏项目 10 月次 第 五 次 月报开始时间 2017 年

10 月 1 日结束日期 2017 年 10 月 13 日 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料


序号	单位工程标准名称	资料类型	资料数量	备注
1	兴泰晟东鹏博大屋顶 4.61MW 分布式光伏项目	影像	3 张	

一、 监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度	 <p>1、接地扁铁焊接</p>	<p>本月屋面施工作业基本全部结束，接地扁铁焊接监理方巡查出现因施工过程中对扁铁造成不同程度损伤，导致镀锌层受损出现明显的锈迹现象，监理方已要求进行整改。</p> <p>铜牌搭接本月全部结束。</p> <p>汇流箱、逆变</p>	<p>监理方于 10 月 13 日离场。</p>



2、铜牌搭接

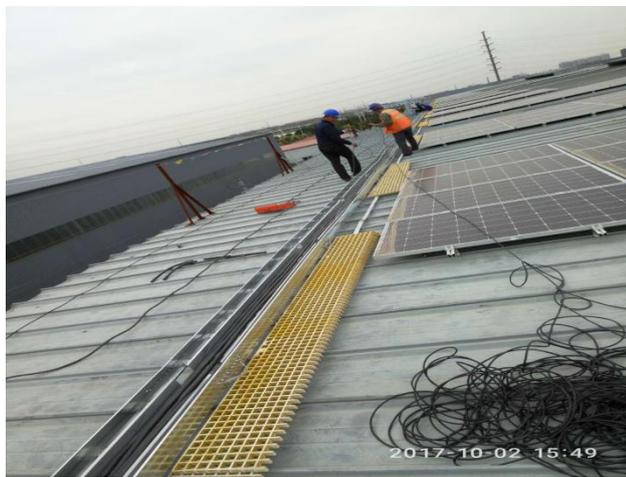

3、通讯接线



4、检修通道安装

器接线包含通讯全部施工完成。


检修通道本月施工已全部结束，监理方对马道紧固螺栓螺杆较长现场要求进行整改，防止对运维人员造成安全隐患。

监控施工及清洗系统已基本全部完成。

（本月应降雨及厂家原因5天未进行施工作业）



5、监控安装

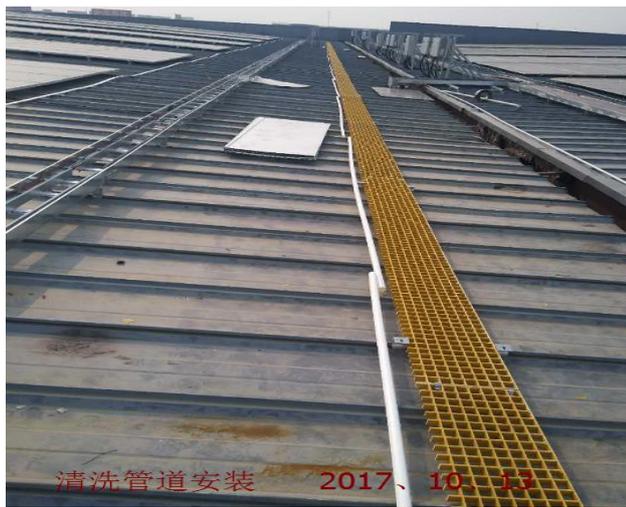

6、清洗管道敷设

<p>设备交付进度</p>	<p>组件采购，其余材料未采购；</p>	<p>组件供货</p>
<p>设计交付进度</p>	<p>无</p>	<p>图纸完成</p>
<p>质量体系运作情况</p>	<p>质量体系健全，运行良好</p>	<p>落实质量保证体系，并对运行情况进行检查</p>
<p>施工图会审</p>	<p>无</p>	
<p>设计交底</p>	<p>无</p>	

	方案审查	未交付	督促施工单位 报审其他资料
	技术交底	无	
	设计变更	无	
安全	安全培训情况	新进场员工已 进行安全培训	督促施工单位 对进场新员工 进行安全教育
	安全交底情况	督促施工单位 对危险作业点 进行班前交底	继续督促施工 单位进行班前 交底
	安全措施落实情况	高空作业、临边 作业安全落实 不全面，已要求 全面整改	监督施工单位 认真落实安全 措施
	安全文明施工情况	现场安全、文明 措施良好	加强现场安全 管理力度
质量	主要工序质量	本月主以光伏 组件安装为主。	电缆敷设，汇流 箱、逆变器安装 调试、并网柜、 计量柜接线。
	主要原材料质量	单晶 280 组件、 接地扁铁	对主要材料进 行检查
	构（配）件质量	进场材料质量 合格	把控好进场材 料质量关
	设备质量	符合设计图纸 要求	进行进场报验、 开箱检查
	质量验评情况	工序施工符合 要求	加强过程检查 力度，加大工序 报验抽查力度

	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行工作
--	--------	-------	----------

二、安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策 划文件(份)	施工 人数	安全分包情况			
人身重 伤	机械设 备	电网事 故			分包队 伍数量	分包队 伍人数	系统外 包队伍 数量	系统外 队伍人 数
无	无	无		6人	1	/	/	/

三、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促总包单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性	严查屋面光伏施工安全、质量，以及进场材料质量合格等事宜，要求施工单位合理安排施工进度计划，及时调整人力、物力
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，现场施工每周组织进行安全文明施工检查工作，要求对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。	审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。
质量管理	严查钢结构高空作业安全防护措施是否到位。	督促建设单位尽快出具施工蓝图，施工单位相关辅材及时采购，现场施工管理人员配置到位。施工质量严格按照设计图纸进行，不得随意进行变更。
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。

常州正衡电力工程监理有限公司

兴泰晟东鹏博大屋顶 4.61MW 分布式光伏项目监理项目部

2017 年 10 月 13 日
