



正衡监理

编号: ZHJL-(CSCH)-05

监 理 月 报

长沙县春华镇九田村 20 兆瓦分布式农业光伏科技项目

2017 年 7 月 第 5 期

项目监理部 (章):



总监理工程师 (代表): 陈仕财

报告日期: 2017 年 7 月 31 日

常州正衡电力工程监理有限公司

监理月报

工程名称：长沙县春华镇九田村 20 兆瓦分布式农业光伏科技项目

第 5 次月报开始时间：2017 年 7 月 1 日 结束日期：2017 年 7 月 31 日

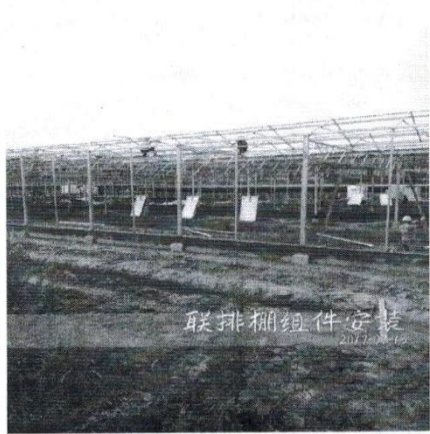
监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	土建单位工程		影像	13	
2	电气安装单位工程		影像	34	

二、监理重点工作情况

专 业	事 项	本月重点工作情况	下月重点工作 计划
进 度		1、联排棚施工全部完成，完成并网。 2、开关站生活办公楼施工完成 30%。 3、升压站设备调试完成 90%。 4、光伏区整改消缺事项完成 50%。	下月工作计划： 1、开关站生活办公楼施工全部完成。 2、整改消缺事项全部完成； 3、完成竣工验收。

	  		
	设备交付进度	材料全部到场;	保证支架、组件的到货;
	设计交付进度	项目施工图纸已交付	跟踪图纸交付

			情况，必须保证连续施工条件；
	质量体系运作情况	质量体系健全，运行良好；	落实质量保证体系，并对运行情况进行检查；
	施工图会审	施工图纸已会审；	
	设计交底	设计交底齐全；	
	方案审查	施工单位方案、措施已制定，已审查完成；	督促施工单位报审其他资料
	技术交底	对各个施工工序的技术交底齐全；	
	设计变更	无设计变更；	
安 全	安全培训情况	每日施工人员进场前进行班前教育；	督促施工单位对进场员工进行安全教育
	安全交底情况	督促施工单位对危险作业点进行班前交底；	继续督促施工单位进行班前交底
	安全措施落实情况	落实不彻底，已要求施工单位认真落实；	监督施工单位认真落实安全措施
	安全文明施工情况	现场文明、安全施工措施实施到位；	加强现场安全管理力度
质 量	主要工序质量	合格；	对桩基础、支架、组件安装进行严格把控；
	主要原材料质量	合格；	对主要设备进行开箱检查
	构（配）件质量	进场材料质量合格	把控好进场材

			料质量关
	设备质量	满足业主设计要求；	进行报验、开箱检查
	质量验评情况	工序施工符合要求	加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度
投 资	资金情况	不详/	/
	款项支付情况	不详	/
	预算外签证	不详	/
合 同	合同签订情况	各单位之间合同齐全	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行工作

三、本月进度情况

光伏区

联排棚施工全部完成，完成并网。整改消缺事项完成 50%。

开关站

开关站生活办公楼施工完成 30%。

四、下月进度计划

所有施工全部完成，完成竣工验收。

五、安全文明施工情况

事故（起）			编制安全 策划文件 （份）	施工 人数	安全分包情况			
人身重伤	机械设备	电网事故			分包队 伍数量	分包队 伍人数	系统外包 队伍数量	系统外队 伍人数

无	无	无			无	/	/	/
---	---	---	--	--	---	---	---	---

长沙县春华镇九田村 20 兆瓦农业光伏科技项目监理项目部

2017 年 7 月 31 日
