



正衡监理

编号: ZHJL-XYHB-01

监 理 月 报

工程名称: 盐城星启新能源翔宇物流 3MW 分布式光伏发电

项目

2017 年 4 月第 1 期

项目监理部 (章):

总监理工程师: 胡德林

报告日期: 2017 年 04 月 29 日



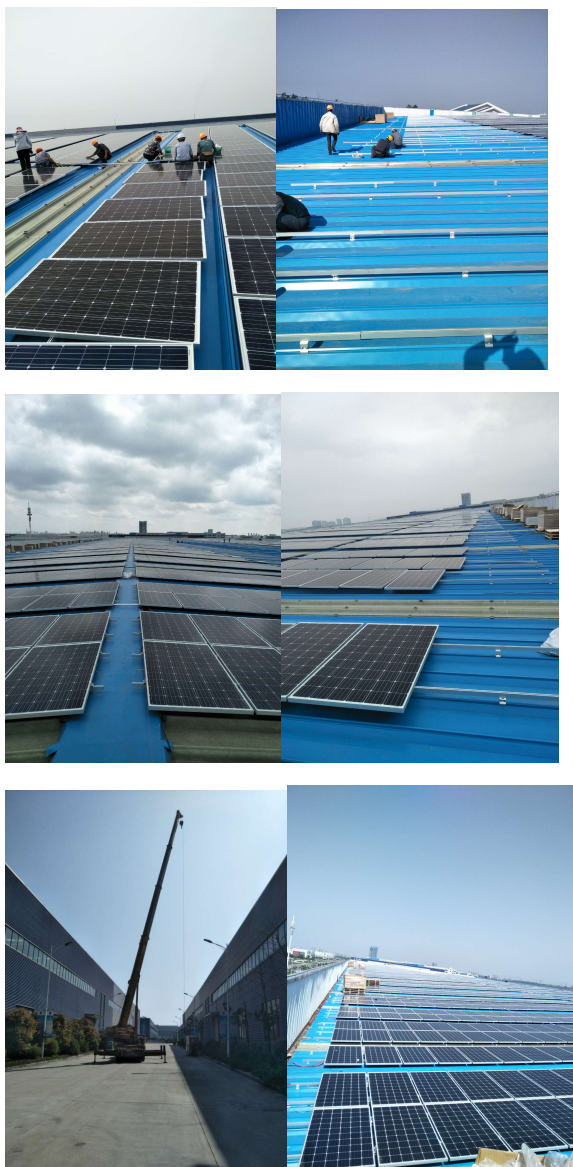
理 月

工程名称： 城星启新能源翔宇物流3MW屋面分布式光伏 目 月次 第1次 月 始

2017年04月01日 束日期 2017年04月31日 理 位： 常州正衡 力工程 理有限公司

序号	位工程 准名称	施工 目名称	料 型	料数量	注
1	盐城星启新能源翔宇物流3MW屋面分布式光伏发电项目	翔宇物流3MW分布式光伏 目	影像	6张	

一、监理重点工作情况

	事	本月重点工作情况	下月重点工作 划
度		1#、2#、3#厂房进行支架及组件安装工作，截止本月底，累计完成导轨铺设90%，组件安装完成70%，	预计5月10号之前完成屋面所有的组件安装工作，5月底之前，计划完成场内箱逆变基础墙体、开关柜基础及封闭，以及外线环网柜基础及电缆敷设工作。

	交付度	组件、瓦扣件、4平方电缆、逆变器已经全部到场	流箱、器、一次、二次相
	设计交付进度	未交付蓝图	未交付蓝图
	质量体系运作情况	质量体系健全，运行良好	落实质量保证体系，并对运行情况进行检查
	施工图会审	完成	
	设计交底	完成	
	方案审查	未交付	督促施工单位报审其他资料
	技术交底	完成	
	设计变更	无	
安全	安全培训情况	新进场员工已进行安全培训	督促施工单位对进场新员工进行安全教育
	安全交底情况	督促施工单位对危险作业点进行班前交底	继续督促施工单位进行班前交底
	安全措施落实情况	落实不彻底，已要求施工单位认真落实	监督施工单位认真落实安全措施
	安全文明施工情况	现场安全、文明措施良好	加强现场安全管理力度
量	主要工序质量	支架及组件安装，电缆桥架安装，箱逆变预制仓就位；	支架及组件安装；电缆敷设，电缆头制作；箱式变压

			器、逆变器试验及调试。
	主要原材料质量	电缆外观质量合格，支架外观检查合格，组件观感质量合格；	对主要材料进行检查
	构（配）件质量	进场材料质量合格	把控好进场材料质量关
	设备质量		进行进场报验、开箱检查
	质量验评情况	工序施工符合要求	加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度
投	资金情况	/	/
	款项支付情况	/	/
	预算外签证	无	/
合同	合同签订情况	施工合同签订	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行工作

一、 本月 度情况

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	本月实际完成（完成量/总量）	累计完成（完成量/总量）	备注
1	定位放线			/	/	/	/	/
2	支架安装	2017.04.14	2017.05.03	2017.04.14	2017.05.03	60%	60%	
3	组件安装	2017.04.18	2017.05.10	2017.04.18	2017.05.18	60%	60%	
4	电缆桥架（直流）			/	/	/	/	
5	直流电缆4mm ²			/	/	/	/	
6	直流电缆2*120mm/2*			/	/	/	/	

7	高压电缆3*150/3*40			/	/	/	/	
8	箱式变压器安装			/	/	/	/	
9	逆变器安装			/	/	/	/	
10	20KV开关柜			/	/	/	/	
11	二次室设备			/	/	/	/	

二、 下月进度计划

序号	任 名 称	划 始	划 束	施 工 始 日期	施 工 束 日期	下月 划 完成 (完成量/量)	本月 完 成 (完 成量/量)	注
1	定位放			/	/	3.75MW		
2	支架安装	2017.04.14	2017.05.03			3.75MW		
3	件安装	2017.04.18	2017.05.10			3.75MW		
4	架 (直流)			/	/		/	
5	直流 4mm ²			/	/	100%	/	
6	直流 2*120mm/2*150mm/2*95mm		2017.05.28	/	/	100%	/	
7	高 3*150/3*400敷		2017.05.28	/	/	100%	/	
8	箱式 器安装		2017.05.28	/	/	100%	/	
9	逆 器安 装		2017.05.28	/	/	100%	/	
10	20KV 柜		2017.05.28	/	/	100%	/	
11	二次室		2017.05.28	/	/	100%	/	

三、 安全文明施工情况

事故 (起)			制安全策 划文件 (份)	施 工 人 数	安全分包情况			
人身重	机械	网事 故			分包 伍 数量	分包 伍 人数	系 外 包 伍 数量	系 外 伍人 数

无	无	无		28人	/	/	/	/

四、 施工重点工作情况

	本月重点工作情况	下月重点工作 划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源 配置，充分调动施工人员的积极性	配合建设单位做好并网前准备工作。要求施 工单位合理安排施工进度计划，及时调整人 力、物力
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管 理制度》，安委会要定期对现场进行 安全检查； 对施工人员进行安全培 训、考试，提高作业人员安全防范意 识，落实安全文明施工措施。	审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项 目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作 业人员资格证明文件，实施安全监理，发现 问题及时提出整改要求并限期改正。
质量管理	组件到场进行开箱检查；单位工程重 点部位施工进行旁站；督促施工单位 质量通病防治措施；监督施工项目部 落实强制性条文的执行计划。	督促施工单位按照施工工艺和设计要求及上 海电力的规范要求进行施工
技 管理	督促施工 位 施工人 行技 交底， 施工人 是否 按照技 交底内容 行施工。	参与 程中重要（ ） 的施工技 交底会， 督 行情况。
造价管理	施工 位申 的工程款及 行	工程量 施 量，及 核施工 目 部 送的工程量清 、 度款支付申
物 供	助建 位做好建 物 工作，督促施工 位做好物 保 管工作，要求施工 位安排人 施工 行巡 ，确保物 不 失。	督促施工 位按照 工日期的要求，安 排人 、机具 行施工。

常州正衡电力工程监理有限公司

盐城星启新能源翔宇物流屋面3MW分布式光伏发电项目监理
项目部

2017年05月01日
