



正衡监理

编号: ZHJL-XYHB-03

监 理 月 报

工程名称: 盐城星启新能源翔宇物流 3MW 分布式光伏发电

项目

2017年6月第3期

项目监理部 (章):

总监理工程师:

报告日期: 2017年06月26日



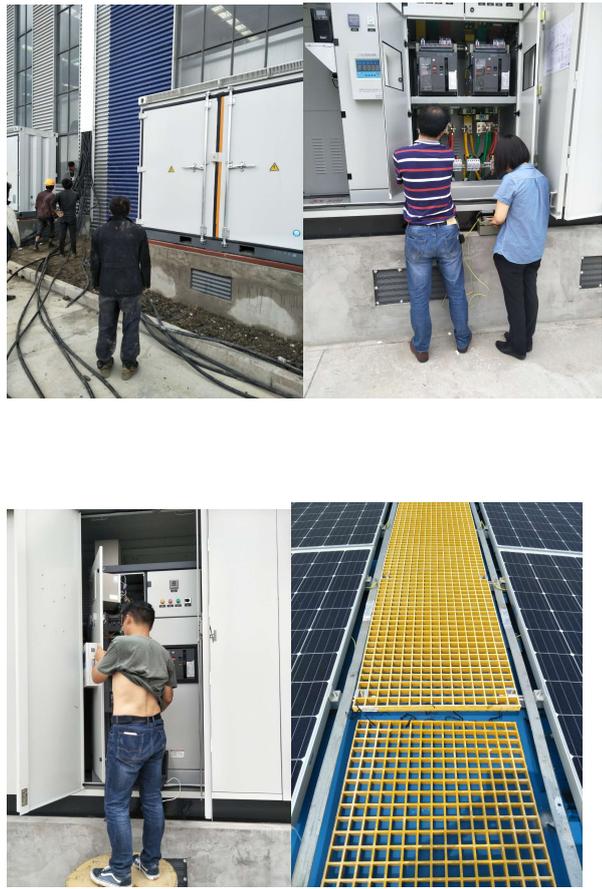
理 月

工程名称： 城星启新能源翔宇物流3MW屋面分布式光伏 目 月次 第3次 月 始

2017年06月01日 束日期 2017年06月28日 理 位：常州正衡 力工程 理有限公司

序号	位工程 准名称	施工 目名称	料 型	料数量	注
1	盐城星启新能源翔宇物流3MW屋面分布式光伏发电项目	翔宇物流3MW分布式光伏 目	影像	8张	

一、 监理重点工作情况

事	本月重点工作情况	下月重点工作 划
 <p>度</p>	<p>6月份开始，现场继续进行屋面桥架电缆敷设，汇流箱安装接线工作截止6月8号已基本完成，站 吊装月初基本完成，器部分施工人 行站一次二次 接 工作，网接地工作，外 施 工 敷 于6月8号全部完工，截止6月9号，施工 已全部完成 站 吊装、制作、接、接地及相器部分工作。</p> <p>站于2017年6月10号 行并网前 收工作，6</p>	<p>施工现场未完工作主要有，屋面监控系统安装，气象站安装，冲洗设备安装。并计划组织于7月3号进行监理初检，迎接业主预验收。</p>

		<p>月10号至15号 行 站 收消缺。6月15 号市供 公司 行并网前 收。 工程于2 017年06月25号 上午11点倒送 完成，成功 并网</p>	
	<p>交付 度</p>	<p>四台箱变；6 月5号</p>	
	<p>设计交付进度</p>	<p>交付施工蓝图</p>	<p>交付施工蓝图</p>
	<p>质量体系运作情况</p>	<p>质量体系健 全，运行良好</p>	<p>落实质量保证 体系，并对运 行情况进行检 查</p>
	<p>施工图会审</p>	<p>完成</p>	
	<p>设计交底</p>	<p>完成</p>	
	<p>方案审查</p>	<p>已报审</p>	<p>质监站检查相 关报审资料已 基本齐全</p>
	<p>技术交底</p>	<p>完成</p>	
	<p>设计变更</p>	<p>无</p>	
<p>安全</p>	<p>安全培训情况</p>	<p>新进场员工已 进行安全培训</p>	<p>督促施工单位 对进场新员工 进行安全教育</p>
	<p>安全交底情况</p>	<p>督促施工单位 对危险作业点 进行班前交底</p>	<p>继续督促施工 单位进行班前 交底</p>

	安全措施落实情况	落实不彻底，已要求施工单位认真落实	监督施工单位认真落实安全措施
	安全文明施工情况	现场安全、文明措施良好	加强现场安全管理力度
量	主要工序质量	支架及组件安装，电缆桥架安装，箱逆变器安装，配电室设备安装及调试	相关设备调试
	主要原材料质量	电缆外观质量合格，支架外观检查合格，组件观感质量合格；	对主要材料进行检查
	构（配）件质量	进场材料质量合格	把控好进场材料质量关
	设备质量		进行进场报验、开箱检查
	质量验评情况	工序施工符合要求	加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度
投	资金情况	/	/
	款项支付情况	/	/
	预算外签证	无	/
合同	合同签订情况	施工合同签订	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行工作

一、 本月 度情况

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	本月实际完成（完成量/总量）	累计完成（完成量/总量）	备注
1	定位放线			/	/	/	/	/

2	支架安装	2017.04.14	2017.05.03	2017.04.14	2017.05.03	100%	100%	
3	组件安装	2017.04.18	2017.05.10	2017.04.18	2017.05.18	100%	100%	
4	电缆桥架(直流)			2017.05.22	2017.05.28	100%	100%	
5	直流电缆4mm ²				2017.05.22	100%	100%	
6	直流电缆2*95mm ² /2*70mm/2*50mm			2017.05.24	2017.06.02	100%	100%	
7	高压电缆3*150/3*40				2017.06.07	100%	100%	
8	箱式变压器安装				2017.06.05	100%	100%	
9	逆变器安装			2017.05.22	2017.05.22	100%	100%	
10	20KV开关柜			2017.05.28	2017.06.01	100%	100%	
11	二次室设备			2017.05.28	2017.06.01	100%	100%	

二、 下月进度计划

截止6月28号，翔宇物流屋面3MW分布式光伏 目已完成并网，下个月工作计划，理初；2017.06.03. 厂家；2017.06.05 主 收；2017.06.10

三、 安全文明施工情况

事故(起)			制安全策 划文件(份)	施工 人数	安全分包情况			
人身重	机械	网事 故			分包 伍 数量	分包 伍 人数	系 外 包 伍 数量	系 外 伍 人 数
无	无	无		30人	/	/	/	/

四、 施工重点工作情况

	本月重点工作情况	下月重点工作 划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配 置，充分调动施工人员的积极性	配合建设单位做好并网前准备工作。要求施 工单位合理安排施工进度计划，及时调整人 力、物力
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理 制度》，安委会要定期对现场进行 安全检查；对施工人员进行安全培 训、考试，提高作业人员安全防范意 识，落实安全文明施工措施。	审查施工项目部《安全文明措施》及施工项 目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作 业人员资格证明文件，实施安全监理，发现 问题及时提出整改要求并限期改正。

质量管理	组件到场进行开箱检查；单位工程重点部位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	督促施工单位按照施工工艺和设计要求及上海电力的规范要求进行施工
技 管理	督促施工 位 施工人 行技 交底， 施工人 是否 按照技 交底内容 行施工。	参与 程中重要（ ） 的施工技 交底会， 督 行情况。
造价管理	施工 位申 的工程款及 行	工程量 施 量，及 核施工 目 部 送的工程量清 、 度款支付申
物 供	助建 位做好建 物 工作，督促施工 位做好物 保 管工作，要求施工 位安排人 施工 行巡 ，确保物 不 失。	督促施工 位按照 工日期的要求，安 排人 、机具 行施工。

常州正衡电力工程监理有限公司

盐城星启新能源翔宇物流屋面3MW分布式光伏发电项目监理
项目部

2017年06月28日
