

GFDZJBM16: 监理月报

编号: 001

监 理 月 报

工程名称: 禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 220kV 线路送出工程

2017 年 3 月 第 1 期

总监理工程师: _____

监理项目部 (章)

报告日期: 2017 年 3 月 27 日


一、本月工程实施情况

本工程刚刚开工正在紧张施工，本月底全场进度线路复测、分坑共 25 基全部完成，G11-G16、18、19 共 8 基基础开挖完成，G14、G15 基础浇筑混凝土结束，G10、G11 开始扎模绑钢筋。

工序名称	总工程量	权重	总累计量	总完成率	权重
线路工程		100.00%			100.00%
基础定位（个）	25	5.00%	25	100.00%	5.00%
基础开挖（个）	25	10.00%	8	32.00%	3.20%
基础支模（个）	25	5.00%	2	8.00%	0.80%
基础绑筋(个)	25	10.00%	2	8.00%	0.80%
基础浇筑（个）	25	15.00%	2	8.00%	1.20%
基础回填（个）	25	5.00%	0	0.00%	0.00%
铁塔组塔（基）	25	25.00%	0	0.00%	0.00%
保护帽浇筑	25	5.00%	0	0.00%	0.00%
接地埋设	25	5.00%	0	0.00%	0.00%
架线完成	25	10.00%	0	0.00%	0.00%
竣工验收	25	5.00%	0	0.00%	0.00%
综合完成率					11.00%

二、本月监理工作情况

2.1 工程进度控制方面的工作情况：本月项目刚刚动工，图纸、土地、交通、天气等因素下工程进展缓慢，按照施工方排的计划都满足节点。

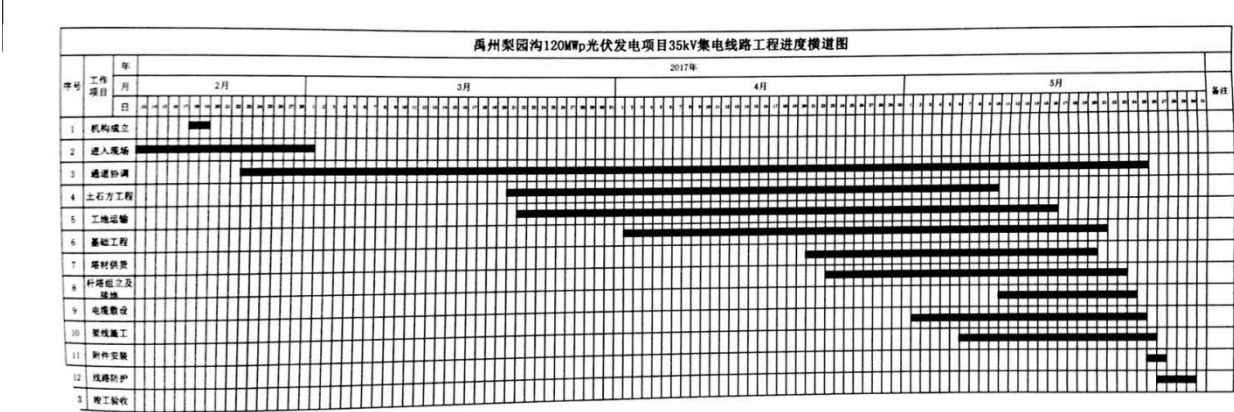

2.2 工程质量控制方面的工作情况：进场材料需监理单位、建设单位、施工单位共同检测合格后方可投入使用，保管好材料合格证、说明书、钥匙及第三方的有效证件，要有进场台帐记录；分包单位资料员做好现场检验批划分工作，做到资料与现场进度同步进行，确保资料齐全；对地锚桩浇筑严格按照规定标准施工(旁站)，并督促分包单位做好材料送检（水泥、砖、沙钢筋等）及第三方检测的相关工作。

2.3 安全生产管理方面的工作情况：要求施工单位重视安全工作，加强对工人队伍的管理和选择；对现场安全帽佩戴、消防即施工临时用电情况进行检查，总包单位对检查出问题配合整改，双方业主对监理方的工作都非常肯定。

三、工程存在问题及建议

图纸没有完全到场而且都是白图没有开过图纸预审会，土地征用方面部分塔基没有处理

好要做 2 手准备。

四、 下月监理工作重点

4.1 在工程管理方面的监理工作重点

(1) 监理人员对正在施工的部位或工序进行定期或不定期的监督检查对规定的需取样送试验室检验的原材料和样品，经监理人员对取样进行见证、封样、签认；监理人员按照委托监理合同约定对工程项目的关键部位、关键工序的施工质量、安全实施连续性的现场全过程监督检查；项目监理机构认为有必要时，在承包单位自检的基础上，按一定比例独立或委托进行检查或检测的活动。

(2) 项目监理机构采用签发会议纪要和监理工作联系单、监理工程师通知单等形式进行施工过程的控制；项目监理机构对施工过程中出现的问题和争议，通过一定的活动及方法，使各方协同一致，实现预定目标，贯彻“质量第一”的方针，工程合格率达到 100%。

4.2 在项目监理机构内部管理方面的工作重点

监理方坚决遵守国家法律法规和监理规范，依国家有关验收规范和要求对比工程进行严格检查，加大工作力度，做好现场协调工作，确保工程合格竣工。

常州正衡电力工程监理有限公司

禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 220kV 线路送出工程

监理部

2017 年 3 月 27 日
