



编号：JL-（PGSGF）-2

监 理 月 报

工程名称：中设国联于都县盘古山镇 60MWp（二期 40MWp）
光伏电站中草药种植一体化项目

2017 年 6 月第 2 期

项目监理部（章）：



总监理工程师：任仲峰

报告日期：2017 年 06 月 30 日

监 理 月 报

工程名称：中设国联于都县盘古山镇 60MWp（二期 40MWp）光伏电站中草药种植一体化项目

月报开始时间 2017 年 6 月 1 日 结束日期 2017 年 6 月 30 日


监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	光伏区、升压站	中设国联于都县盘古山镇 60MWp（二期 40MWp）光伏电站中草药种植一体化项目	影像	7 张	

一、监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度		升压站土建工程完成、升压站设备安装完成、升压站设备单机调试、试验完成。完成质监站检查、供电局检查、并网前启动委员会通过 6 月 27 日并网发电。光伏 2 区箱变及基础完成 1 个，	完成光伏区现有土地完成桩基础打桩浇筑施工，完成对应支架、组件安装，防雷接地、箱变及基础、逆变器、汇流箱、光伏电缆和质量电缆敷设施工。

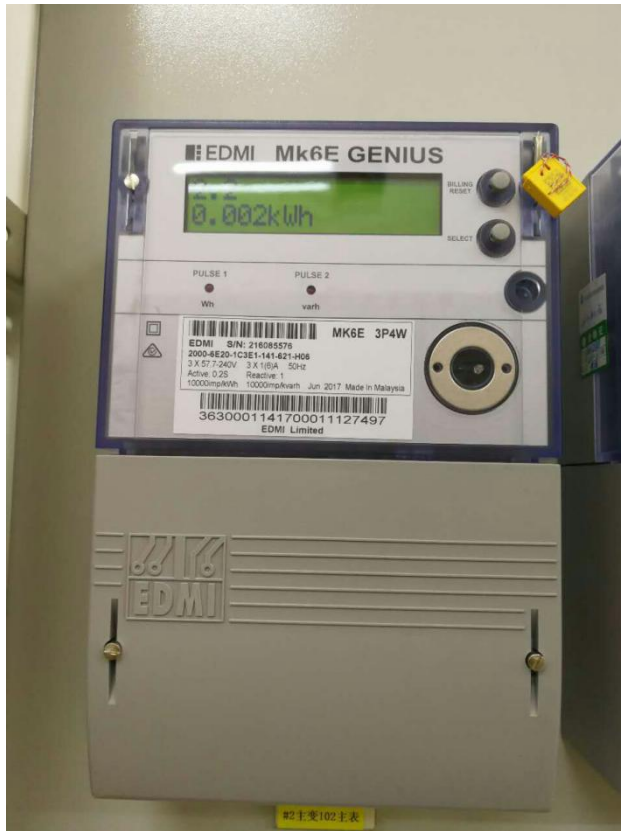

目前可施工区域基本完成，正在光伏1区施工。集电线路6月28日完成最后一根线架接。



设备交付进度	开关站设备已全部到场安装，	催促施工方设备尽快全部到

		箱变到场 5 台、 组件到场 20.1% 逆变器到场 396 台汇流箱 52 台	场，满足目前施工需要
	设计交付进度	已完成升压站 土建、电气图 纸，光伏#2#3 光 伏电缆敷设	尽快交付光伏 区土建、电气施 工图
	质量体系运作情况	质量体系健全， 运行良好	落实质量保证 体系，并对运行 情况进行检查
	施工图会审	6 月 13 日进行图 纸会审	
	设计交底	已交底	
	方案审查	满足施工需求	督促施工单位 报审其他资料
	技术交底	满足施工需求	
	设计变更	暂无	
安全	安全培训情况	新进场员工已 进行安全培训	督促施工单位 对进场新员工 进行安全教育
	安全交底情况	督促施工单位 对危险作业点 进行班前交底	继续督促施工 单位进行班前 交底
	安全措施落实情况	落实不彻底，已 要求施工单位 认真落实	监督施工单位 认真落实安全 措施
	安全文明施工情况	现场安全、文明 措施良好	加强现场安全 管理力度

质量	主要工序质量	满足设计及规范要求。	对现场进行巡视检查和旁站。
	主要原材料质量	混凝土；钢筋已送检，检查报告合格。	对主要材料进行检查
	构（配）件质量	进场材料质量合格，现场进行仪器、外观检查	把控好进场材料质量关
	设备质量	进场设备检测报告齐全，符合合同要求	进行进场报验、开箱检查
	质量验评情况	工序施工符合要求	加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度
投资	资金情况	按照施工进度和施工合同支付	/
	款项支付情况	已支付首次	/
	预算外签证	无	/
合同	合同签订情况	施工合同已签订	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行工作

一、 本月进度情况

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	本月实际完成（完成量 / 总量）	累计完成（完成量 / 总量）	备注
1	升压站设备基础	2017.5.5	2017.5.14	2017.5.13	2017.6.1	1%	100%	
2	升压站设备安装、调	2017.6.1	2017.6.25	2017.6.1	2017.6.27	100%	100%	

	试							
3	集电线路	2017.5.4	2017.6.18	2017.6.12	2017.6.26	100%	100%	
4	钻孔施工	2017.5.8	2017.7.17	2017.5.6	2017.6.30	8%	13%	
5	桩基础浇筑	2017.5.8	2017.7.18	2017.5.10	2017.6.30	8%	11%	
6	支架安装	2017.5.16	2017.7.28	2017.5.14	2017.6.30	7%	7.6%	
7	组件安装	2017.5.23	2017.8.4	2017.5.19	2017.5.31	6.8%	6.8%	
8	防雷接地	2017.5.26	2017.8.1	2017.6.21	2017.6.23	5%	5%	
9	箱变机基础	2017.6.13	2017.6.27	2017.5.24	2017.6.30	6%	6%	

二、 下月进度计划

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	下月计划完成（完成量 / 总量）	本月实际完成（完成量 / 总量）	权值
1	逆变器安装	2017.5.9	2017.7.24			100%	5.2%	
2	支架安装	2017.5.16	2017.7.28			100%	7.6%	
3	光伏组件安装	2017.5.23	2017.8.4			80%	6.8%	
4	汇流箱安装、光伏电缆	2017.6.5	2017.8.19			50%	3.5%	
5	防雷接地	2017.5.26	2017.8.1			100%	5%	
6	箱变安装	2017.6.13	2017.7.28			100%	6%	

三、 安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策划文件（份）	施工人数	安全分包情况			
人身重伤	机械设 备	电网事故			分包队伍数量	分包队伍人数	系统外 包队伍 数量	系统外 队伍人 数
无	无	无	3	90 人	2	40	/	/

四、 施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性；要求尽快完成施工图	完成目前可施工区域
安全管理	不定期巡视检查现场工作	不定期巡视检查现场工作
质量管理	对施工过程进行巡检旁站监理，及时解决发现问题。	督促施工单位按照施工工艺和设计要求及图纸的规范要求施工
技术管理	按图纸设计及要求和监理规划细则	按图纸设计及要求和监理规划细则
造价管理	/	/
物资供应	督促施工单位用料供应及时到场	督促施工单位围栏尽快到场进行安装

常州正衡电力工程监理有限公司

中设国联于都县盘古山镇 60MWp（二期 40MWp）光伏电站中草药

种植一体化项目监理部

2017 年 6 月 30 日
