



编号: JL-WD-01

监 理 月 报

工程名称: 绿源电动车江苏有限公司屋顶 5.87MW 分布式光
伏发电项目

2016 年 5 月第 1 期

项目监理部 (章)



总监理工程师: 李全忠

报告日期: 2017 年 05 月 30 日

监 理 月 报

工程名称: 绿源电动车江苏有限公司屋顶 5.87MW 分布式光伏发电项目 月次 第 1 次 月报开始时间

2017 年 5 月 1 日 结束日期 2017 年 5 月 30 日 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	绿源电动车江苏有限公司屋顶 5.87MW 分布式光伏发电项目		影像	67 张	


一、 监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度	 绿源屋面支架安装20170501	1#厂房、2#厂房屋面支架安装完成。1#厂房、2#厂房屋面接地环网施工完成。一次舱、二次舱、1#-4#箱变基础浇筑完成。 1#、2#车间内部加固施工。	1#、2#车间内部加固完成。







绿源屋面接地安装2017510

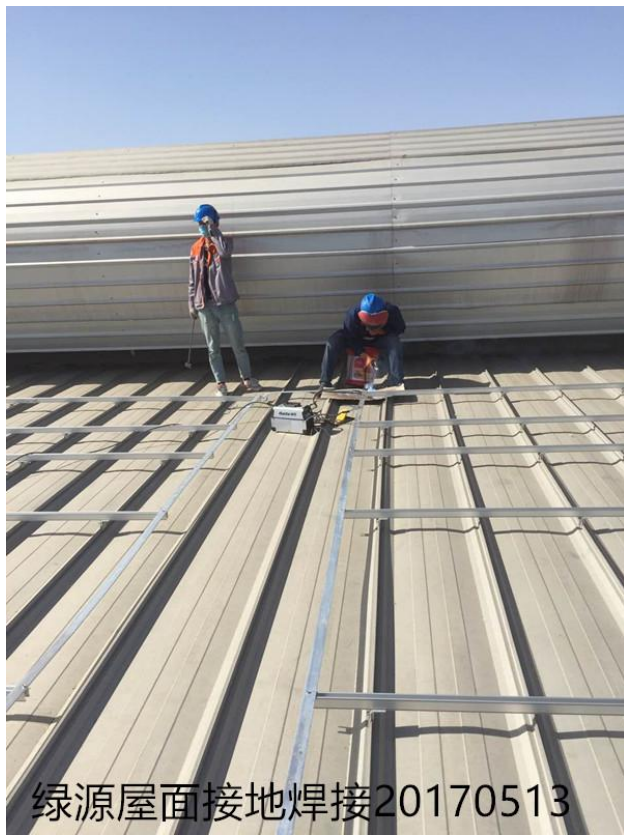


绿源屋面接地焊接20170513

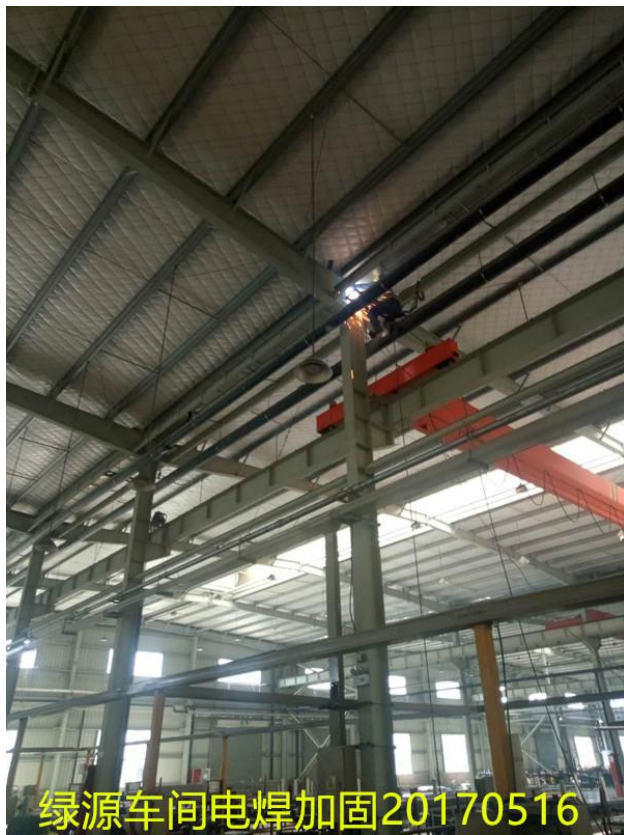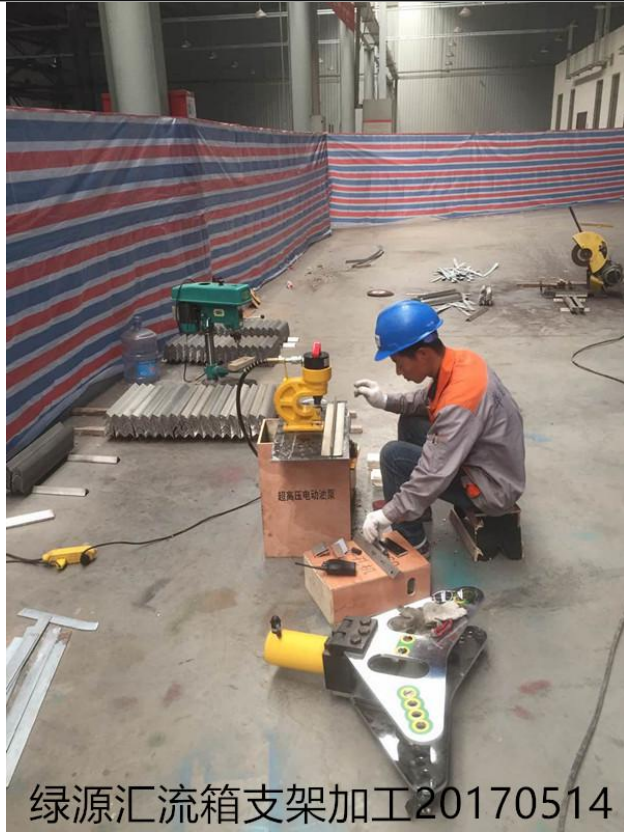



绿源土建抹灰现场巡视20170517

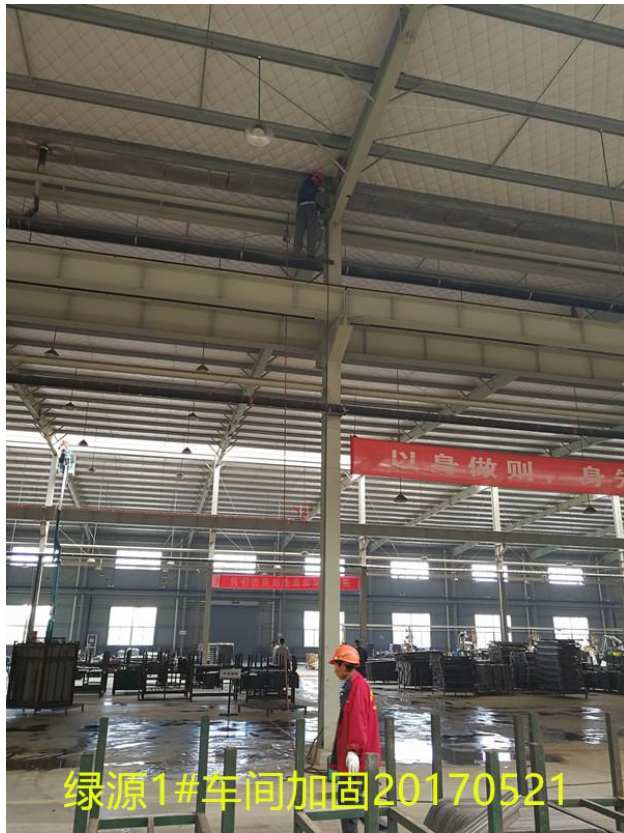

绿源1#车间加固20170521



绿源支架加工巡视20170523

			
	设备交付进度	支 架 进 场 5.87MW、电 缆 桥架部分到场	组件、电缆、逆 变器、箱变等材 料未进场
	设计交付进度	电子图纸完成	电子图纸完成
	质量体系运作情况	质量体系健全， 运行良好	落实质量 保证 体系，并对运行 情况进行检查
	施工图会审	完成	
	设计交底	完成	
	方案审查	未交付	督促施工 单位 报审其他资料
	技术交底	完成	
	设计变更	无	
安全	安全培训情况	新进场员工已 进行安全培训	督促施工 单位 对进场新员工 进行安全教育
	安全交底情况	督促施工 单位 对危险作业点 进行班前交底	继续督促施 工 单位进行班前 交底
	安全措施落实情况	落实不彻底，已 要求施工 单位	监督施工 单位 认真落实安全

		认真落实	措施
	安全文明施工情况	现场安全、文明措施良好	加强现场安全管理力度
质量	主要工序质量	支架安装，一次舱、二次舱、1#-4#箱变基础	支架安装；电缆接地敷设
	主要原材料质量	支架外观检查合格	对主要材料进行检查
	构（配）件质量	进场材料质量合格	把控好进场材料质量关
	设备质量		进行进场报验、开箱检查
	质量验评情况	工序施工符合要求	加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况		/
	预算外签证	无	/
合同	合同签订情况	施工合同签订	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行工作

二、 本月进度情况

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	本月实际完成（完成量 / 总量）	累计完成（完成量 / 总量）	备注
----	------	--------	--------	--------	--------	------------------	----------------	----

						量)		
1	支架安装		2017.5.10	2017.4.29	2017.5.10	5.87MW/ 5.87MW	5.87MW /5.87MW	
2	电缆桥架 安装		2017.5.25			0MW/5.8 7MW	0MW/5. 87MW	
3	方阵接地 网安装		2017.5.15	2017.5.10	2017.5.15	5.87MW/ 5.87MW	5.87MW /5.87MW	
4	组件安装		2017.5.25			0MW/5.8 7MW	0MW/5. 87MW	
5	直流电缆		2017.5.25			0MW	0MW/5. 87MW	
6	高压电缆		2017.5.25			0MW	0MW/5. 87MW	
7	汇流箱安 装		2017.5.15			0 台	0 台 /28 台	
8	逆变器安 装		2017.5.20			0 台	0 台/110 台	
9	箱式变压 器		2017.5.30			0 台	0 台/4 台	
10	一次舱设 备		2017.5.30			0 台	0 台/1 台	
11	二次舱设 备		2017.5.30			0 台	0 台/1 台	

三、 下月进度计划

序号	任 务 名 称	计划开始时间	计 划 结 束时间	施工开始日期	施 工 结 束日期	下月计划完成 (完成量 / 总量)	本月实际完成 (完成量 / 总量)	权值
1	支架安装		2017.5.10	2017.4.29	2017.5.10	5.87MW	5.87MW	
2	电缆桥架 安装		2017.5.25			0MW	0MW	
3	方阵接地 网安装		2017.5.15	2017.5.10	2017.5.15	5.87MW	5.87MW	
4	组件安装		2017.5.25			0MW	0MW	
5	直流电缆		2017.5.25			0MW	0MW	

6	高压电缆		2017.5.25			0MW	0MW	
7	汇流箱安装		2017.5.15			0 台		
8	逆变器安装		2017.5.20			0 台		
9	箱式变压器		2017.5.30			0 台		
10	一次舱设备		2017.5.30			0 台		
11	二次舱设备		2017.5.30			0 台		

四、 安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策	施工	安全分包情况			
人身重 伤	机械设 备	电网事 故	划文件(份)	人数	分包队 伍数量	分包队 伍人数	系统外 包队伍 数量	系统外 队伍人 数
无	无	无		42 人		/	/	/

五、 施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性	配合建设单位做好并网前准备工作。要求施工单位合理安排施工进度计划，及时调整人力、物力
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。	审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。
质量管理	组件到场进行开箱检查；单位工程重点部位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	督促施工单位按照施工工艺和设计要求及上海电力的规范要求进行施工
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，	参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，

	现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	监督检查执行情况。
造价管理	对施工单位申请的工程款及时进行评审	对工程量实施计量，及时审核施工项目部报送的工程量清单、进度款支付申请
物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	督促施工单位按照复工日期的要求，安排人员、机具进行施工。

常州正衡电力工程监理有限公司

绿源电动车江苏有限公司屋顶 5.87MW 分布式光伏发电项目
目监理部

2017 年 5 月 30 日
