



常州正衡电力工程监理有限公司
Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision CO., Ltd.

国家标准《光伏发电工程建
设监理规范》主编起草单位

编号: JLYB-PHSM-2017531

监 理 月 报

平湖昇茂新能源科技有限公司上虞、柯桥地区 6.92021MWp 分布式
光伏项目监理月报

2017 年 5 月第 1 期项目监理部（章）：

总监理工程师：李维军

2017 年 05 月 31 日

监 理 月 报

工程名称：平湖昇茂新能源科技有限公司上虞、柯桥地区 6.92021MW 分布式光伏项目 5 月次 第 1 次 月报开始时间 2017 年 5 月 01 日 结束日期 2017 年 05 月 31 日


监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	平湖昇茂新能源 科技有限公司上 虞、柯桥地区 6.92021MW 分 布 式光伏项目	昶和纤维(浙江)有限公司 3871.12KWp 分布式 光伏发电项目	影像	4 张	
		绍兴雅格伞业有限公司 1189.32KWp 分布式 光伏发电项目	影像	4 张	
		浙江海滨薄膜科技有限公 司 1859.77KWp 分布式 光伏发电项目	影像	4 张	

监理重点工作情况

专业	施工照片资料	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度	 晴 32 ~ 20℃ 微风 绍兴市上虞市连港公路 2017年05月10日 10:23 星期三 昶和纤维   晴 29 ~ 20℃ 微风 绍兴市上虞市连港公路 2017年05月26日 09:45 星期五 昶和纤维 	1. 昶和纤维（浙江）有限公司分布式光伏发电项目本月夹具、导轨、组件等正在安装；配电房、箱变基础、防水层等正在施工；其余工程均未开展；	1. 厂房防水层铺设； 2. 组件安装； 3. 汇流箱、逆变器安装； 4. 箱变、开关站施工； 5. 电缆放线；

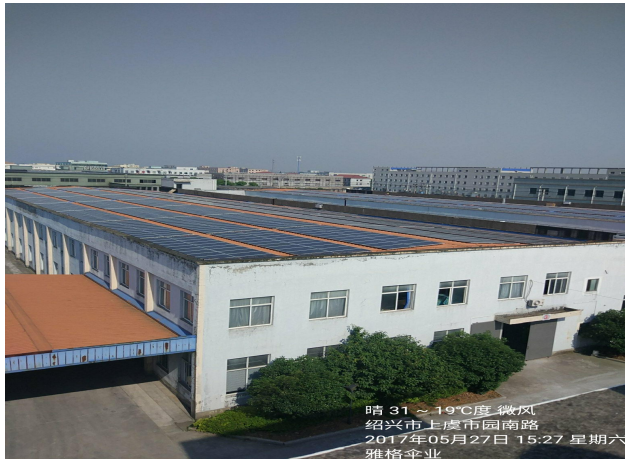

2. 绍兴雅格伞业
有 限 公 司
1189.32KWp 分布
式光伏发电项目
水泥基座浇筑完
成，组件、逆变
器、汇流箱正在
安装，桥架等工
序
正在施工；


- 1.电缆放线；
- 2.逆变器、汇流箱安装；
- 3.箱变基础施工；



阴转多云 31 ~ 22℃度 微风
绍兴市绍兴县东二路
2017年05月20日 14:48 星期六
海滨薄膜



晴 26 ~ 17℃度 微风
绍兴市绍兴县江滨路
2017年05月17日 10:57 星期三
海滨薄膜

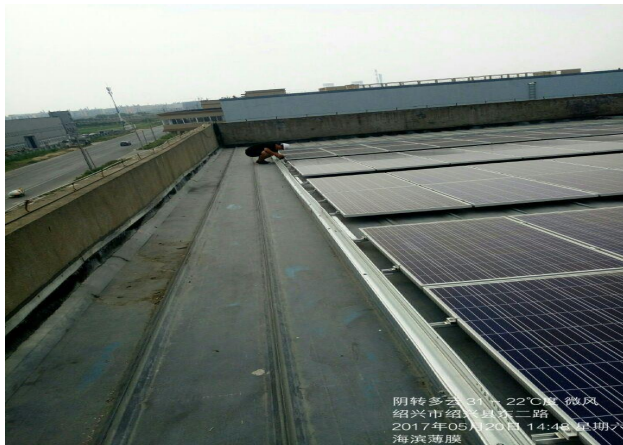

阴转多云 31 ~ 22℃度 微风
绍兴市绍兴县东二路
2017年05月20日 14:48 星期六
海滨薄膜



晴 26 ~ 17℃度 微风
绍兴市绍兴县东二路
2017年05月17日 10:42 星期三
海滨薄膜

3. 浙江海滨薄膜科技有限公司 1859.77KWp 分布式光伏发电项目 组件安转已完成，桥架安装工序正在施工，汇流箱、逆变器已安装，箱变基础已完成；

1. 逆变器、汇流箱接线；
2. 桥架敷设；
3. 箱变、开关站施工；

	设备交付进度	各项目均部分电缆未到，箱变、开关柜设备未到；	
	设计交付进度	图纸完成	图纸完成
	质量体系运作情况	质量体系健全，运行良好	落实质量保证体系，并对运行情况进行检查
	施工图会审	完成	
	设计交底	完成	
	方案审查	未交付	督促施工单位报审其他资料
	技术交底	完成	
	设计变更	无	
安全	安全培训情况	新进场员工已进行安全培训	督促施工单位对进场新员工进行安全教育
	安全交底情况	督促施工单位对危险作业点进行班前交底	继续督促施工单位进行班前交底
	安全措施落实情况	落实不彻底，已要求施工单位认真落实	监督施工单位认真落实安全措施
	安全文明施工情况	现场安全、文明措施良好	加强现场安全管理力度
质量	主要工序质量	支架及组件安装，电缆桥架安装，电缆敷设；	支架及组件安装；电缆敷设，电缆头制作及耐压试验；

	主要原材料质量	电缆外观质量合格，支架外观检查合格，组件观感质量合格；	对主要材料进行检查
	构（配）件质量	进场材料质量合格	把控好进场材料质量关
	设备质量		进行进场报验、开箱检查
	质量验评情况	工序施工符合要求	加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况	/	/
	预算外签证	/	/
合同	合同签订情况	施工合同签订	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行工作

一、 本月进度情况

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	本月实际完成（完成量/总量）	累计完成（完成量/总量）	备注
昶和纤维(浙江)有限公司 3871.12KWp 分布式光伏发电项目								
1	组件安装			2017.05.12		已完成60%		由于厂房须重做防水导致时间延长；
2	桥架敷设			2017.05.20		已完成50%		
绍兴雅格伞业有限公司 1189.32KWp 分布式光伏发电项目								
1	组件安装			2017.05.04		已完成80%		材料不齐
2	接地安装			2017.05.23		已完成30%		

3	桥 架 安 装			2017.05. 18		已 完 成 40%		
浙江海滨薄膜科技有限公司 1859.77KWp 分布式光伏发电项目								
1	夹 具 导 轨安装			2017.04. 08		已 完 成		因故停工一个月
2	组 件 安 装			2017.05. 03		已 完 成		
3	汇 流 箱 安装			2017.05. 24		已 完 成		
4	逆 变 器 安装			2017.05. 24		已 完 成		

二、安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策	施工	安全分包情况			
人身重 伤	机械设 备	电网事 故	划文件（份）	人数	分包队 伍数量	分包队 伍人数	系统外 包队伍 数量	系统外队伍人数
无	无	无		60 人	2	/	/	/

三、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性	配合建设单位做好并网前准备工作。要求施工单位合理安排施工进度计划，及时调整人力、物力
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。	审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。
质量管理	组件到场进行开箱检查；单位工程重点部位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工	督促施工单位按照施工工艺和设计要求规范要求要求进行施工

	项目部落实强制性条文的执行计划。	
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。
造价管理	对施工单位申请的工程款及时进行评审	对工程量实施计量，及时审核施工项目部报送的工程量清单、进度款支付申请
物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	督促施工单位按照复工日期的要求，安排人员、机具进行施工。

常州正衡电力工程监理有限公司

平湖昇茂新能源科技有限公司上虞、柯桥地区 6.92021MWp

分布式光伏发电项目监理部

2017 年 05 月 31 日
