



正衡监理

编号: JL- (JNSH) -02

监 理 月 报

工程名称: 济南商河振威门业 1.998MW 分布式光伏电站
项目

2017 年 07 月第 2 期项目监理部 (章)



总监理工程师: 柳斌

报告日期: 2017 年 07 月 30 日

监 理 月 报


工程名称: 济南商河振威门业 1.998MW 分布式光伏电站项目 月次 第 2 次 月报开始时间 2017 年


07 月 01 日 结束日期 2017 年 7 月 31 日 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	济 南 商 河 振 威 门 业 1.998MW 分布式光伏电 站项目		影像	4 张	

一、 监理重点工作情况

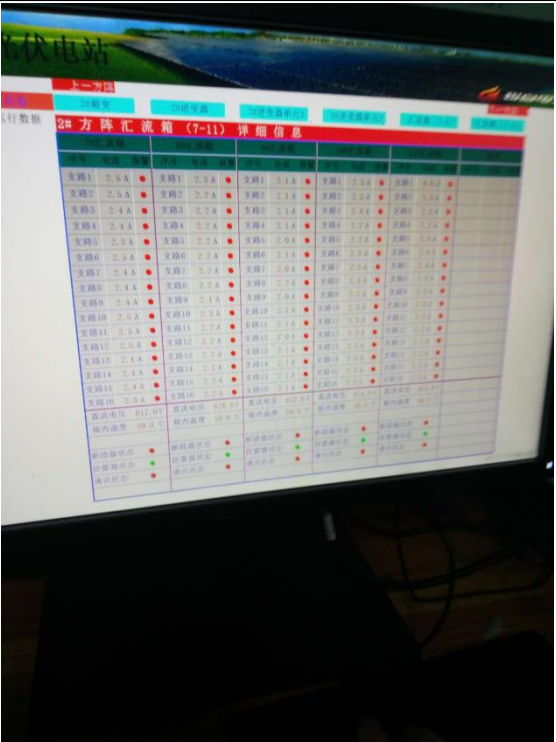专 业	事 项	本 月 重 点 工 作 情 况	下 月 重 点 工 作 计 划
进 度		检查各支路电流是否正常。现场进行消缺。初验完成。	无

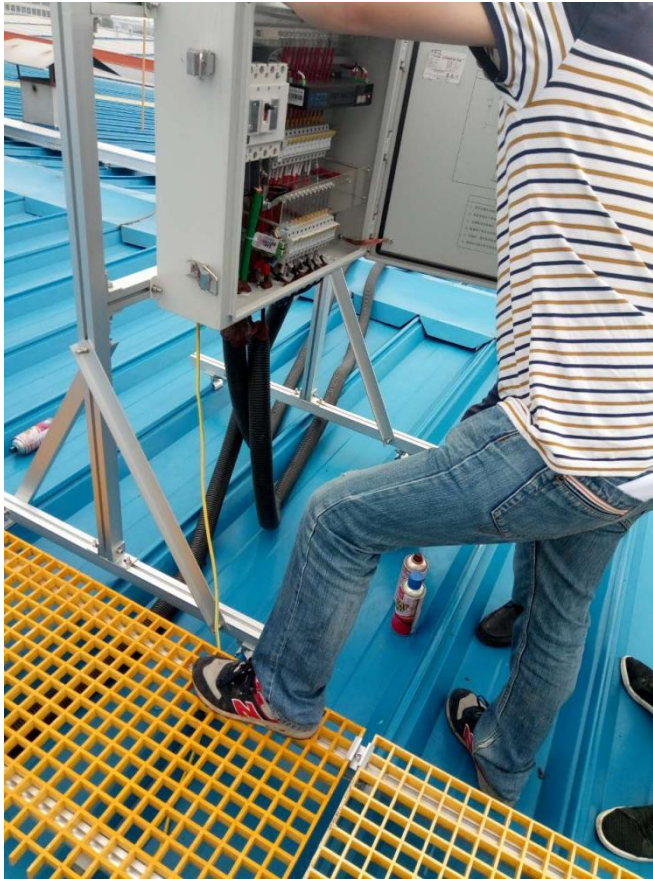

安			
	设备交付进度	无	/
	设计交付进度	图纸完成	/
	质量体系运作情况	质量体系健全， 运行良好	/
	施工图会审	完成	
	设计交底	完成	
	方案审查	已审查	/
	技术交底	完成	
	设计变更	无	
安	安全培训情况	新进场员工已	/

全		进行安全培训	
	安全交底情况	督促施工单位 对危险作业点 进行班前交底	/
	安全措施落实情况	落实不彻底，已 要求施工单位 认真落实	/
	安全文明施工情况	现场安全、文明 措施良好	/
质 量	主要工序质量	预制仓二次接 线调试、并网。	/
	主要原材料质量	/	/
	构（配）件质量	/	/
	设备质量		/
	质量验评情况	工序施工符合 要求	/
投 资	资金情况	/	/
	款项支付情况	/	/
	预算外签证	无	/
合 同	合同签订情况	施工合同签订	/
	合同执行情况	按合同执行	/

二、 本月进度情况

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	本月实际完成	累计完成（完成	备注
----	------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	----

						(完成 量 / 总 量)	量 / 总 量)	
1	定位放线							
2	支架安装						100%	
3	组件安装						100%	
4	电缆桥架 (直流)						100%	
5	直流电缆 4mm ²						100%	
6	直流电缆 2*120m m/2*15 0mm/2* 95mm						100%	
7	高压电缆 3*150/3 *400 敷 设						100%	
8	箱式变压 器安装						100%	
9	逆变器安 装						100%	
10	10KV 开 关柜						100%	
11	二次室设 备						100%	

三、 下月进度计划

序号	任 务 名 称	计划开始 时间	计划结束 时间	施工开始 日期	施工结束 日期	下月计 划完成 (完成 量 / 总 量)	本 月 实 际 完 成 (完 成 量 / 总 量)	备注
1	定位放线						100%	
2	支架安装						100%	
3	组件安装						100%	
4	电缆桥架			/	/		100%	

	(直流)							
5	直流电缆 4mm2			/	/		100%	
6	直流电缆 2*120m m/2*15 0mm/2* 95mm			/	/		100%	
7	高压电缆 3*150/3 *400 敷 设						100%	
8	箱式变压 器安装						100%	
9	逆变器安 装						100%	
10	10KV 开 关柜						100%	
11	二次室设 备						100%	

四、 安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策 划文件(份)	施工 人数	安全分包情况			
人身重 伤	机械设 备	电网事 故			分包队 伍数量	分包队 伍人数	系统外 包队伍 数量	系统外 队伍人 数
无	无	无		10 人	/	/	/	/

五、 施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	配合建设单位做好并网前准备工作。要求 施工单位合理安排施工进度计划，及时调 整人力、物力	
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制	

	度》，落实安全文明施工措施。	
质量管理	督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	
造价管理	对施工单位申请的工程款及时进行评审	进度款支付申请
物资供应	督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。

常州正衡电力工程监理有限公司

南商河振威门业 1.998MW 屋顶分布式发电项目

2017 年 07 月 30 日
