



编号: FN-GF-ZH-YB-05

监 理 月 报

工程名称: 丰宁满族自治县 2017 年第一批村级光伏扶贫电站项目

2019 年 04 月第 5 期

项目监理部 (章):



总监理工程师: 苗守明

报告日期: 2019 年 04 月 27 日

监 理 月 报

工程名称：丰宁满族自治县 2017 年第一批村级光伏扶贫电站项目

月报开始时间 2019 年 04 月 01 日 结束日期 2019 年 04 月 30 日

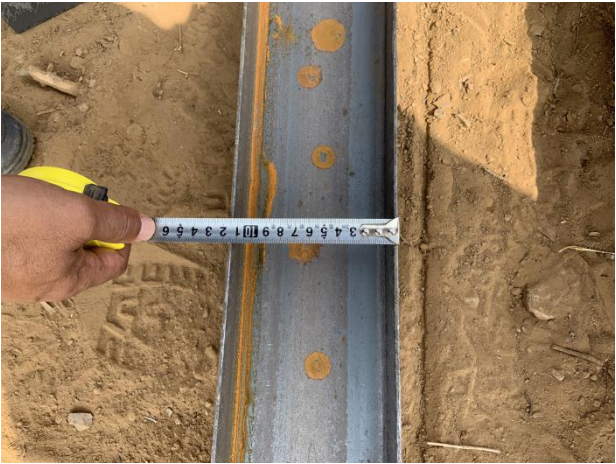
监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	丰宁满族自治县 2017 年第一批村级光伏扶贫电站项目		影像	20 张	

二、监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度		工程进度情况如下： 1、项目所有逆变器与运维中心后台通信已调试完成，完成每个电站逆变器与运维中心后台通信实时监控。 2、大河东村、	1、两个联建电站 SVG 吊装及调试。2、坝下电站主要消缺项完成 100%，电站辅助设施施工全部完成 100%，基本具备验收

  	三间房村联建点一二次仓通信与对侧变电站通信光缆熔接完成。正在协商通信光缆进入电力公司电站安装熔接。大河东与三间房村SVG基础施工单位已开始进场备料。 3、胡麻营乡、南关乡、大阁镇、四岔乡已消缺完成。 4、选将营乡、鱼儿山镇、外沟门乡、万胜永乡、窟窿山乡、开发区正在消缺，完成约 40%。 5、选将营乡、北头营乡、开发区、外沟门乡、四岔口	条件；坝上电站主要消缺项完成 80%，电站辅助设施施工全部完成 50%，下月材料到场：SVG 设备、通信相关设备到场。
--	--	--

	  	乡、苏家店乡组件增加螺丝完成。 6、窟窿山乡（王家营村、五员外村、干湿沟村、冒哈气村），王营乡（辛营村、安营村、王营村）倒刺围栏安装完成。	
设备交付进度		设备全部到场 安装完成	

	设计交付进度	丰宁项目电子 图土建、电气已 交付	
	质量体系运作情况	质量体系健全， 运行良好	落实质量保证 体系，并对运行 情况进行检查
	施工图会审	对现有图纸进 行图纸会审	对全部图纸进 行图纸会审
	设计交底		
	方案审查	已审查，还需整 改	督促施工单 位报审其他资料
	技术交底	暂无	已召开
	设计变更	有	SVG基础挑檐取消
安全	安全培训情况	新进场员工已 进行安全培训	督促施工单 位对进场新员 工进行安全教育
	安全交底情况	督促施工单 位对危险作业点 进行班前交底	继续督促施工 单位进行班前 交底
	安全措施落实情况	落实不彻底，已 要求施工单 位认真落实	监督施工单 位认真落实安全 措施
	安全文明施工情况	现场安全、文明 措施落实不彻 底	加强现场管理 力度
质量	主要工序质量	地锚桩钻孔质 量	现场施工管理 人员、监理、业 主实时把控

	主要原材料质量	对进场地锚桩材料抽检	对主要材料进行检查
	构（配）件质量	暂无	把控好进场材料质量关
	设备质量	暂无	进行进场报验、开箱检查
	质量验评情况	工序施工部分不符合要求	要求施工队进行整改，加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况	/	/
	预算外签证	/	/
合同	合同签订情况	施工合同签订	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行工作

五、安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策划文件（份）	施工人数	安全分包情况			
人身重伤	机械设备	电网事故			分包队伍数量	分包队伍人数	系统外包队伍数量	系统外队伍人数
无	无	无	3	15 人	/	/	/	/

六、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	1、督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性。 2、于 2018 年 12 月 25 日，丰宁满族自	配合建设单位做好并网前准备工作。要求施工单位合理安排施工进度计划，及时调整人力、物力

	治县 2017 年第一批村级光伏扶贫电站项目全额并网成功。 3、 本月初，施工单位陆续有人员进场，开始进行消缺整改工作。	
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查； 对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。	审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。
质量管理	现场地锚桩钻孔质量、地锚桩浇筑质量把控	督促施工单位按照施工工艺和设计要求进行施工
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。
造价管理	对施工单位申请的工程款及时进行评审	对工程量实施计量，及时审核施工项目部报送的工程量清单、进度款支付申请
物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	督促施工单位按照复工日期的要求，安排人员、机具进行施工。

常州正衡电力工程监理有限公司

丰宁满族自治县 2017 年第一批村级光伏扶贫电站项目监理项目部

2019 年 04 月 30 日
