

GFDZJBM16: 监理月报


编号: ZHJL-JLYB-20170924

监 理 月 报

工程名称: 平湖昇茂新能源科技有限公司绍兴柯桥地区 20MWp 分布式光伏发电项目

2017 年 9 月 第 3 期

总监理工程师: 赵占良



监 理 月 报

工程名称：平湖昇茂新能源科技有限公司柯桥地区 20MWp5 分布式光伏项目 9 月次 第 3 次 月
报开始时间 2017 年 9 月 01 日 结束日期 2017 年 09 月 30 日



监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	平湖昇茂新能源 科技有限公司绍 兴 柯 桥 地 区 20MWp 分布式光 伏项目	绍兴八方纺织有限公司 1262.8KWp 分布式 光伏发电项目	影像	2 张	因部分材 料未到暂 停施工
		浙江华宇纸业 8mwp 分 布式光伏发电项目	影像	2 张	因部分材 料未到暂 停施工
		浙江永盛薄膜科技有限 公司 10.8MWp 分布式 光伏发电项目	影像	2 张	因部分材 料未到暂 停施工，本 月进行厂 房加固；


监理重点工作情况

专业	施工照片资料	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度	 阵雨 26 ~ 22℃度 无持续风向微风 绍兴市绍兴县后渚村路 2017年09月15日 10:25 星期五 永盛  阵雨 26 ~ 22℃度 无持续风向微风 绍兴市绍兴县后渚村路 2017年09月15日 10:25 星期五 永盛	1. 绍兴八方纺织有限公司分布式光伏发电项目夹具、导轨、等已安装，组件安装完成 90%；	1、组件安装； 2、汇流箱、逆变器安装； 3、电缆敷设；

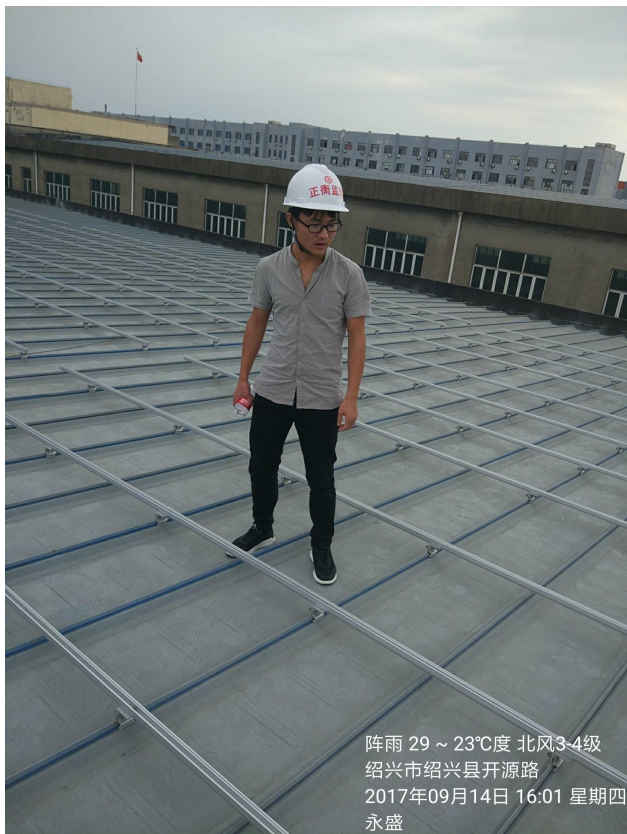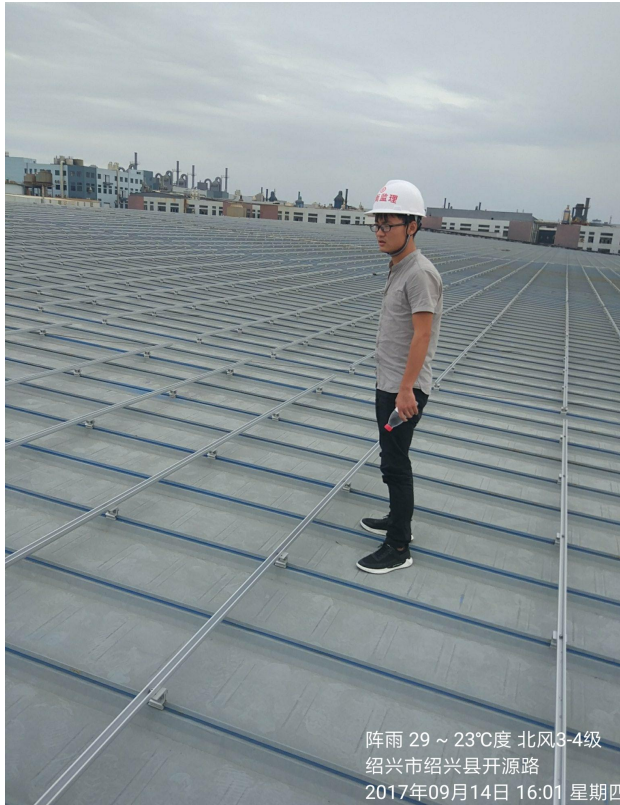

2. 浙江华宇纸业
8mwp 分布式光
伏发电项目夹
具、导轨安装已
完成 70%，其余
材料暂未进场；

- 1、夹具、导轨安
装；
- 2、组件安装；
- 3、电缆敷设；

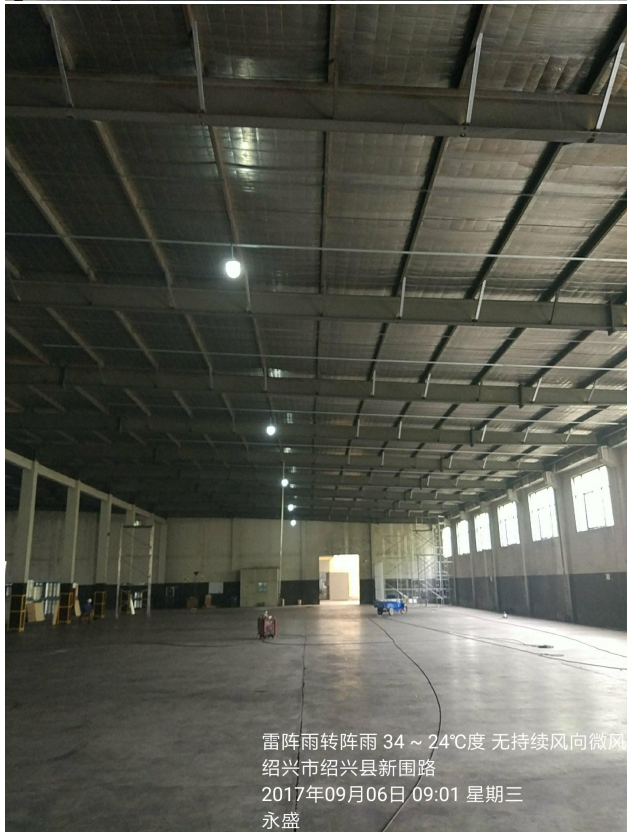

3. 浙江永盛薄膜
科技有限公司
10.8MWp 分 布
式光伏发电项目
厂房加固，已完
成 50%;

- 1、夹具、导轨安
装;
- 2、组件安装;

设备交付进度

设备完成

设备完成

设计交付进度

图纸完成

图纸完成

质量体系运作情况

质量体系健全，运

落实质量保证体

		行良好	系，并对运行情况进行检查
	施工图会审	完成	
	设计交底	未交底	
	方案审查	未交付	督促施工单位报审其他资料
	技术交底	未完成	
	设计变更	无	
安全	安全培训情况	新进场员工已进行安全培训	督促施工单位对进场新员工进行安全教育
	安全交底情况	督促施工单位对危险作业点进行班前交底	继续督促施工单位进行班前交底
	安全措施落实情况	落实不彻底，已要求施工单位认真落实	监督施工单位认真落实安全措施
	安全文明施工情况	现场安全、文明施工良好	加强现场安全管理力度
质量	主要工序质量	支架及组件安装，电缆桥架安装，电缆敷设；	支架及组件安装；电缆敷设，电缆头制作及耐压试验；
	主要原材料质量	电缆外观质量合格，支架外观检查合格，组件观感质量合格；	对主要材料进行检查
	构（配）件质量	进场材料质量合格	把控好进场材料质量关
	设备质量		进行进场报验、开

			箱检查
	质量验评情况	工序施工符合要求	加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况	/	/
	预算外签证	/	/
合同	合同签订情况	施工合同签订	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行工作

一、 本月进度情况

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	本月实际完成（完成量/总量）	累计完成（完成量/总量）	备注
绍兴八方纺织有限公司 1262.8KWp 分布式光伏发电项目								
1	组件安装			2017.07.10		90%		
2	桥架敷设			2017.07.10		90%		
浙江华宇纸业 8mwp 浙江华宇纸业 8mwp 分布式光伏发电项目								
1	组件安装							
2	接地安装							
3	桥架安装							
浙江永盛薄膜科技有限公司 10.8MWp 分布式光伏发电项目								
1	夹具导轨安装							
2	组件安装							
3	汇流箱安装							

4	逆变器 安装							
---	-----------	--	--	--	--	--	--	--

二、安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策 划文件（份）	施工 人数	安全分包情况			
人身重 伤	机械设 备	电网事 故			分包队 伍数量	分包队 伍人数	系统外 包队伍 数量	系统外队伍人数
无	无	无		30 人	2	/	/	/

三、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性	要求施工单位合理安排施工计划，及时调整人力、物力
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。	审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。
质量管理	组件到场进行开箱检查；单位工程重点部位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	督促施工单位按照施工工艺和设计要求规范要求要求进行施工
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。
造价管理	对施工单位申请的工程款及时进行审核	对工程量实施计量，及时审核施工项目部报送的工程量清单、进度款支付申请

物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	督促施工单位按照复工日期的要求，安排人员、机具进行施工。
------	--	------------------------------

常州正衡电力工程监理有限公司

平湖昇茂新能源科技有限公司绍兴柯桥地区 20MWp

分布式光伏发电项目监理部

2017 年 09 月 24 日
